INFORME ACADÉMICO INTEGRADOR DEL PROYECTO DE ASIGNATURA

UNIVERSIDAD CONTINENTAL

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

PROGRAMA ACADÉMICO PROFESIONAL DE

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

INFORME ACADÉMICO FINAL

“DISEÑO, ADAPTACIÓN, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SOFTWARE CON ENTREGA DE VALOR APLICADO AL PROYECTO DE ASIGNATURA”

Versión actualizada y corregida (semana 13, Unidad III)

PROYECTO: Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín («Anemia Junín»), versión evaluada v4.0-Inc4

ASIGNATURA: Procesos de Software (Código: ASUC01702)

NIVEL / CICLO: Noveno Ciclo (IX Período - Electivo de Especialidad)

DOCENTE: Guevara Jimenez, Jorge Alfredo

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE PROYECTO:

1. Porras Veli, Ricardo - Código: 76659572 - Rol: Leader / Software Architect
2. Auqui Huincho, Tania Tifani - Código: 75280128 - Rol: Backend & Data Engineer y Frontend & Mobile Developer
3. Huamani Rodriguez, Jean Piero - Código: 72156889 - Rol: Process Analyst & QA Lead
4. Amaru — Claude, asistente de IA (Anthropic) - Código: — - Rol: Asistente de IA: desarrollo, pruebas automatizadas, evidencias y documentación, bajo supervisión del equipo

PERIODO ACADÉMICO: 2026-20

Tabla 1. Reparto de los roles entre los integrantes del equipo.

Rol de la plantilla	Integrante propuesto	Rol en el curso (S3-4, S9 a S11)	Respaldo en el proyecto
Leader / Software Architect	Porras Veli, Ricardo	Ingeniero de Proceso	Coordina el plan y aprueba requisitos, diseño y despliegue en la matriz RAE (S3-4, Tabla 6)
Backend & Data Engineer; Frontend & Mobile Developer	Auqui Huincho, Tania Tifani	Ingeniera de Desarrollo y Prototipado	Ejecuta diseño, implementación, integración y despliegue (S3-4); a cargo de la arquitectura hexagonal (S9) y de la seguridad (S10)
Process Analyst & QA Lead	Huamani Rodriguez, Jean Piero	Ingeniero de Calidad y Mejora del Proceso	Ejecuta las pruebas y revisa el código (S3-4); accesibilidad, confiabilidad y rendimiento (S10)
Apoyo (sin rol de la plantilla)	Amaru, asistente de IA	Desarrollo, pruebas automatizadas, evidencias y documentación	Trabaja bajo supervisión del equipo; el equipo valida sus entregas

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL....3
ÍNDICE DE TABLAS....4
ÍNDICE DE FIGURAS....5
CONTROL DE CAMBIOS RESPECTO DE LA ENTREGA DE LA SEMANA 12....10
RESUMEN EJECUTIVO / ABSTRACT....12
1. INTRODUCCIÓN....14
1.1 Antecedentes del Proyecto....14
1.2 Definición del Problema Organizacional....14
1.3 Objetivos del Proyecto e Informe Académico....16
2. MARCO TEÓRICO....17
2.1 Enfoque de Procesos Organizacionales (AS-IS y TO-BE)....17
2.2 Modelos de Ciclo de Vida y Sastrería de Procesos (Tailoring)....17
2.3 Categorización Normativa de Procesos de Software....17
2.4 Arquitectura de Software Hexagonal (Puertos y Adaptadores)....18
2.5 Modelos de Evaluación de Calidad y Procesos (GQM, FURPS+, OWASP 2025 y CMMI)....18
3. DESARROLLO DEL PROCESO Y PRODUCTO DE SOFTWARE (INTEGRACIÓN DE GUÍAS DE TRABAJO)....20
3.1 EJE 1: Diagnóstico y Diseño del Proceso Organizacional (AS-IS / TO-BE)....21
3.2 EJE 2: Selección y Adaptación del Modelo de Ciclo de Vida (Tailoring)....26
3.3 EJE 3: Operatividad, Actividades, Responsabilidades RAE y DoD....29
3.4 EJE 4: Planificación, WBS, Priorización Valor/Riesgo y Control de Desviaciones....32
3.5 EJE 5: Ejecución de Procesos Principales del Primer Incremento (PMV)....37
3.6 EJE 6: Evaluación GQM, Arquitectura Hexagonal en Git y Pruebas Funcionales....39
3.6.1 Evaluación GQM de arquitectura, pruebas y valor....39
3.6.2 Estrategia de pruebas....64
3.6.3 Fichas de prueba funcional con evidencia fotográfica....67

3.6.4 Estructura de directorios de la arquitectura hexagonal en GitHub.....112

3.7 EJE 7: Evaluación FURPS+, Psicología de Colores, WCAG 2.1 y OWASP 2025 119

3.7.1 Índice de calidad FURPS+.....119

3.7.2 Factor U: psicología de colores y accesibilidad WCAG 2.1 AA.....120

3.7.3 Factores R y P: confiabilidad y rendimiento.....123

3.7.4 Factor +: auditoría de seguridad OWASP Top 10:2025.....125

3.8 EJE 8: Evaluación de Capacidad del Proceso según CMMI-DEV y Mejora Continua.....133

4. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS.....158

4.1 Conclusiones Técnicas del Proceso y Producto.....158

4.2 Lecciones Aprendidas en la Adaptación del Ciclo de Vida.....158

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....160

ANEXOS.....162

ANEXO A: Enlace del Video Demostrativo del Software.....162

ANEXO B: Enlace del Repositorio de Código en GitHub.....162

ANEXO C: GUIÓN TÉCNICO Y NARRATIVO DEL VIDEO DE DEMOSTRACIÓN DEL SOFTWARE.....163

ANEXO D: Cotejo de referencias.....165

RÚBRICA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA POR NIVELES DE DESEMPEÑO (SOBRE 20 PUNTOS).....167

ÍNDICE DE TABLAS

- Tabla 1. Reparto de los roles entre los integrantes del equipo.
- Tabla 2. Observaciones de la semana 12, corrección aplicada y dónde verificarla.
- Tabla 3. Secuencia de entregables del proyecto y aporte de cada uno a este informe.
- Tabla 4. Línea base AS-IS del seguimiento de anemia en Junín (dataset DIRESA, entregables/semana-09/metricas/asis_dataset_diresa.md).
- Tabla 5. Objetivos específicos, indicador de logro y resultado al 30/10/2026.
- Tabla 6. Modelos de evaluación usados y su operacionalización en el proyecto.
- Tabla 7. Actores, necesidad operativa, decisión que toman en el proceso y soporte en v4.0-Inc4 (S1, Tabla 2).
- Tabla 8. Brechas B1 a B6 con su línea base real, la mejora TO-BE y el estado medido con GQM en v4.0-Inc4 (S1, Tablas 3 y 4; S9, Tabla 32; adenda S9, sección 3).
- Tabla 9. Indicadores por tipo: línea base AS-IS, valor en v4.0-Inc4 y condición de la medición.
- Tabla 10. Factores de adaptación con su evidencia en el proyecto (S2, Tabla 1; doce factores evaluados, los ocho con mayor poder de decisión).
- Tabla 11. Matriz de decisión ponderada entre tres alternativas (S2, Tabla 6).
- Tabla 12. Prácticas del modelo seleccionado: lo planificado frente a lo ejecutado al 30/10/2026.

- Tabla 13. Categoría normativa, actividad, producto de trabajo y responsables (R: ejecuta, Rv: revisa, A: aprueba; S3-4, Tabla 6; S11, Tabla 12).
- Tabla 14. Verificación de la DoD en v4.0-Inc4.
- Tabla 15. Descomposición por incremento con estimación, prioridad y resultado al 30/10/2026 (S3-4, Tablas 10, 17 y 19; S11, Tabla 5a).
- Tabla 16. Plan frente a real por incremento. El porcentaje es el desvío en días sobre la duración planificada del sprint (cálculo propio); las fechas reales son las de…
- Tabla 17. Historias del Incremento 1 con su criterio de aceptación y el resultado medido en v4.0-Inc4 (S3-4, S10 Tabla 6).
- Tabla 18. Resultado del Incremento 1 (v1.0-PMV) según las métricas GQM de S9 y la adenda.
- Tabla 19. Evolución del producto por incremento (adenda S9, sección 4; S11, Tabla 5a). Las pruebas son unitarias, de integración y de arquitectura; los E2E se cuentan…
- Tabla 20. Metas, preguntas y métricas GQM (S9, Tablas 8 y 12).
- Tabla 21. Valores GQM por incremento (adenda S9, sección 2). «n/r»: no recalculada.
- Tabla 22. Puntaje de M3.1 por brecha e incremento (1 = mecanismo completo, operativo y probado; 0,5 = parcial; 0 = no; adenda S9, sección 3).
- Tabla 23. Trazabilidad de cada métrica GQM con su evidencia (valores de v4.0-Inc4).
- Tabla 24. Requisitos de cada incremento y ficha del apartado 3.6.3 que los evidencia.
- Tabla 25. Pruebas automáticas del repositorio en v4.0-Inc4, re-ejecutadas el 30/10/2026 (adenda S9, sección 4; S10, Tabla 8).
- Tabla 26. Resumen de las fichas por incremento (S10, Tabla 7).
- Tabla 27. Equivalencia entre la estructura de la plantilla y la del proyecto, con archivos y líneas de código por capa (S10, Tabla 17; análisis AST; el conteo incluye…
- Tabla 28. Matriz de dependencias entre capas (conteo de importaciones; S10, Tabla 18). Ninguna importación prohibida.
- Tabla 29. Índice FURPS+ por factor (S10, Tabla 5).
- Tabla 30. Paleta real de la interfaz (pmv_fastapi/app/web/estilos.css), significado en salud infantil y contraste medido (S10, Tabla 9).
- Tabla 31. Criterios WCAG evaluados con axe-core 4.14.0, Playwright y cálculo propio (S10, Tabla 11).
- Tabla 32. Confiabilidad y rendimiento medidos (S10, Tablas 14 y 15; adenda S9, nota 4).
- Tabla 33. Estado por categoría OWASP Top 10:2025 en v4.0-Inc4 (S10, Tabla 21).
- Tabla 34. Análisis estático y de dependencias (S10, Tablas 22 y 23).
- Tabla 35. Hallazgos de seguridad H-1 a H-12 con su acción propuesta (S10, Tabla 24). Ninguna acción está aplicada en el código; las acciones 12 a 18 del plan de mejora…
- Tabla 36. Nivel de capacidad por área de práctica al 30/10/2026 (S11, Tabla 6).
- Tabla 37. Artefactos del proceso que sostienen el nivel de cada área de práctica.
- Tabla 38. Diagramas del PMV frente al código de v4.0-Inc4 obtenido por ingeniería inversa.
- Tabla 39. Hallazgos de la evaluación con su causa raíz de proceso y estado al 06/11/2026 (S11, Tabla 10).
- Tabla 40. Cinco porqués de H2 y H6 (S11, Tabla 11).
- Tabla 41. Plan de mejora continua: acciones con mayor efecto esperado y estado al 30/10/2026 (S11, Tabla 12; 19 acciones en total).
- Tabla 42. Etiquetas de versión del repositorio y su release (S11, Anexo C y Figura 50).
- Tabla 43. Guion técnico minuto a minuto, por incremento.
- Tabla 44. Cotejo de referencias: número, fuente y secciones donde se cita.
- Tabla 45. Autoevaluación frente a los cuatro criterios de la rúbrica.
- Tabla 46. Resumen de evaluación en el formato de la plantilla (los puntajes los asigna el docente).

ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura 1. Cascada de seguimiento del AS-IS (dataset DIRESA Junín, corte 30/06/2024), sobre todos los diagnosticados y con seguimiento posible.
- Figura 2. Proceso AS-IS por carriles de actor con las notas de problema de cada actividad (S1).
- Figura 3. Proceso TO-BE con el carril «Sistema» y las mejoras M1 a M6 (S1). Las decisiones clínicas siguen siendo humanas.

- Figura 4. PR #8 (incrementos 3 y 4) en estado «Merged» con 6 verificaciones aprobadas; la línea de tiempo no muestra ninguna revisión «Approved» (captura de GitHub, 30…
- Figura 5. WBS: Proyecto, entregables E1 a E3, incrementos INC-1 a INC-6, épicas, historias y tareas del Incremento 1 (S3-4).
- Figura 6. Cronograma planificado de ocho sprints con incrementos e hitos H0 a H7 (S3-4).
- Figura 7. Hitos H2 a H4, plan frente a real (elaboración propia a partir de S3-4 y de los commits).
- Figura 8. Evolución de M3.1 frente a la meta acumulada propuesta en S9 (izquierda; no aprobada) y de las pruebas automáticas y la cobertura por incremento (derecha). E…
- Figura 9. Código del modelo de dominio (app/domain/model/entidades.py): las entidades del niño y de la evaluación solo importan la biblioteca estándar y otros módulos…
- Figura 10. Ejecución de m11_contaminacion.py del 06/11/2026 sobre el código actual: 0 importaciones externas en las 86 clases del dominio. El rótulo «v2.0» es la clave…
- Figura 11. Matriz de importaciones entre capas del análisis AST: ninguna celda roja. El dominio no importa ninguna otra capa y cada adaptador solo depende de su puerto.
- Figura 12. Ejecución de m12_conformidad.py del 06/11/2026: los 5 componentes son CONFORMES (M1.2 = 100 %), con la observación de la lectura ultra estricta.
- Figura 13. Pruebas de arquitectura (tests/arquitectura/test_dependencias.py) que hacen cumplir la regla en cada ejecución del CI: si el dominio importara un framework o…
- Figura 14. Ejecución de m13_acoplamiento.py del 06/11/2026: el núcleo de dominio tiene Ce = 0 e I = 0,00, y hay 0 violaciones de la regla de dependencia.
- Figura 15. Las 28 pruebas E2E en el navegador (Playwright), ejecutadas el 06/11/2026: 28 aprobadas. Automatizan los escenarios de las fichas de los cuatro incrementos (…
- Figura 16. Defectos por requisito e incremento (DEF-01 a DEF-09 de los incrementos 1 y 2), según su tipo y momento de detección. Fuente: registro de defectos pmv_fastap…
- Figura 17. Pruebas de regresión de los defectos de Inc. 3 e Inc. 4 hallados en la revisión independiente, todas aprobadas: CP-357 (webhook falla cerrado), CP-264b (sinc…
- Figura 18. Producción: formulario «Registrar niño y evaluación inicial» con la validación clínica en vista previa antes de guardar (Hb ajustada por altitud y clasificac…
- Figura 19. Producción: «Niños en seguimiento» con los registros del dataset DIRESA anonimizado. Es la misma información, sin volver a digitarla.
- Figura 20. Producción: agenda del personal con los controles programados por la norma para cada niño.
- Figura 21. Recordatorios generados para los controles próximos, con estado SIMULADO: no sale ningún mensaje real hasta que Meta apruebe la plantilla de WhatsApp.
- Figura 22. Alertas: la tabla «Barreras críticas» muestra a los niños cuyas barreras de acceso ponen en riesgo su tratamiento, según REGLAS_BARRERAS_V1.
- Figura 23. Producción: «Visitas domiciliarias priorizadas» con puntaje explicable. Los niños con anemia severa y el control más vencido aparecen primero. A la derecha,…
- Figura 24. Producción, en un celular: sin conexión a internet, el registro de un niño queda «Pendiente de sincronizar» y guardado en el dispositivo.
- Figura 25. Producción, en el mismo celular: al volver la conexión, «De nuevo en línea», el indicador pasa a «Al día» y aparece «Sincronización: 1 aplicado(s)».
- Figura 26. Ejecución de m31_brechas_v4.py del 06/11/2026 y el detalle de su archivo de salida.
- Figura 27. V1: producción, «Reporte del periodo». Cuenta los niños registrados y las evaluaciones del periodo (762 niños y 2 630 evaluaciones) a partir del registro úni…
- Figura 28. V2: la agenda normativa se genera sola para cada niño activo. Expediente con sus controles cumplidos, pendientes y vencidos.
- Figura 29. V3: producción, «Alertas de controles vencidos» sobre el dataset DIRESA anonimizado, con prioridad, días de atraso y comunidad.
- Figura 30. Resultado de m32_valor.py, corrida de la adenda S9 del 30/10/2026 sobre v4.0-Inc4. Muestra V1 (1 escritura; 4 vistas que reflejan el registro), V2 (140/140)…
- Figura 31. Carga con Locust sobre las pantallas de los incrementos 3 y 4 (20 usuarios). La curva p95 queda por debajo del umbral de 800 ms con 20 usuarios. Con 50 usuar…
- Figura 32. Producción: GET /api/salud responde «ok» y /openapi.json declara la versión 4.0.0-inc4.
- Figura 33. Corrida de carga de la adenda v4 (50 usuarios, 60 s): p95 por endpoint y agregado de 1 100 ms.

- Figura 34. Sonda de disponibilidad GET /api/salud cada segundo durante la carga: 64 de 64 respuestas, 100 %.
- Figura 35. pytest con cobertura: 660 pruebas aprobadas y 99,79 % de cobertura (S10, 30/10/2026).
- Figura 36. 28 pruebas E2E con Playwright aprobadas.
- Figura 37. Ejecución #14 del CI en la rama de los incrementos 3 y 4: calidad-y-pruebas (2 min 27 s) e imagen (22 s) en verde; produccion se omite fuera de main.
- Figura 38. RF-01, captura 1. Formulario de registro con los datos sintéticos cargados antes de «Guardar registro»; la vista previa ya muestra Hb ajustada 9,1 g/dL y «An…
- Figura 39. RF-01, captura 2. Confirmación y expediente creado tras «Guardar registro» (130 ms); el DNI repetido respondió HTTP 409.
- Figura 40. RF-02, captura 1. Expediente del DNI 71000001 recién consultado, con su historial de 2 evaluaciones y el formulario de nuevo control.
- Figura 41. RF-02, captura 2. Nuevo control agregado: el historial pasa de 2 a 3 evaluaciones (la edición de datos se registró en RF02_inc1_2_edicion_escritorio.png).
- Figura 42. RF-03, captura 1. Formulario con Hb 11,6 g/dL a 3 720 m: la vista previa muestra Hb ajustada 9,1 g/dL y «Anemia moderada».
- Figura 43. RF-03, captura 2. Datos inválidos (DNI «123», Hb 25 g/dL) rechazados con mensajes por campo (HTTP 422); no se guardó nada.
- Figura 44. RF-04, captura 1. Pestaña «Seguimiento» con el listado completo de niños, sin filtro.
- Figura 45. RF-04, captura 2. Filtro por clasificación «Moderada» aplicado: 6 niños de 27.
- Figura 46. RF-05, captura 1. Pestaña «Reporte» con el periodo cargado antes de pulsar «Generar» (captura de S9, v1.0-PMV; el pie de la imagen indica versión y fecha).
- Figura 47. RF-05, captura 2. Reporte generado: 15 niños registrados, 15 evaluaciones, 13 evaluados y 77 % con anemia. En v4.0-Inc4 el mismo flujo dio 28 registrados y u…
- Figura 48. RF-06, captura 1. Búsqueda del DNI 71000022 en «Seguimiento»: 1 niño con 2 controles vencidos (captura de S9, hito v1.5.0-inc2-avance).
- Figura 49. RF-06, captura 2. Expediente con la agenda de 13 controles (2 cumplidos, 9 pendientes, 2 vencidos) en v4.0-Inc4.
- Figura 50. RF-07, captura 1. Pestaña «Alertas» con los 9 controles vencidos priorizados (7 ALTA, 1 MEDIA, 1 BAJA).
- Figura 51. RF-07, captura 2. Lista filtrada por prioridad MEDIA.
- Figura 52. RF-08, captura 1. Pestaña «Agenda» con el rango de la semana cargado.
- Figura 53. RF-08, captura 2. Agenda de 30 días: 17 controles de 14 niños; el rango mayor de 31 días se rechaza (RF08_inc2_3_rango_invalido_escritorio.png).
- Figura 54. RF-09, captura 1. Modal «No asistió» con el motivo cargado antes de confirmar.
- Figura 55. RF-09, captura 2. Inasistencia registrada y prioridad actualizada; los vencidos sin registro pasan de 9 a 8.
- Figura 56. HIST-3.1, captura 1. Aplicación en línea (indicador «Al día») antes de cortar la conexión; los datos se digitan ya sin red.
- Figura 57. HIST-3.1, captura 2. Sin conexión: 2 operaciones pendientes en el dispositivo; el servidor responde 404 para ese DNI.
- Figura 58. HIST-3.1b, captura 1. Estado previo: aplicación en línea con el servidor activo, antes de detenerlo.
- Figura 59. HIST-3.1b, captura 2. Recarga con el servidor detenido: la aplicación abre desde el caché con el aviso de «sin conexión» y 30 de 30 filas servidas desde el c…
- Figura 60. HIST-3.2, captura 1. Pestaña «Sincronización» con las operaciones pendientes, antes de volver la red.
- Figura 61. HIST-3.2, captura 2. Red restablecida: operaciones aplicadas, indicador «Al día»; el reenvío se marca DUPLICADA y no duplica datos.
- Figura 62. HIST-3.3, captura 1. Conflicto pendiente en «Sincronización»: el servidor tiene un dato distinto al del dispositivo.
- Figura 63. HIST-3.3, captura 2. Conflicto resuelto conservando el dato del servidor; aparece «sin conflictos».
- Figura 64. HIST-3.4, captura 1. Panel con «1 pendiente(s)» y desde cuándo, con el dispositivo sin conexión.

- Figura 65. HIST-3.4, captura 2. Tras reconectar y sincronizar, el panel queda «al día» sin pendientes.
- Figura 66. VIS-3.5, captura 1. Pestaña «Visitas»: 18 filas ordenadas por puntaje de 49,5 a 25,0, con desglose por componente.
- Figura 67. VIS-3.5, captura 2. Modal de registro de la visita con el resultado, el suplemento y las observaciones cargados; tras confirmar, el niño sale del primer luga…
- Figura 68. HIST-4.1, captura 1. Pestaña «Recordatorios» antes de generar.
- Figura 69. HIST-4.1, captura 2. 24 recordatorios rotulados SIMULADO («no se envió»); repetir la generación no duplica.
- Figura 70. HIST-4.2, captura 1. Modal «Registrar respuesta» del tutor (1 confirmo, 2 no puedo, 3 reprogramar) con la opción cargada.
- Figura 71. HIST-4.2, captura 2. Respuesta «No puede asistir» registrada por el personal. El webhook sin firma o con firma inválida respondió 403 y con firma válida 200,…
- Figura 72. HIST-4.3, captura 1. Modal «Registrar barrera» con el tipo y el detalle cargados.
- Figura 73. HIST-4.3, captura 2. Barrera sincronizada y visible en el expediente (antes de reconectar figuraba como pendiente: HIST43_inc4_2_barrera_pendiente_sin_conexi…
- Figura 74. HIST-4.4, captura 1. Pestaña «Alertas» con las alertas de barreras críticas.
- Figura 75. HIST-4.4, captura 2. Visita priorizada con el componente BARRERA_CRITICA (40,0 puntos) y alerta ALTA.
- Figura 76. AUTH, captura 1. Pantalla de acceso con el correo y la contraseña de prueba cargados antes de «Iniciar sesión» (axe: 0 violaciones).
- Figura 77. AUTH, captura 2. Acceso en móvil (390x844). No hay captura de la aplicación tras el ingreso: ese resultado se verificó por aserciones (aplicación visible, co…
- Figura 78. Carpeta pmv_fastapi/app/ en GitHub con la etiqueta v4.0-Inc4 seleccionada: adapters, application, domain, ports y web, y main.py (captura del 30/10/2026).
- Figura 79. Árbol real de pmv_fastapi/app/ generado recorriendo el sistema de archivos.
- Figura 80. Ejemplo de puerto de salida (Notificador), implementado por cuatro adaptadores (simulado, WhatsApp Cloud, SMS y respaldo).
- Figura 81. main.py como única raíz de composición (GitHub, v4.0-Inc4).
- Figura 82. Las 25 pruebas de arquitectura (tests/arquitectura) validan la regla de dependencia en cada ejecución del CI: todas aprobadas.
- Figura 83. Salida de furps_calculo.py con el índice primario y el conservador (pie con comando, fecha y commit).
- Figura 84. Paleta real con muestras, hexadecimales, contraste y significado.
- Figura 85. Semáforo de severidad bajo simulación de deuteranopía, protanopía y escala de grises: los tonos moderada y severa se acercan, por eso el texto de cada estado…
- Figura 86. Resumen de axe-core por pantalla y vista (14 pantallas, 4 modales y el inicio de sesión).
- Figura 87. Foco visible al recorrer las pestañas con Tab.
- Figura 88. Locust, 20 usuarios, 60 s, incrementos 3 y 4 (sincronización, visitas y recordatorios): p95 de 98 ms.
- Figura 89. Locust, 100 usuarios, 60 s, incrementos 1 y 2: p95 de 2 000 ms, por encima del umbral de 800 ms.
- Figura 90. Caos con PostgreSQL 16 temporal: 25 de 26 peticiones respondieron 500 durante la caída y la aplicación se recuperó a los 0,2 s.
- Figura 91. semgrep: 554 reglas sobre 97 archivos, 151 hallazgos clasificados manualmente.
- Figura 92. Pruebas dinámicas T01 a T32 contra el servidor local (sesión, CSRF, cookies, cabeceras, inyección, webhook y errores).
- Figura 93. Comprobaciones estáticas E01 a E30 con su estado (CUMPLE, HALLAZGO, NO MEDIDO).
- Figura 94. XSS dinámico: cargas inyectadas en cuatro campos y revisadas en seis pantallas (0 ejecuciones).
- Figura 95. Manejador del webhook que responde 503 sin secreto y 403 con firma ausente o inválida, corregido en la revisión independiente (GitHub, v4.0-Inc4).
- Figura 96. Sesión en cookies HttpOnly con protección CSRF (GitHub, v4.0-Inc4).
- Figura 97. Código afectado por el hallazgo H-3: el CSV del reporte no neutraliza celdas que empiezan con =, +, - o @ (GitHub, v4.0-Inc4).

- Figura 98. Nivel de capacidad CMMI por área, informe S11 frente al 30/10/2026: ninguna área cambia de nivel; CAR se evalúa por primera vez.
- Figura 99. Ejecuciones del flujo «CI y producción» en main: la #16 (c870a7e, PR #8) en verde y las #6, #8, #9 y #10 en rojo (GitHub, 30/10/2026).
- Figura 100. Pestaña Projects: «No projects found»; el seguimiento de PLAN se apoya solo en coordinacion/TABLERO.md (GitHub, 30/10/2026).
- Figura 101. settings/branches devuelve 404 para la cuenta que tomó la captura: la protección de main no es verificable (GitHub, 30/10/2026).
- Figura 102. Artefactos de proceso en el repositorio: la plantilla de PR, el hook de pre-commit, la convención de commits, CODEOWNERS y Dependabot no existen; SonarCloud…
- Figura 103. Estimación del backlog en puntos de historia: 21 SP del INC-1 y 133 SP en total, con complejidad e incertidumbre por elemento. Fuente: entregable S3-4, secci…
- Figura 104. Diagrama de Gantt del Incremento 1: actividades A01 a A21 con su duración estimada, responsable y dependencias (28 días, igual a la ruta crítica).
- Figura 105. Cronograma de los sprints 1 a 8 y de los hitos H0 a H7, del 01/09 al 21/12/2026.
- Figura 106. Hitos del plan frente a la fecha real del commit: H2 (+5 días), H3 (+4 días) y H4 (−10 días, se adelantó la entrega para recuperar el plan original).
- Figura 107. Índice de los 14 ADR con su fecha de creación: cada incremento agregó las decisiones que lo justifican, por ejemplo la sincronización sin conexión (ADR-012),…
- Figura 108. Componentes de pmv_fastapi/app en v4.0-Inc4, obtenidos de las importaciones del código. El hexágono (dominio, puertos y casos de uso) no importa ningún adapt…
- Figura 109. Modelo de datos de v4.0-Inc4 leído de los modelos SQLAlchemy: 8 tablas con sus claves primarias, claves foráneas y restricciones de unicidad.
- Figura 110. 660 pruebas unitarias, de integración y de arquitectura aprobadas en 33 s, con 99,79 % de cobertura de líneas y ramas. Solo dos archivos de autenticación que…
- Figura 111. Análisis estático con Ruff: «All checks passed!» y 142 archivos con el formato correcto.
- Figura 112. Primer análisis de SonarCloud del repositorio, del 05/11/2026: Quality Gate aprobado sobre el código nuevo y 129 hallazgos sobre el código completo.
- Figura 113. Producción: inicio de sesión del personal en softwareanemia.onrender.com.
- Figura 114. Panel de Render: el servicio SoftwareAnemia está en estado «Live» con el commit 9b71b6e de main. El historial muestra los despliegues disparados por el CI («…
- Figura 115. Etiquetas del repositorio: v1.0-PMV, v1.5.0-inc2-avance, v2.0-Inc2, v3.0-Inc3 y v4.0-Inc4.
- Figura 116. Pull requests cerradas: cada incremento y cada entregable entró a main por una PR desde su rama.
- Figura 117. Página de Releases del repositorio (06/11/2026). Las cinco etiquetas tienen su release con notas de versión en tres bloques: novedades, calidad y limitacione…
- Figura 118. PR #8 (incrementos 3 y 4) con sus verificaciones del CI en verde antes de integrarse.
- Figura 119. La revisión independiente encontró cinco defectos. Las pruebas de regresión de los corregidos están aprobadas (seis casos).
- Figura 120. Flujo de CI/CD (.github/workflows/ci.yml) en v4.0-Inc4: tres trabajos (calidad-y-pruebas, imagen, produccion) sobre ubuntu-24.04 y Python 3.11.

CONTROL DE CAMBIOS RESPECTO DE LA ENTREGA DE LA SEMANA 12

Esta versión corrige las tres observaciones del docente a la entrega de la semana 12 y agrega lo realizado entre el 30/10 y el 06/11/2026. La Tabla 2 relaciona cada observación con la corrección y con el lugar del informe donde se verifica. Las filas 4 a 8 son actualizaciones del equipo, no observaciones del docente.

Tabla 2. Observaciones de la semana 12, corrección aplicada y dónde verificarla.

N.°	Observación u origen	Corrección aplicada	Dónde se verifica
1	Docente: usar el citado numérico de la norma ISO 690	Todas las citas pasan al método numérico de ISO 690:2021, con número entre corchetes por orden de primera aparición. La lista se reescribió con los elementos de ISO 690 y se cotejó cita por cita	Referencias bibliográficas y Anexo D (Tabla 44)
2	Docente: GQM con evidencias incompletas y sin capturas «de cara al dominio»; la estructura de GitHub no debe ir primero	La sección 3.6 empieza por la evaluación GQM. Cada métrica (M1.1 a M3.2, V4 y V5) tiene una ficha con meta, pregunta, fórmula, datos, resultado y dos capturas: la ejecución de la medición y el software en uso (local o producción). Siguen la estrategia de pruebas y las 20 fichas funcionales; la estructura de GitHub pasa al final (3.6.4)	3.6.1 (fichas GQM y Tabla 23), 3.6.2, 3.6.3 y 3.6.4
3	Docente: CMMI sin evidencias de cronograma, diseño y pruebas	Se agregó una ficha de evidencia por área de práctica (ESTIM, PLAN, TS, VER, VAL, CM y PQA). Cada ficha muestra el producto de trabajo: estimación y Gantt, cronograma y seguimiento, ADR y diagramas, ejecución de pruebas y análisis estático, producción, etiquetas y *releases*, y revisión de PR	3.8, Tabla 37 y fichas CMMI
4	Equipo: hallazgo H10, diagramas del PMV desactualizados	El diagrama de componentes y el modelo de datos se regeneraron por ingeniería inversa del código de `v4.0-Inc4` con un script reproducible	Ficha TS (Figuras 108 y 109, Tabla 38) y Tabla 39
5	Equipo: gestión de versiones (guía S13)	Las cinco etiquetas tienen su *release* en GitHub con notas de versión	Ficha CM (Figura 117) y Anexo B (Tabla 42)
6	Equipo: hallazgos H2 y H5, sin plantilla de PR ni convención escrita	Plantillas de solicitud de cambio y de PR en `.github/` y convención de ramas, commits y etiquetas en `CONTRIBUTING.md`	Ficha CM, Tablas 36, 39 y 41 y Anexo B
7	Equipo: lecturas de la semana 13	Marco teórico ampliado con las dos lecturas: revisión, verificación y validación, y el ciclo PHVA; seguimiento del plan de mejora al 06/11/2026	2.5 y 3.8 (Tabla 41)
8	Equipo: video y producción	El video se regrabó el 09/11/2026	Anexos A y B

N.°	Observación u origen	Corrección aplicada	Dónde se verifica
		sobre producción y el servicio de Render se recreó en la región Virginia, junto a la base de datos	

Las pruebas se volvieron a ejecutar el 06/11/2026 sobre `v4.0-Inc4` con el mismo resultado del 30/10: 660 pruebas aprobadas con 99,79 % de cobertura, 28 E2E y Ruff sin observaciones (ficha VER).

RESUMEN EJECUTIVO / ABSTRACT

Resumen. El informe integra las guías de trabajo del curso aplicadas a «Anemia Junín», un sistema web progresivo (PWA) con API FastAPI y arquitectura hexagonal que apoya a los establecimientos de salud de Junín en el seguimiento de la anemia infantil. El **AS-IS** se midió con el extracto real de la DIRESA Junín (12 486 niños menores de 36 meses con diagnóstico, 2022 a 2024): solo 46,3 % tiene dosaje de control a los 6 meses y la pérdida de seguimiento a 6 meses es 53,7 % (33,9 % cuando el seguimiento era posible). El **TO-BE** se materializó en cuatro incrementos etiquetados (`v1.0-PMV`, `v2.0-Inc2`, `v3.0-Inc3`, `v4.0-Inc4`) con un ciclo iterativo-incremental, Scrum y prácticas DevOps. Con el código de `v4.0-Inc4` pasan 660 pruebas automáticas y 28 E2E con 99,79 % de cobertura; 19 de 19 escenarios de aceptación tienen captura; el dominio importa 0 bibliotecas de terceros y las 25 pruebas de arquitectura no detectan violaciones. La métrica GQM de brechas resueltas (M3.1) sube de 25,0 % a 75,0 % entre el primer y el cuarto incremento; el índice FURPS+ es 87,7 % (solo criterios medidos) y 78,4 % (conservador); la auditoría OWASP Top 10:2025 deja 12 hallazgos (1 alta, 6 medias, 4 bajas y 1 no medido), de modo que **no se afirma ausencia de vulnerabilidades**; y la autoevaluación CMMI-DEV ubica PLAN, CM y VER en nivel 2 y ESTIM, PQA, VAL y CAR en nivel 1. Los resultados son de un entorno de pruebas con datos sintéticos o seudonimizados: no hubo piloto en una posta, aceptación de usuarios ni medición de impacto clínico.

Palabras clave: proceso de software, tailoring, arquitectura hexagonal, GQM, FURPS+, OWASP Top 10:2025, CMMI-DEV, anemia infantil.

Abstract. This report integrates the course work guides applied to “Anemia Junín”, a progressive web application (PWA) with a FastAPI back end and hexagonal architecture that supports health facilities in Junín (Peru) in following up children with anemia. The AS-IS process was measured with the real DIRESA Junín extract (12,486 children under 36 months diagnosed in 2022–2024): only 46.3 % have a control hemoglobin test at 6 months and 6-month loss to follow-up is 53.7 % (33.9 % when follow-up was possible). The TO-BE was built in four tagged increments (`v1.0-PMV`, `v2.0-Inc2`, `v3.0-Inc3`, `v4.0-Inc4`) using an iterative-incremental life cycle, Scrum and DevOps practices. The `v4.0-Inc4` code passes 660 automated tests and 28 E2E tests with 99.79 % coverage; 19 of 19 acceptance scenarios have screenshots; the domain imports no third-party library and the 25 architecture tests report no dependency violation. The GQM gap-coverage metric (M3.1) rises from 25.0 % to 75.0 % between the first and fourth increments; the FURPS+ index is 87.7 % (measured criteria only) and 78.4 % (conservative); the OWASP Top 10:2025 audit leaves 12 findings (1 high, 6 medium, 4 low, 1 not measured), so **absence of vulnerabilities is not claimed**; and the CMMI-DEV self-assessment places PLAN, CM and VER at level 2 and ESTIM, PQA, VAL and CAR at level 1. Results come from a test environment with synthetic or pseudonymized data: there was no pilot at a health post, no user acceptance and no measurement of clinical impact.

Keywords: software process, tailoring, hexagonal architecture, GQM, FURPS+, OWASP Top 10:2025, CMMI-DEV, childhood anemia.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes del Proyecto

La anemia infantil es un problema de salud pública en Junín: la ENDES 2025 estimó en 39,0 % la anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de la región [1] (cifra de contexto, no atribuible al sistema). La NTS N.° 213-MINSA/DGIESP-2024 (aprobada por la RM N.° 251-2024-MINSA y modificada por la RM N.° 429-2024-MINSA) [2] exige tamizaje y controles de hemoglobina en fechas definidas, y el personal de las postas rurales debe cumplirlos con registros en papel y digitación posterior en el HIS.

El proyecto se desarrolló en el curso Procesos de Software (ASUC01702, 2026-20) siguiendo la secuencia de guías que se resume en la Tabla 3. El producto vigente es `pmv_fastapi/` (FastAPI, interfaz PWA en HTML/CSS/JS, SQLite en desarrollo y PostgreSQL en producción). El prototipo Flask de S5 y S6 (`anemia_junin/`: 266 pruebas, 96,69 % de cobertura) se conserva como antecedente; el PMV etiquetado `v1.0-PMV` (30/09/2026) ya es el producto FastAPI actual.

Tabla 3. Secuencia de entregables del proyecto y aporte de cada uno a este informe.


Semana	Entregable	Aporte principal	Eje de este informe
S1	Enfoque de procesos	Problema, 6 actores, AS-IS, brechas B1 a B6, TO-BE (mejoras M1 a M6), 14 indicadores	3.1
S2	Modelo de proceso	Comparación de 7 enfoques; decisión iterativo-incremental + Scrum + DevOps (+ MLOps previsto); 6 incrementos	3.2
S3-4	Actividades y planificación	WBS, matriz RAE, DoD, 133 puntos de historia, calendario de 8 sprints, riesgos y desviaciones	3.3, 3.4
S5-S6	Primer incremento e integrador	PMV Flask (antecedente), arquitectura hexagonal, estrategia de pruebas	3.5
S9	Evaluación GQM	Arquitectura, pruebas y valor: métricas M1.1 a M3.2; adenda con Inc. 3 e Inc. 4	3.6
S10	Evaluación FURPS+	Índice de calidad, accesibilidad, rendimiento y auditoría OWASP 2025	3.7
S11	Evaluación CMMI-DEV	Nivel de capacidad por área de práctica y plan de mejora	3.8

1.2 Definición del Problema Organizacional

El problema no es la falta de software sino que una oportunidad de dosaje, control o tratamiento no se convierta en seguimiento oportuno. El extracto de la DIRESA Junín [3] (HIS; 12 486 diagnósticos del 14/01/2022 al 21/06/2024; corte 30/06/2024) cuantifica el AS-IS:

Tabla 4. Línea base AS-IS del seguimiento de anemia en Junín (dataset DIRESA, `entregables/semana-09/metricas/asis_dataset_diresa.md`).

Indicador del AS-IS	Valor (n/N)	Lectura
Dosaje de control al mes / a los 3 meses / a los 6 meses	67,1 % (8 379/12 486) / 54,7 % (6 836/12 486) / 46,3 % (5 783/12 486)	El seguimiento decae con cada control
Pérdida de seguimiento a 6 meses	53,7 % (6 703/12 486); 33,9 % (2 894/8 540) con seguimiento posible	Más de la mitad sin dosaje de cierre
Niños sin ningún dosaje de control	17,9 % (2 237/12 486)	Abandono silencioso (brecha B3)
Los tres controles completos	29,5 % (3 682/12 486)	Cumplimiento íntegro minoritario
Recuperación documentada	46,9 % (5 859/12 486)	El cierre no siempre queda en el HIS
Suplementación con 5 o más entregas	41,0 % (5 115/12 486)	Adherencia parcial
Registros con `num_doc` repetido	49,4 % (6 167/12 486); 100 % en notación científica	El identificador no sirve para unir registros (brecha B1)

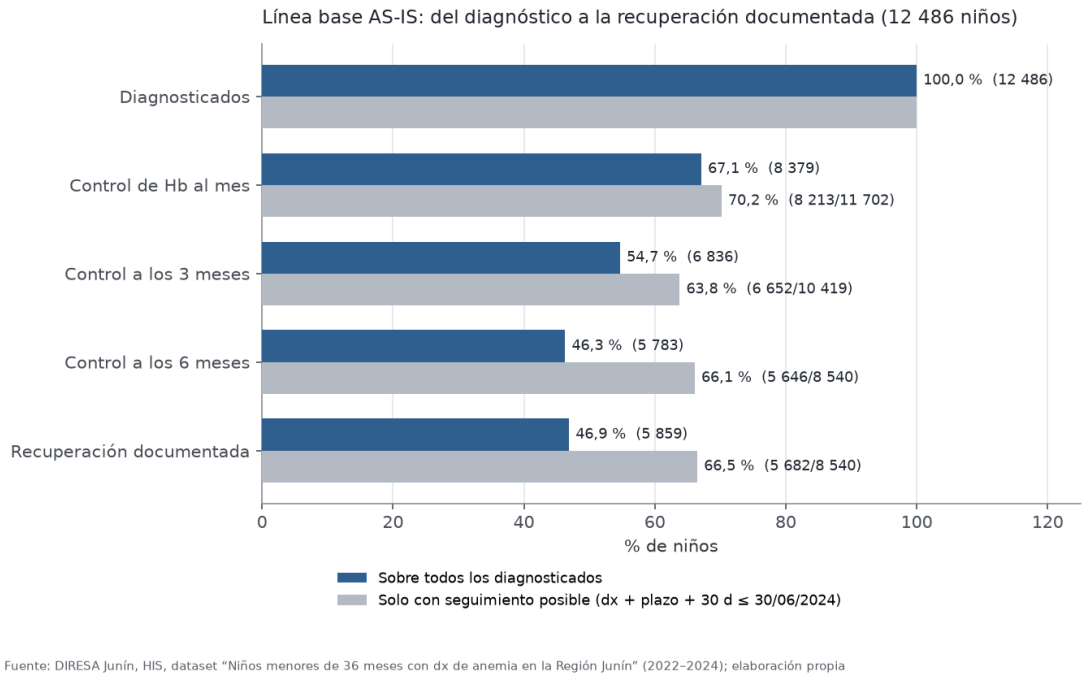

Cascada de seguimiento del AS-IS: del diagnóstico a la recuperación documentada.

Figura 1. Cascada de seguimiento del AS-IS (dataset DIRESA Junín, corte 30/06/2024), sobre todos los diagnosticados y con seguimiento posible.

El triple registro (historia clínica, tarjeta de control y HIS), la agenda calculada a mano, las barreras familiares invisibles hasta el abandono, la visita domiciliaria en papel, la identificación tardía del riesgo y la conectividad intermitente son las seis brechas B1 a B6 que guían el resto del informe (sección 3.1).

Alcance y límites. El sistema programa y vigila fechas y clasifica la hemoglobina con reglas referenciales: no diagnostica ni prescribe. Los datos son sintéticos (`scripts/cargar_datos_prueba.py`) o una muestra seudonimizada de la DIRESA (500 niños, sin DNI ni nombres). No hubo piloto en una posta, usuarios finales, ni validación de las reglas por la microred; el envío real de WhatsApp o SMS no se probó (modo simulado).

1.3 Objetivos del Proyecto e Informe Académico

- **Objetivo general:** diseñar, adaptar e implementar un proceso de software ejecutable y medible que soporte un sistema de seguimiento de anemia infantil alineado con las necesidades de la red de salud, y reportar con evidencia qué se logró y qué no.

Tabla 5. Objetivos específicos, indicador de logro y resultado al 30/10/2026.

N.°	Objetivo específico	Indicador de logro	Resultado	Sección
1	Diagnosticar el AS-IS y diseñar el TO-BE	Brechas con línea base real y mejora trazable por brecha	6 brechas con línea base DIRESA; 4 resueltas con mecanismo probado (M3.1 = 75,0 %), 1 parcial (B6) y 1 sin implementar (B5)	3.1
2	Adaptar el ciclo de vida (*tailoring*)	Decisión sustentada con factores y ponderación; control de desviaciones	Alternativa elegida 4,75 de 5 frente a 3,85 y 2,95; desviaciones medidas de +2, +5, +4 y −10 días	3.2, 3.3, 3.4
3	Implementar la solución con arquitectura hexagonal en GitHub	Dominio sin frameworks y dependencias verificadas	0 importaciones de terceros en dominio, puertos y aplicación; 25 pruebas de arquitectura; 5 etiquetas	3.5, 3.6
4	Evaluar producto y proceso con GQM, FURPS+, OWASP 2025 y CMMI-DEV	Métricas medidas con script y evidencia	M3.1 = 75,0 %; FURPS+ 87,7 % / 78,4 %; 12 hallazgos OWASP; CMMI nivel 2 en 3 áreas y nivel 1 en 4	3.6, 3.7, 3.8

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Enfoque de Procesos Organizacionales (AS-IS y TO-BE)

El enfoque de procesos exige analizar primero el proceso de la organización (AS-IS), identificar sus brechas y diseñar el TO-BE; solo entonces se define cómo el software soporta cada actividad. Justificar una solución solo con «usaremos IA o microservicios» invierte esa regla [4]. La relación que guía el diseño es *actividad mejorada → mejor resultado → valor organizacional*, expresada como cadena Entrada → Actividad → Resultado → Decisión → Acción → Valor y medida con cuatro tipos de indicador: de **proceso** (p. ej. tiempos), de **producto** (p. ej. disponibilidad, precisión), de **resultado** y de **valor organizacional** (reducción de pérdidas o riesgos).

Sommerville [5] define la mejora de procesos como comprender los procesos existentes y cambiarlos para elevar la calidad del producto o reducir costos y tiempos de desarrollo. Ese enfoque ordena la segunda mitad del informe (GQM, FURPS+, CMMI).

2.2 Modelos de Ciclo de Vida y Sastrería de Procesos (Tailoring)

El SWEBOK [6] organiza el área de procesos en definición, ciclos de vida, evaluación y mejora, medición y herramientas, e incluye la **adaptación del proceso** (*process adaptation*) como práctica explícita: el modelo se ajusta a los factores reales del proyecto en lugar de adoptarse por moda o por la herramienta disponible [4]. El modelo incremental entrega en cada incremento una funcionalidad operativa con las actividades de comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue [7]. Los modelos clásicos (cascada, espiral, desarrollo rápido y ágil) son alternativas entre las que se elige según el proyecto [8]. Sommerville [5] distingue dos enfoques de mejora: el de **madurez** (buenas prácticas técnicas y de gestión, orientado a calidad y previsibilidad) y el **ágil** (entrega rápida de funcionalidad y respuesta al cambio). El proyecto combina ambos: iterativo-incremental como ciclo de vida, Scrum como marco de gestión y DevOps como prácticas de ingeniería [9], [10].

2.3 Categorización Normativa de Procesos de Software

La norma ISO/IEC/IEEE 12207 [11] agrupa los procesos del ciclo de vida del software en procesos de contrato, organizacionales, de proyecto y técnicos, además de procesos de implementación y soporte. El curso los simplifica en tres categorías que este informe adopta con fines pedagógicos, sin afirmar conformidad con la norma:

- **Principales:** requisitos, análisis y diseño, implementación, integración y pruebas, despliegue.
- **De soporte:** gestión de configuración, aseguramiento de calidad, verificación y validación.
- **De gestión y organizacionales:** planificación y seguimiento, gestión de riesgos, mejora continua.

Para repartir responsabilidades se usa la matriz RAE (quién ejecuta, quién revisa, quién aprueba) y los tres roles del curso: Ingeniero de Proceso, de Desarrollo y Prototipado, y de Calidad y Mejora [12].

2.4 Arquitectura de Software Hexagonal (Puertos y Adaptadores)

Cockburn [13] propone aislar la lógica de aplicación de sus actores externos mediante **puertos** (interfaces que expresan lo que la aplicación ofrece o necesita) y **adaptadores** (implementaciones que traducen entre un puerto y una tecnología concreta). Las dependencias apuntan siempre hacia el dominio, que puede probarse sin interfaz de usuario ni base de datos. La Tabla 27 (sección 3.6) traduce esas piezas a las carpetas del repositorio.

2.5 Modelos de Evaluación de Calidad y Procesos (GQM, FURPS+, OWASP 2025 y CMMI)

Tabla 6. Modelos de evaluación usados y su operacionalización en el proyecto.

Modelo	Definición (fuente)	Cómo se usa aquí
GQM	Cada **meta** se refina en **preguntas** y cada pregunta en **métricas**; las metas se redactan con objeto, propósito, enfoque de calidad, punto de vista y contexto [14]	3 metas (arquitectura, pruebas, valor), 6 métricas con script en `herramientas/gqm/`, recalculadas para Inc. 1 a Inc. 4
FURPS+	Funcionalidad, Usabilidad, Confiabilidad (*Reliability*), Rendimiento (*Performance*) y Soportabilidad, más restricciones de implementación, interfaz, operaciones, empaquetamiento y legales [15], [16]	Índice ponderado F 30 %, U 15 %, R 15 %, P 15 %, S 10 %, + 15 %; variables medidas con scripts
WCAG 2.1 AA	Contraste mínimo de 4,5:1 para texto (1.4.3) y 3:1 para componentes (1.4.11); el color no es el único canal (1.4.1); operable por teclado (2.1.1) [17]	Axe-core por pantalla y cálculo propio de contraste (factor U)
OWASP Top 10:2025	Diez categorías de riesgo de aplicaciones web, A01 Broken Access Control a A10 Mishandling of Exceptional Conditions [18]	30 comprobaciones estáticas, 32 dinámicas, SAST y SCA (factor +)
CMMI-DEV	Áreas de práctica agrupadas en gestión de procesos, gestión de proyectos, ingeniería y soporte (PP, PMC, REQM, CM, PPQA, VER, VAL, CAR…); niveles de madurez 1 a 5 en la representación escalonada [8] y niveles de capacidad por área en la continua [19]	Representación continua con niveles 0 a 3 por área: ESTIM, PLAN, PQA, CM, VER, VAL y CAR

Revisión, verificación, validación y mejora continua. Blanco-Llano y Rodríguez-Hernández distinguen tres controles sobre el desarrollo de software, definidos a partir de ISO 9000 e ISO/IEC 12207 [20]:

- La **revisión técnica** comprueba que cada artefacto de una etapa está completo y conforme con el proceso definido.
- La **verificación** confirma con evidencia objetiva que la salida de cada etapa cumple los requisitos de su entrada. Exige trazabilidad entre requisitos y pruebas, y que los resultados de las pruebas sean repetibles.
- La **validación** confirma con el cliente, en el ambiente de operación (pruebas de aceptación o piloto), que el producto sirve para el uso previsto.

Los autores ordenan los tres controles según el ciclo de Shewhart/Deming. Torres Saumeth et al. describen ese ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) como un ciclo dinámico que se aplica dentro de cada proceso y que tiene como eje la mejora

continua; frente a los modelos Malcolm Baldrige, EFQM e Iberoamericano, más integrales y orientados a la gestión global de la organización, el PHVA tiene un perfil técnico y se aplica a cualquier proceso [21].

En este informe la revisión corresponde a PQA (revisión de PR y revisión independiente), la verificación a VER (pruebas automáticas, análisis estático y CI) y la validación a VAL (fichas funcionales, producción y la aceptación del usuario, aún pendiente). El ciclo PHVA ordena el tratamiento de los hallazgos de la sección 3.8 y de las observaciones a la entrega de la semana 12 (control de cambios).

3. DESARROLLO DEL PROCESO Y PRODUCTO DE SOFTWARE (INTEGRACIÓN DE GUÍAS DE TRABAJO)

Los ocho ejes siguientes recorren el proyecto en el orden en que se ejecutó: primero el proceso (3.1 a 3.4), luego el primer incremento (3.5) y finalmente la evaluación del producto y del proceso con cuatro modelos (3.6 a 3.8). Toda cifra corresponde al código de la etiqueta `v4.0-Inc4` (commit `e6886e2`, 30/10/2026) y cada tabla indica su fuente. Lo que se midió con datos sintéticos, con el dataset real anonimizado de la DIRESA o no se midió se distingue en cada caso.

3.1 EJE 1: Diagnóstico y Diseño del Proceso Organizacional (AS-IS / TO-BE)

Matriz 3.1.1: Identificación de actores y necesidades del sistema

Tabla 7. Actores, necesidad operativa, decisión que toman en el proceso y soporte en `v4.0-Inc4` (S1, Tabla 2).

Actor	Necesidad operativa	Decisión que debe tomar en el proceso	Soporte en `v4.0-Inc4`
Niña o niño menor de 5 años	Tamizaje, tratamiento y controles oportunos y continuos	Ninguna clínica; es el beneficiario final	Expediente único con agenda de controles
Familia o cuidador	Recordatorios de cita, canal de bajo costo para confirmar o reportar una barrera	Acudir al control, dar el suplemento en casa, comunicar barreras	Recordatorio con respuesta 1, 2 o 3 y registro de barreras (envío real no probado: modo SIMULADO)
Personal de salud	Registro nominal sin redundancia y alertas de niños en riesgo de abandono	Evaluar, indicar o ajustar el tratamiento y referir	Registro con clasificación por altitud, agenda normativa, alertas de vencidos y de barreras críticas
Agente comunitario	Herramienta utilizable sin conexión para visitas y barreras	A quién visitar primero y qué barrera escalar	Lista de visitas priorizada con puntaje explicable; cola local y sincronización idempotente
Gestión territorial (red y microred)	Información consolidada y oportuna	Dónde supervisar y asignar recursos	Reporte del periodo en JSON y CSV; el tablero territorial (INC-6) no se construyó
MINSA	Estadísticas fiables de cumplimiento	Supervisar el seguimiento	Sin integración con el HIS; solo el reporte del periodo

El sistema solo distingue «usuario autenticado»: no hay roles por actor ni segmentación por establecimiento (hallazgo H-1 de la sección 3.7). Los seis actores son los de la visión del proceso; el software atiende en la práctica a personal de salud y agentes comunitarios.


Matriz 3.1.2: Matriz de brechas operativas (AS-IS frente a TO-BE)

Tabla 8. Brechas B1 a B6 con su línea base real, la mejora TO-BE y el estado medido con GQM en `v4.0-Inc4` (S1, Tablas 3 y 4; S9, Tabla 32; adenda S9, sección 3).

ID	Proceso actual (AS-IS)	Brecha y línea base	Consecuencia	Proceso propuesto (TO-BE)	Puntaje M3.1 en `v4.0-Inc4`
B1	Triple registro: historia clínica, tarjeta de control y digitación en el HIS	Sin registro nominal único; en el HIS `num_doc` se repite en 49,4 % de las filas (6 167 de 12 486)	Errores de digitación y estado real del niño poco confiable	M1: registro nominal único y validado	**1,0**: 3 registros por evaluación pasan a 1; DNI repetido responde 409
B2	Agenda calculada a mano, sin recordatorios	Dosaje de control registrado al	Controles fuera de ventana y citas olvidadas	M2: agenda normativa; M3: recordatorio a la	**1,0**: 140/140 niños activos con agenda, 1 638/1


ID	Proceso actual (AS-IS)	Brecha y línea base	Consecuencia	Proceso propuesto (TO-BE)	Puntaje M3.1 en `v4.0-Inc4`
		mes 67,1 %, a los 3 meses 54,7 % y a los 6 meses 46,3 %		familia	638 controles vencidos visibles en la muestra real de 500 niños (Inc. 2); recordatorios solo en modo simulado
B3	Barreras (transporte, economía, olvido) ocultas hasta el abandono	17,9 % de los niños sin ningún control a 1, 3 o 6 meses; el HIS no registra barreras	Abandono silencioso	M3: respuesta del tutor y reporte de barreras que genera alerta	**1,0**: 8 tipos de barrera, alerta de barreras críticas; reglas sin validar con la microred
B4	Visita domiciliaria semanal en papel y sin conexión	El HIS no registra visitas; no hay línea base	Cobertura insuficiente y demora en escalar barreras	M4: visitas priorizadas y formulario estructurado	**1,0**: puntaje explicable `VISITA-V1/V2` (0 a 115) y captura sin conexión; pesos sin validar
B5	El riesgo se identifica cuando el abandono ya ocurrió	53,7 % sin dosaje a 6 meses (33,9 % con seguimiento posible)	Intervención tardía	M5: score de riesgo de abandono	**0,0**: no hay modelo ni regla de riesgo; la visita priorizada es reactiva
B6	Cobertura móvil intermitente y consolidación posterior	Sin medición en el HIS	Datos perdidos e indicadores tardíos	M6: registro sin conexión con sincronización	**0,5**: sincronización idempotente probada con E2E simulados; sin prueba en dispositivo real ni tablero INC-6

Resultado: **M3.1 = 4,5 / 6 = 75,0 %**. Cuatro brechas (B1 a B4) tienen mecanismo operativo y probado **en el entorno de pruebas**; ninguna se midió en una posta.

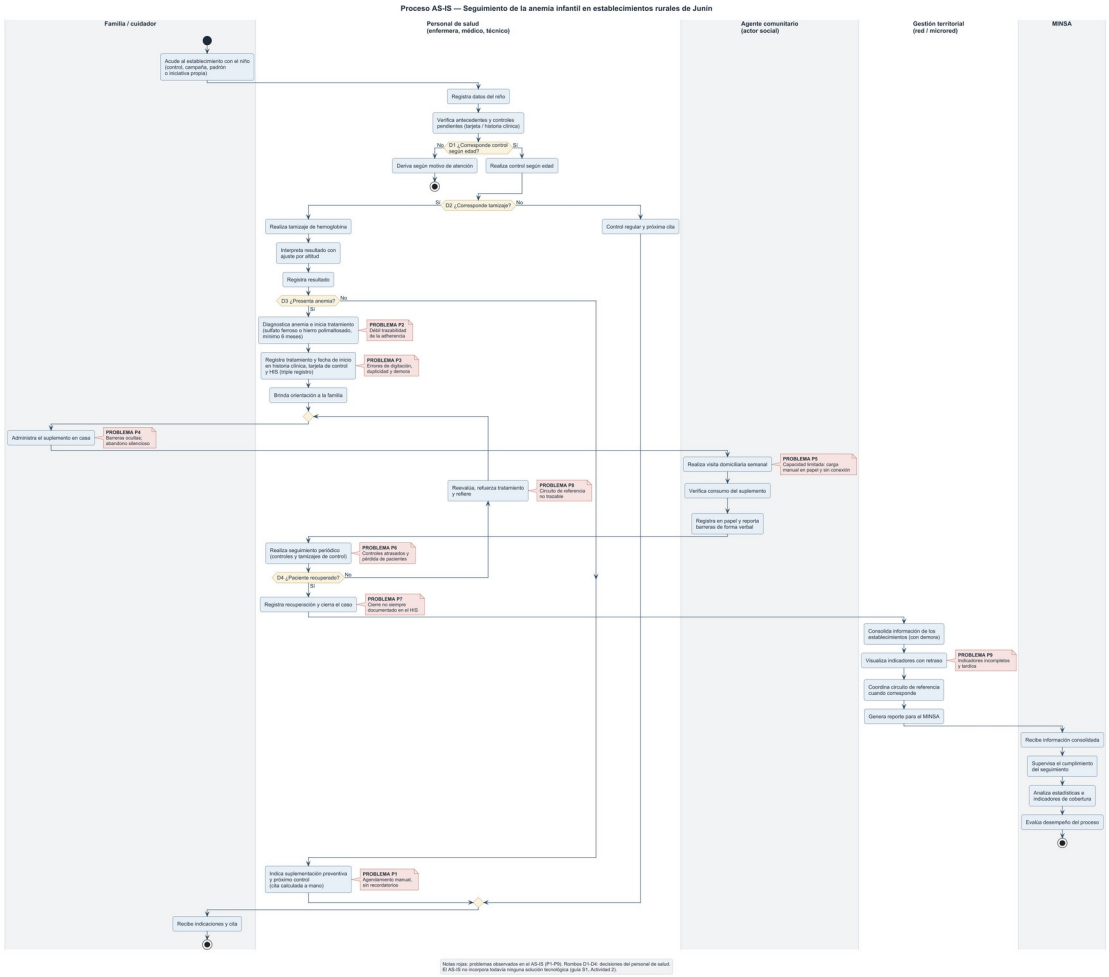

Proceso AS-IS por carriles de actor.

Figura 2. Proceso AS-IS por carriles de actor con las notas de problema de cada actividad (S1).

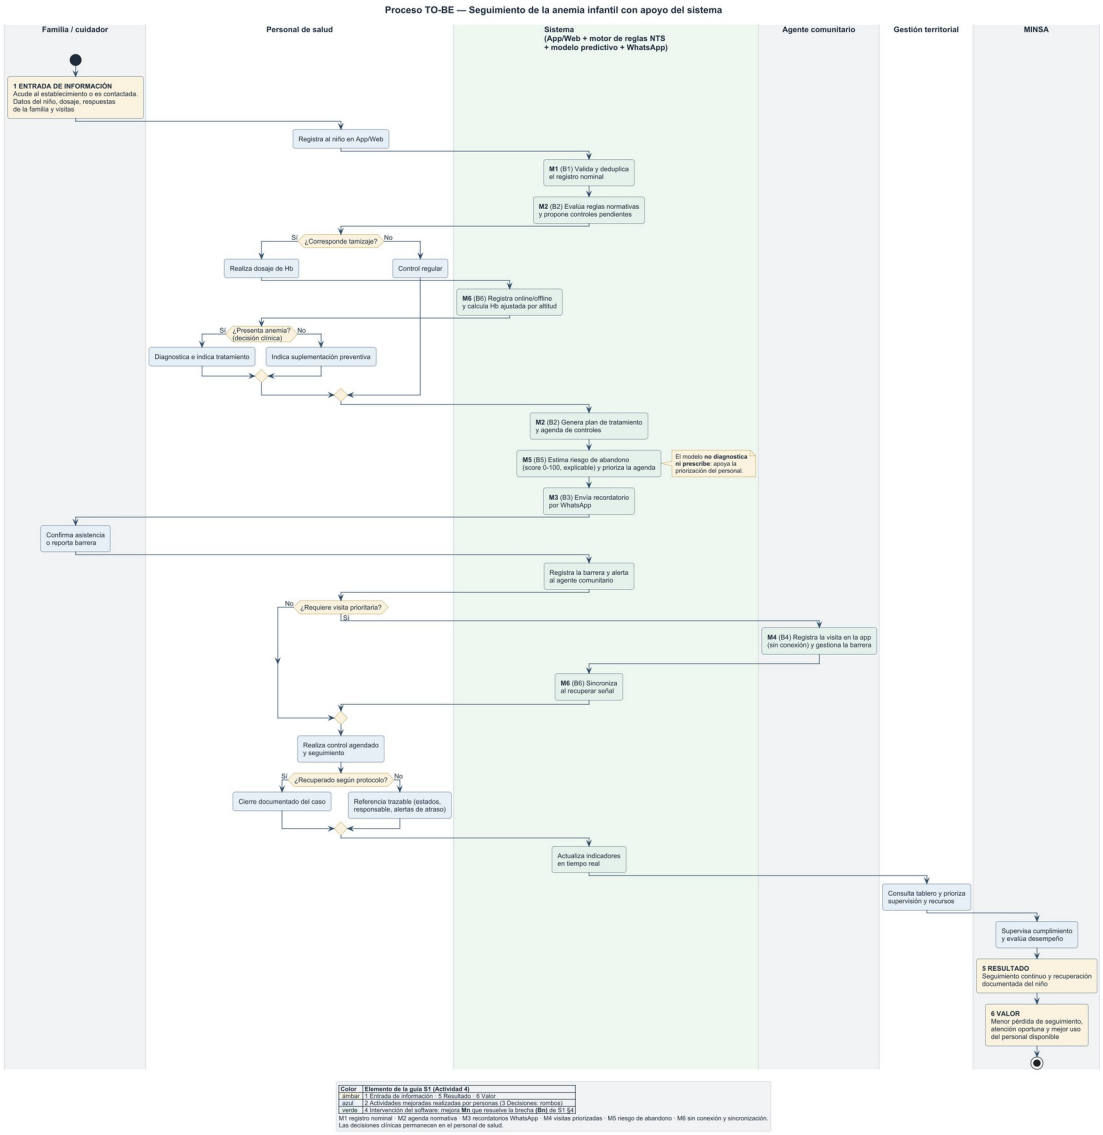

Proceso TO-BE por carriles de actor con el carril Sistema.

Figura 3. Proceso TO-BE con el carril «Sistema» y las mejoras M1 a M6 (S1). Las decisiones clínicas siguen siendo humanas.

Sistema de indicadores de gestión del proceso

La guía de S1 fijó catorce indicadores sin metas numéricas, porque toda meta exige una línea base medida y aprobación institucional. Con la línea base DIRESA ya medida, la Tabla 8 muestra cuatro indicadores representativos, uno por tipo, con lo que se midió y lo que solo un piloto puede medir.

Tabla 9. Indicadores por tipo: línea base AS-IS, valor en `v4.0-Inc4` y condición de la medición.

Tipo	Indicador	Línea base AS-IS	Valor en `v4.0-Inc4`	Meta de referencia	Lectura
Proceso	Registros por	3	1	1	Medido con

Tipo	Indicador	Línea base AS-IS	Valor en `v4.0-Inc4`	Meta de referencia	Lectura
	evaluación (V1)				datos sintéticos (150 niños)
Proceso	Controles vencidos visibles para el personal (V2, V3)	0 % (no existe agenda)	100 % (140/140 con agenda; F1 = 1,000, 476/476 controles)	100 %	Medido contra un oráculo independiente, con datos sintéticos; el dataset real se midió en Inc. 2 (1 638/1 638)
Producto	Disponibilidad durante la carga (V5) y p95 agregado (V4)	sin medida	100 % (64/64 sondas); p95 = 1 100 ms (una corrida, 50 usuarios, 2 CPU compartidas)	disponibilidad ≥ 99,5 %; p95 < 800 ms	La disponibilidad cumple; **el p95 no cumple la meta** y es un riesgo (S10, criterio P2: 2 000 ms con 100 usuarios)
Resultado	Pérdida de seguimiento a 6 meses	53,7 % (6 703/12 486)	No medido	Sin meta aprobada	Exige un piloto con niños reales; el sistema no puede atribuirse esa mejora
Valor organizacional	Brechas resueltas (M3.1)	0 de 6	4,5 de 6 = 75,0 %	66,7 % acumulado propuesto para INC-4 (no aprobado)	Mecanismos probados en entorno de pruebas

3.2 EJE 2: Selección y Adaptación del Modelo de Ciclo de Vida (Tailoring)

Matriz 3.2.1: Análisis de factores de adaptación del proyecto

Tabla 10. Factores de adaptación con su evidencia en el proyecto (S2, Tabla 1; doce factores evaluados, los ocho con mayor poder de decisión).

Factor de adaptación	Situación real del proyecto	Nivel	Justificación técnica de la adaptación
Incertidumbre de requisitos	Los criterios clínicos están acotados por la norma, pero la interacción por WhatsApp, el modo sin conexión y el componente predictivo no	**Alto**	Exige iteraciones cortas para validar cada incremento antes de construir el siguiente
Complejidad técnica	API REST, base relacional, cola local, autenticación externa, notificador y service worker	**Alto**	Exige desacoplamiento (arquitectura hexagonal): el dominio no puede depender de FastAPI ni de SQLAlchemy
Cambios esperados	Reglas de agenda, pesos de visita y reglas de barreras serán ajustados por la microred	**Alto**	Descarta Cascada: el costo de retrabajo de congelar requisitos es inaceptable
Riesgo tecnológico	Cobertura móvil intermitente y dependencia de la API de WhatsApp	**Alto**	Obliga a probar la sincronización y el notificador en cada incremento y a mantener un modo simulado
Necesidad de retroalimentación	El personal debe validar que las alertas coincidan con su criterio	**Alto**	Exige revisión formal del incremento con el usuario (Scrum)
Necesidad de integración	HIS, WhatsApp, SMS, autenticación y base gestionada	**Alto**	Requiere pruebas de integración automatizadas (219 contra PostgreSQL 16 en el CI)
Participación del usuario	Seis actores con decisiones propias	**Alto**	Entregas incrementales demostrables a cada actor
Criticidad del sistema	Apoya decisiones sobre salud infantil	**Alto**	Exige pruebas automatizadas, integración continua y reglas clínicas probadas en sus valores límite

Selección del modelo híbrido adaptado

Se compararon siete enfoques con seis criterios (escala 1 a 5): Cascada 8, Incremental 18, Espiral 21, Kanban 21, DevOps 26, MLOps 26 y Scrum 27 puntos sobre 30. La puntuación más alta no decide por sí sola: ningún enfoque cubre la gestión iterativa con el usuario, la entrega automatizada y el gobierno del modelo a la vez. Por eso se evaluaron combinaciones con pesos que privilegian adaptabilidad, riesgos, entrega incremental y retroalimentación (15 % cada uno).

Tabla 11. Matriz de decisión ponderada entre tres alternativas (S2, Tabla 6).

Criterio	Peso	Alt. 1: iterativo-incremental + Scrum + DevOps + MLOps	Alt. 2: Kanban + DevOps + DataOps	Alt. 3: Incremental + Espiral sin automatización
Adaptabilidad	15 %	5	4	3
Gestión de riesgos	15 %	4	3	4
Entrega incremental	15 %	5	4	3
Retroalimentación	15 %	5	4	3
Integración	10 %	4	4	3
Automatización	10 %	5	5	2
Gestión de datos e IA	10 %	5	4	2
Participación del usuario	10 %	5	3	3
Puntaje ponderado (de 5)	**100 %**	**4,75**	**3,85**	**2,95**

Modelo seleccionado: desarrollo iterativo e incremental, gestionado con Scrum (sprints de dos semanas), con prácticas DevOps para integración, pruebas y despliegue, y prácticas MLOps reservadas al INC-5. Cascada se descartó porque el componente de IA y las reglas de la microred impiden congelar requisitos; Scrum aislado no define cómo automatizar la entrega a postas dispersas, y DevOps aislado no organiza la retroalimentación con el personal de salud.

Qué se aplicó realmente. El modelo se contrastó con la ejecución:

Tabla 12. Prácticas del modelo seleccionado: lo planificado frente a lo ejecutado al 30/10/2026.

Práctica	Planificado	Ejecutado (evidencia)	Brecha
Entrega incremental	6 incrementos, 133 puntos de historia (SP)	4 incrementos entregados (INC-1 a INC-4), 76 de 133 SP (57,1 %); cada uno con etiqueta (`v1.0-PMV`, `v2.0-Inc2`, `v3.0-Inc3`, `v4.0-Inc4`)	INC-5 (modelo predictivo) e INC-6 (tablero) sin construir
Scrum	Sprints de 2 semanas, backlog con estimación, revisión con la posta, retrospectiva	Backlog estimado con SP (S3-4); seguimiento en `coordinacion/TABLERO.md`	Sin actas de revisión con el personal de salud; sin tablero de GitHub Projects («No projects found»); sin horas reales registradas
DevOps	Integración continua, pruebas automáticas, despliegue automatizado	GitHub Actions con tres trabajos (`calidad-y-pruebas`, `imagen`, `produccion`); 660 pruebas y 28 E2E; despliegue a Render y Supabase desde `main`; producción verificada el 31/10/2026: `/openapi.json` declara `4.0.0-inc4` con 29 rutas	SAST y auditoría de dependencias fuera del CI; protección de `main` no verificable

Práctica	Planificado	Ejecutado (evidencia)	Brecha
MLOps	Pipeline de datos, experimentación y monitoreo del modelo	No ejecutado	Depende del INC-5

3.3 EJE 3: Operatividad, Actividades, Responsabilidades RAE y DoD

Matriz 3.3.1: Categorización normativa, productos de trabajo y responsables RAE

La categorización es la simplificación del curso (sección 2.3), sin afirmar conformidad con la ISO/IEC/IEEE 12207 [11]. Los roles de la plantilla se asignan según la Tabla 1. La aprobación del Product Owner corresponde a un rol que el equipo **simuló**: no hubo un representante de la posta que aprobara historias ni incrementos.

Tabla 13. Categoría normativa, actividad, producto de trabajo y responsables (R: ejecuta, Rv: revisa, A: aprueba; S3-4, Tabla 6; S11, Tabla 12).

Categoría	Actividad específica del proyecto	Producto de trabajo	R	Rv	A	Evidencia en el repositorio
Proceso principal	Refinamiento de requisitos e historias	Backlog priorizado con criterios Dado-Cuando-Entonces (48 verificados)	Porras V.	Huamani R.	Product Owner (simulado)	`entregables/semana-03-04/`; `semana-09/metricas/datos/m21_cobertura_rf.json`
Proceso principal	Diseño de la arquitectura hexagonal	14 ADR, contrato OpenAPI (29 rutas), diagramas	Auqui H.	Huamani R.	Porras V.	`pmv_fastapi/docs/adr/`, `docs/openapi.json`
Proceso principal	Construcción del código	Módulos ejecutables en `pmv_fastapi/app/` (142 archivos Python)	Auqui H.	Huamani R.	Huamani R.	Repositorio, etiqueta `v4.0-Inc4`
Proceso principal	Pruebas	660 pruebas pytest y 28 E2E con Playwright	Huamani R.	Porras V.	Huamani R.	`pmv_fastapi/tests/`
Proceso principal	Despliegue	Imagen Docker, Render y Supabase	Auqui H.	Huamani R.	Porras V.	`Dockerfile`, trabajo `produccion` de `ci.yml`; producción verificada el 31/10/2026 (Anexo B)
Proceso de soporte	Gestión de configuración	Repositorio Git con 5 etiquetas y ramas `feature/*`	Auqui H.	no definido en S3-4	no definido en S3-4	Etiquetas `v1.0-PMV` a `v4.0-Inc4` (Anexo B)
Proceso de soporte	Aseguramiento de calidad (PQA)	Ruff, informe de revisión independiente, defectos DEF-01 a DEF-09	Huamani R.	Porras V.	Huamani R.	`registro_defectos*.md`, informe T-020
Proceso de soporte	Verificación y validación	19 fichas de prueba con capturas	Huamani R.	Auqui H.	firma pendiente	Sección 3.6.3


Categoría	Actividad específica del proyecto	Producto de trabajo	R	Rv	A	Evidencia en el repositorio
Proceso de gestión	Planificación y control de desviaciones	Plan por sprint, plan frente a real	Porras V.	Huamani R.	Porras V.	`coordinacion/TABLERO.md`; Tabla 16
Proceso de gestión	Retrospectiva y mejora	Plan de mejora CMMI con 19 acciones	Porras V.	Equipo	Porras V.	Sección 3.8

Definición de terminado (DoD)

La DoD vigente es la de S3-4 (Tablas 8 y 9). La Tabla 13 la verifica contra `v4.0-Inc4` e incluye el criterio de análisis estático que la plantilla fija con SonarQube y que en el proyecto se cubrió con otras herramientas.

Tabla 14. Verificación de la DoD en `v4.0-Inc4`.

N.°	Criterio de terminado	Verificación en `v4.0-Inc4`	Estado
1	Todo criterio de aceptación se verifica con al menos una prueba automatizada	416 unitarias, 219 de integración, 25 de arquitectura y 28 E2E, todas aprobadas	Cumple
2	La regla de negocio vive en el dominio o en la configuración normativa (ADR-001)	0 importaciones de terceros en 86 clases del dominio; 25 pruebas de arquitectura	Cumple
3	Pruebas en verde, cobertura ≥ 80 % y 0 hallazgos de Ruff	Cobertura 99,79 % (4 025 + 675 de 4 030 + 680 líneas y ramas); Ruff: 0 errores y 142 archivos formateados	Cumple
4	Disponible en la interfaz y en la API con el mismo caso de uso; `openapi` al día	Contrato de 29 rutas verificado en el CI con Python 3.11	Cumple
5	Pruebas funcionales de interfaz con capturas adjuntas en la ficha	19 de 19 escenarios con 54 capturas (sección 3.6.3)	Cumple
6	Análisis estático sin vulnerabilidades críticas (la plantilla pide SonarQube con 0 vulnerabilidades)	SonarCloud: primer análisis del repositorio el 05/11/2026 (Quality Gate aprobado sobre el código nuevo; 129 hallazgos en el código completo, 0 en el backend desplegado; ver la ficha VER de la sección 3.8); bandit: 0 altas, 0 medias, 1 baja (falso positivo); pip-audit: 0; semgrep: 151 hallazgos clasificados; la revisión manual halló 1 hallazgo de severidad alta (H-1)	**No cumple** como la plantilla lo define
7	Código revisado por pares y aprobado en el *pull request*	La PR #8 se fusionó con 6 verificaciones en verde, sin revisión formal «Approved»; las PR #6 y #7 se fusionaron con verificaciones en rojo	**No cumple**
8	Demostrada en la revisión del sprint y aceptada	Sin actas de revisión con el personal de salud	**No cumple**

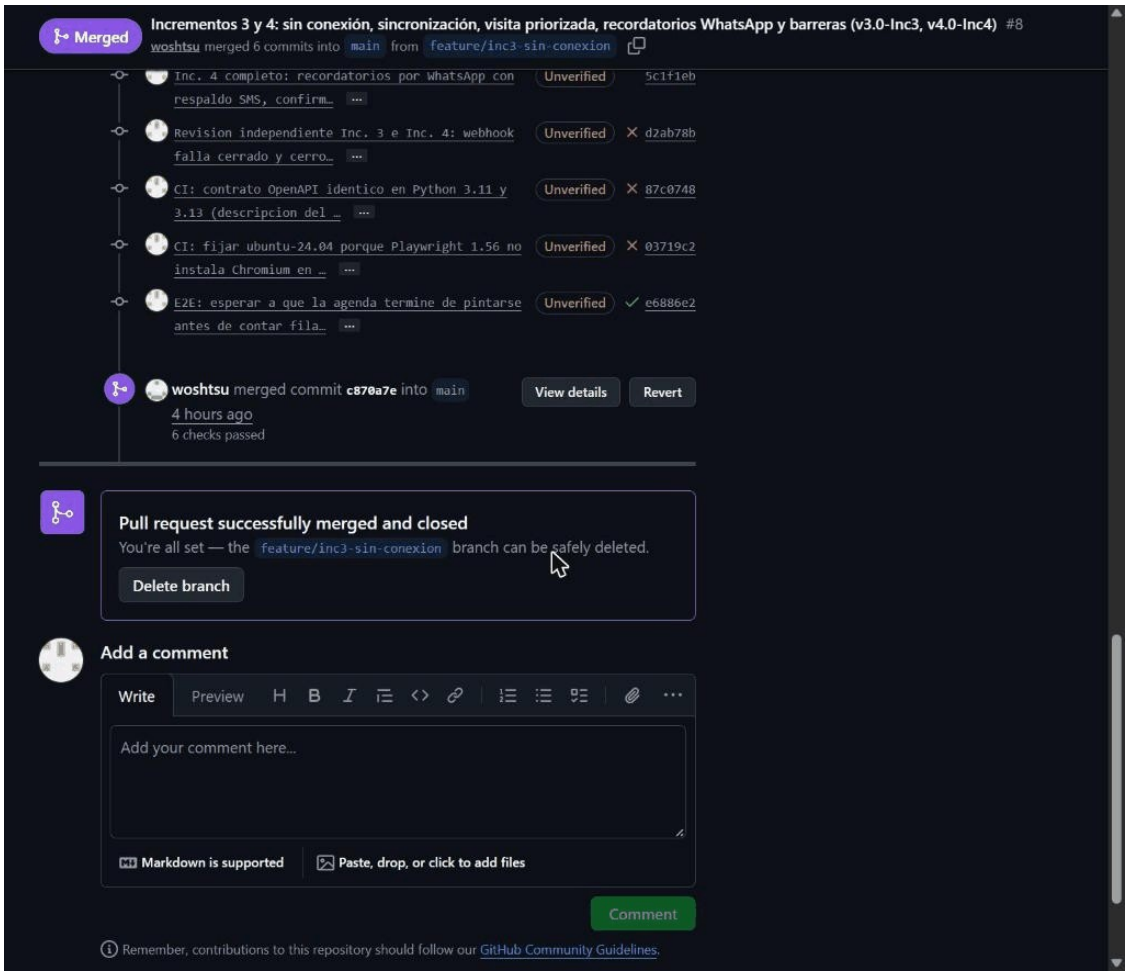

Línea de tiempo de la PR #8 en GitHub.


Figura 4. PR #8 (incrementos 3 y 4) en estado «Merged» con 6 verificaciones aprobadas; la línea de tiempo no muestra ninguna revisión «Approved» (captura de GitHub, 30/10/2026).

La DoD mide cuánto código se ejecuta y no la variedad de entradas: con 99,79 % de cobertura, la revisión independiente de los incrementos 3 y 4 todavía halló cinco defectos, uno de seguridad (sección 3.8). Seguridad, accesibilidad y rendimiento no forman parte de la DoD (hallazgo H8 de S11).

3.4 EJE 4: Planificación, WBS, Priorización Valor/Riesgo y Control de Desviaciones

Estructura de descomposición del trabajo (WBS)

```
PROYECTO ANEMIA JUNÍN
├── INC-1 PMV · Registro nominal y expediente (21 SP) ........ v1.0-
PMV
│   ├── HIST-1.1 / RF-01 Registro con evaluación inicial
│   ├── HIST-1.2 / RF-02 Expediente y nuevo control
│   ├── HIST-1.3 / RF-03 Validación con reglas clínicas
│   ├── HIST-1.4 / RF-04 Listado de seguimiento
│   └── HIST-1.5 / RF-05 Reporte del periodo
├── INC-2 Agenda automática y alertas (18 SP) ................ v2.0-
Inc2
│   ├── HIST-2.1 / RF-06 Agenda normativa     ├── HIST-2.2 / RF-07
Alertas priorizadas
│   └── HIST-2.3 / RF-08 Agenda del personal  └── HIST-2.4 / RF-09
Asistencia a controles
├── INC-3 Sin conexión y sincronización (21 SP) .............. v3.0-
Inc3
│   ├── HIST-3.1 a HIST-3.4 Cola local, sincronización, conflictos,
pendientes
│   └── VIS-3.5 Visita domiciliaria priorizada
├── INC-4 WhatsApp y barreras (16 SP) ........................ v4.0-
Inc4
│   └── HIST-4.1 a HIST-4.4 Recordatorios, respuesta del tutor,
barreras, alertas críticas
├── INC-5 Modelo predictivo (34 SP) ........................... no
implementado
└── INC-6 Tablero territorial (15 SP) ......................... no
implementado
```

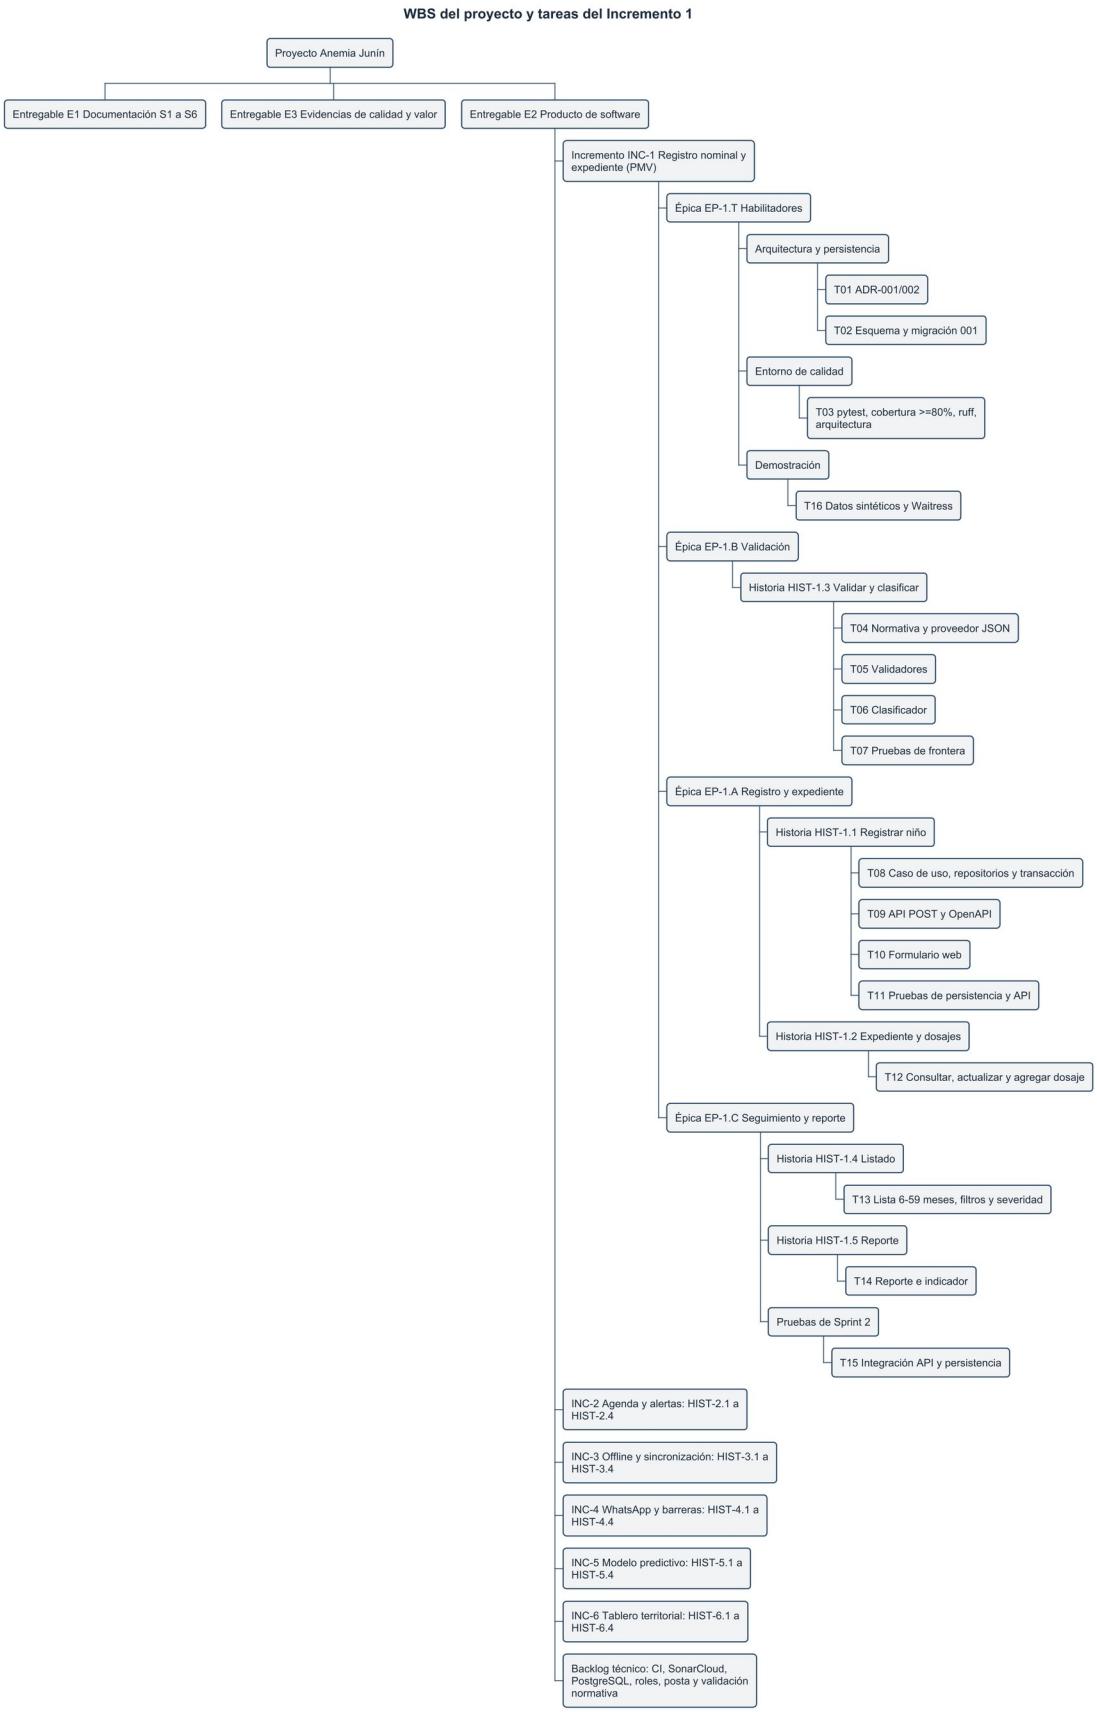


WBS del proyecto y tareas del Incremento 1.

Figura 5. WBS: Proyecto, entregables E1 a E3, incrementos INC-1 a INC-6, épicas, historias y tareas del Incremento 1 (S3-4).

Tabla 15. Descomposición por incremento con estimación, prioridad y resultado al 30/10/2026 (S3-4, Tablas 10, 17 y 19; S11, Tabla 5a).

Incremento	Historias	SP	Puntaje de priorización	Resultado
INC-1 Registro nominal y expediente (PMV)	HIST-1.1 a HIST-1.5 (RF-01 a RF-05)	21	4,60 (1.°)	Entregado: `v1.0-PMV`
INC-2 Agenda automática y alertas	HIST-2.1 a HIST-2.4 (RF-06 a RF-09)	18	4,15 (3.°)	Entregado: `v2.0-Inc2`
INC-3 Sin conexión y sincronización	HIST-3.1 a HIST-3.4, más VIS-3.5 (sin estimar)	21	4,40 (2.°)	Entregado: `v3.0-Inc3`
INC-4 WhatsApp y barreras	HIST-4.1 a HIST-4.4	16	3,40 (4.°)	Entregado: `v4.0-Inc4` (envío real sin probar)
INC-5 Modelo predictivo	HIST-5.1 a HIST-5.4	34	3,35 (5.°)	No implementado
INC-6 Tablero territorial	HIST-6.1 a HIST-6.4	15	2,75 (6.°)	No implementado
Backlog técnico	BT-01 a BT-03, BT-08, BT-09	8	no priorizado	Parcial (CI y E2E implantados; SonarCloud con primer análisis el 05/11/2026, aún fuera del CI)
Total		**133**		**76 SP entregados en los cuatro incrementos (57,1 %)**

Priorización valor y riesgo. El puntaje ponderado combina valor (30 %), reducción de riesgo (25 %), dependencia técnica (20 %), factibilidad (15 %) y validación (10 %). INC-1 lidera porque es prerrequisito de todos los demás; INC-3 puntúa por encima de INC-2, pero se ejecutó después porque requería el pipeline de integración continua y la decisión sobre la base central (nota de S3-4 sobre el calendario). Dentro del INC-1 se construyó primero la clasificación normativa (HIST-1.3) y después el formulario, porque un umbral clínico mal transcrito invalidaría todo lo posterior.

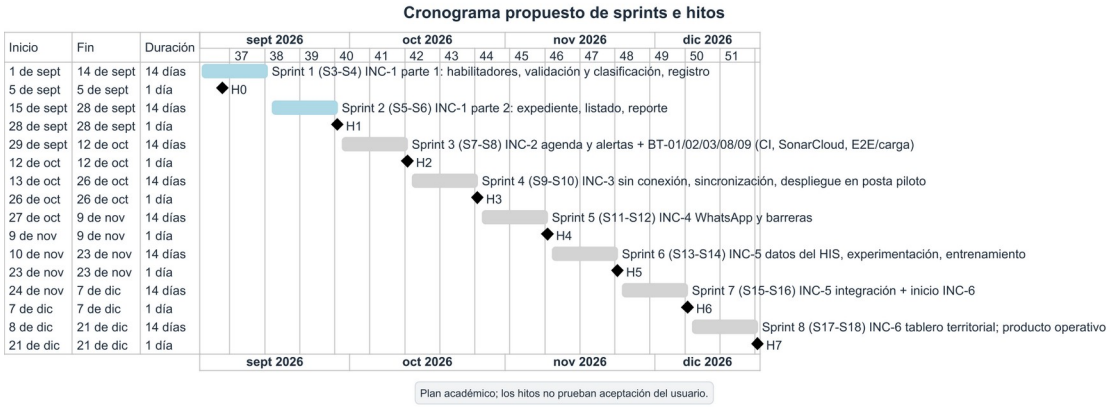

Cronograma de los ocho sprints con incrementos e hitos H0 a H7.


Figura 6. Cronograma planificado de ocho sprints con incrementos e hitos H0 a H7 (S3-4).

Matriz de control de desviaciones del proyecto

Tabla 16. Plan frente a real por incremento. El porcentaje es el desvío en días sobre la duración planificada del sprint (cálculo propio); las fechas reales son las del commit o la etiqueta que entrega el software (S11, Tabla 5a; S9, Tabla 6).

Incremento (sprint)	Avance planificado	Avance real	Desviación	Causa raíz	Acción correctiva
INC-1 (sprints 1-2, 01-28/09)	21 SP al hito H1, 28/09	21 SP, `v1.0-PMV` el 30/09	+2 días (+7,1 % de 28 días)	Sin registro de horas; acta de aceptación pendiente	Registrar horas reales por tarea (acción 1 del plan)
INC-2 (sprint 3, 29/09-12/10)	18 SP al hito H2, 12/10	10 SP al 16/10 (hito `v1.5.0-inc2-avance`); 18 SP el 17/10	+5 días (+35,7 % de 14 días)	El sprint absorbió el informe integrador de S6 y la reestructuración hexagonal (ADR-008) sin holgura	Cerrar HIST-2.3 y HIST-2.4; reservar 20 % de capacidad por sprint (acción 7)
INC-3 (sprint 4, 13-26/10)	21 SP al hito H3, 26/10	21 SP más VIS-3.5; `v3.0-Inc3` el 30/10	+4 días (+28,6 % de 14 días)	Arrastre del atraso de INC-2 y alcance adicional (VIS-3.5) sin estimar; causa probable, sin registro de horas	La replanificación propuesta en S9 no se adoptó; el equipo recuperó el plan
INC-4 (sprint 5, 27/10-09/11)	16 SP al hito H4, 09/11	16 SP; `v4.0-Inc4` el 30/10	−10 días (−71,4 % de 14 días)	Se adelantó la entrega para recuperar el plan original	Pruebas de campo y envío real quedan pendientes
INC-5 (sprints 6 y 7, 10/11-07/12)	Datos del HIS validados y modelo entrenado al hito H5, 23/11;	Al 06/11 no ha iniciado, como prevé el plan. El criterio de datos se cumple (8 540 diagnósticos con seguimiento posible, mínimo 500), pero la	0 días (el sprint empieza el 10/11)	Probable: el sprint 5 se dedicó a adelantar INC-4 y a los informes S11 y S12; sin registro de horas no se puede	Hacer la limpieza y el versionado en la primera semana del sprint 6, junto con la experimentación

Incremento (sprint)	Avance planificado	Avance real	Desviación	Causa raíz	Acción correctiva
	integración al H6, 07/12 (34 SP)	limpieza y el versionado que el plan ubicaba en el sprint 5 no se hicieron		confirmar	

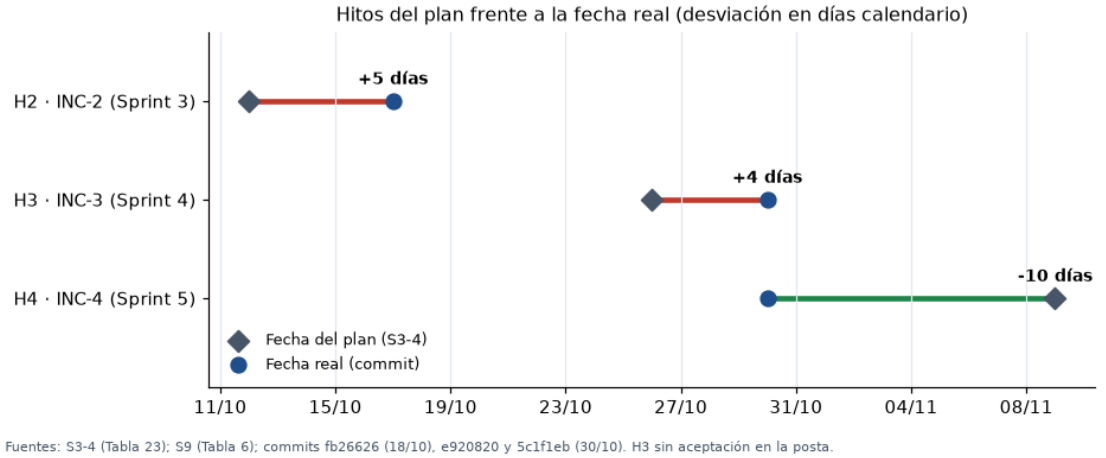

Hitos H2 a H4: fecha del plan frente a la fecha real.

Figura 7. Hitos H2 a H4, plan frente a real (elaboración propia a partir de S3-4 y de los commits).

Avance al inicio de la semana 13. Según el calendario de S3-4, la semana 13 abre el Sprint 6 (10 al 23/11/2026), dedicado al Incremento 5: validación de los datos del HIS, experimentación y entrenamiento del modelo predictivo, con el hito H5 el 23/11. En entrega de software el proyecto está a tiempo: los incrementos 1 a 4 están etiquetados (76 de 133 SP) y el INC-4 se entregó 10 días antes del hito H4. Dos condiciones del plan siguen abiertas:

- La aceptación de los incrementos (H1 a H4), que no tiene acta.
- La preparación de datos del INC-5 (limpieza y versionado), que llega al Sprint 6 sin hacerse.

El INC-5 suma 34 SP, el mayor de todos, frente a una velocidad observada de 16 a 21 SP por incremento. Por eso el plan lo reparte en los sprints 6 y 7, y la postergación al Sprint 8 que prevé el plan de riesgos de S3-4 sigue disponible si los datos no alcanzan el umbral.

Ningún retraso superó el umbral de una semana que el plan fija para replanificar un hito. Lo que la matriz muestra es otra cosa: **el avance se midió en entrega de software, no en aceptación**. Los hitos H3 y H4 exigían prueba de campo y envío real, que no se hicieron, de modo que el desvío favorable de INC-4 (−10 días) no equivale a un incremento aceptado. Tampoco hay horas reales registradas en ningún incremento (113 h estimadas solo para INC-1), de modo que la estimación no se recalibró.

3.5 EJE 5: Ejecución de Procesos Principales del Primer Incremento (PMV)

El PMV (Incremento 1, etiqueta `v1.0-PMV`, 30/09/2026) cubre cinco historias que eliminan el triple registro (B1) y entregan el primer seguimiento: registro nominal con evaluación inicial, expediente, validación clínica, listado y reporte. Se ejecutó en dos sprints (01 al 28/09/2026) con 16 tareas (T01 a T16) y 113 horas-persona estimadas; las horas reales no se registraron.

Especificación de historias de usuario del PMV

Tabla 17. Historias del Incremento 1 con su criterio de aceptación y el resultado medido en `v4.0-Inc4` (S3-4, S10 Tabla 6).

Código	Historia (Como / quiero / para)	Criterio de aceptación (Dado-Cuando-Entonces)	Resultado medido
HU-01 / RF-01	**Como** personal de salud, **quiero** registrar al niño con su evaluación inicial, **para** tener un registro nominal único	**Dado** un formulario con datos válidos, **cuando** pulsa «Guardar registro», **entonces** se confirma y se abre el expediente en menos de 2 s; con un DNI ya registrado la API responde 409	130 ms; DNI repetido: HTTP 409
HU-02 / RF-02	**Como** personal de salud, **quiero** consultar y actualizar el expediente y agregar controles, **para** mantener el historial al día	**Dado** un expediente existente, **cuando** lo consulta, edita un campo permitido y agrega un control, **entonces** los cambios persisten y el historial pasa de 2 a 3 evaluaciones	2 a 3 evaluaciones
HU-03 / RF-03	**Como** personal de salud, **quiero** ver la clasificación de la hemoglobina al digitarla, **para** no depender del cálculo manual por altitud	**Dado** un formulario clínico, **cuando** digita la Hb, **entonces** se muestran la Hb ajustada por altitud y la clasificación; con datos inválidos se rechaza con mensajes por campo (HTTP 422)	Hb 11,6 g/dL a 3 720 m: Hb ajustada 9,1 g/dL, «Anemia moderada»; Hb 25 g/dL: 422
HU-04 / RF-04	**Como** personal de salud, **quiero** listar a los niños en seguimiento con filtros, **para** priorizar la atención	**Dado** un conjunto de niños, **cuando** filtra por clasificación o busca por comunidad, **entonces** el listado respeta el filtro	27 niños; 6 con «Moderada»
HU-05 / RF-05	**Como** coordinador, **quiero** un reporte del periodo en JSON y CSV, **para** consolidar la información	**Dado** un periodo válido, **cuando** pulsa «Generar», **entonces** se muestran los indicadores y se descarga el CSV en menos de 2 s	28 registrados; CSV de 43 líneas en 86 ms

La autenticación con Supabase (ADR-011) no formaba parte del PMV: se incorporó antes del Incremento 3 y tiene su propia ficha de prueba (sección 3.6.3).

Resultado de la ejecución. El PMV se midió con el mismo método que los incrementos posteriores, lo que permite ver sus debilidades:

Tabla 18. Resultado del Incremento 1 (`v1.0-PMV`) según las métricas GQM de S9 y la adenda.

Aspecto	Valor en `v1.0-PMV`	Lectura
Pruebas	73 (unitarias, integración y arquitectura) y 4 E2E; cobertura 99 %	Verde, pero la cobertura no evitó defectos

Aspecto	Valor en `v1.0-PMV`	Lectura
Defectos funcionales (M2.2)	7 defectos en 5 RF = 1,4 por RF; la meta de la guía es ≤ 1,0	**No cumple**; 6 de los 7 no se detectaron antes de liberar (S11, H6)
Conformidad hexagonal (M1.2, criterio estricto)	40,0 % (2 de 5 componentes); 1 violación de la regla de dependencia (el adaptador HTTP importaba un caso de uso concreto)	**No cumple**; se corrigió en el hito `v1.5.0-inc2-avance` con la estructura de puertos (ADR-008)
Brechas resueltas (M3.1)	25,0 % (1,5/6)	Solo B1 completa; la meta de la guía (≥ 60 %) no se alcanzó
Latencia p95 agregada (V4, 50 usuarios)	175 ms	Cumple la meta de 800 ms

El PMV entregó el valor comprometido (registro único y clasificación probada en valores límite), pero la arquitectura nació con una dependencia invertida que solo se corrigió al iniciar el Incremento 2. Es la razón por la que la sección 3.6 mide la arquitectura en cada incremento y no solo al final.

Tabla 19. Evolución del producto por incremento (adenda S9, sección 4; S11, Tabla 5a). Las pruebas son unitarias, de integración y de arquitectura; los E2E se cuentan aparte.

Incremento	Etiqueta	Historias	Pruebas	E2E	Cobertura de `app/`
Inc. 1	`v1.0-PMV`	HU-01 a HU-05	73	4	99 %
Inc. 2	`v2.0-Inc2`	HIST-2.1 a HIST-2.4	328	15	100 %
Inc. 3	`v3.0-Inc3`	HIST-3.1 a HIST-3.4, VIS-3.5	499	24	99,70 %
Inc. 4	`v4.0-Inc4`	HIST-4.1 a HIST-4.4	660	28	99,79 %

3.6 EJE 6: Evaluación GQM, Arquitectura Hexagonal en Git y Pruebas Funcionales

3.6.1 Evaluación GQM de arquitectura, pruebas y valor

Las tres metas se formularon con la plantilla de Basili et al. [14] (objeto, propósito, enfoque de calidad, punto de vista y contexto) y se midieron para los cuatro incrementos con los scripts de `herramientas/gqm/`.


Tabla 20. Metas, preguntas y métricas GQM (S9, Tablas 8 y 12).

Meta	Pregunta	Métrica	Fórmula	Meta de la guía (Inc. 1 / Inc. 2)
G-01 Evaluar el desacoplamiento del dominio (mantenibilidad, punto de vista del arquitecto)	Q1.1 ¿Cuánto del dominio depende de frameworks?	M1.1 Contaminación del dominio	importaciones de terceros ÷ clases del dominio × 100	0 % / 0 %
	Q1.2 ¿La estructura es hexagonal?	M1.2 Conformidad hexagonal	componentes conformes ÷ 5 × 100	100 % / 100 %
	Q1.3 (complementaria) ¿Las dependencias apuntan al núcleo?	M1.3 Violaciones de la regla de dependencia	conteo por AST	propuesta: 0
G-02 Verificar la estabilidad funcional (cobertura y tasa de fallas, punto de vista de QA)	Q2.1 ¿Cada RF tiene evidencia?	M2.1 Cobertura funcional con capturas	RF con captura aprobada ÷ RF × 100	100 % / 100 %
	Q2.2 ¿Cuántos defectos hay?	M2.2 Defectos por RF	defectos ÷ RF	≤ 1,0 / ≤ 0,2
G-03 Evaluar la efectividad del proceso (valor organizacional, punto de vista del usuario y Product Owner simulado)	Q3.1 ¿Qué brechas del AS-IS se resolvieron?	M3.1 Brechas resueltas	(Σ puntajes B1 a B6 ÷ 6) × 100	≥ 60 % / ≥ 90 %
	Q3.2 ¿Mejoraron los indicadores de valor?	M3.2 Índice de impacto en valor	promedio de mejoras de V1, V2 y V3	≥ 50 % / ≥ 80 %

Tabla 21. Valores GQM por incremento (adenda S9, sección 2). «n/r»: no recalculada.

Métrica	Inc. 1 `v1.0-PMV`	Inc. 2 `v2.0-Inc2`	Inc. 3 `v3.0-Inc3`	Inc. 4 `v4.0-Inc4`
M1.1 contaminación del dominio	0,0 % (0/8 clases)	0,0 % (0/32)	0,0 % (0/55)	**0,0 % (0/86)**
M1.2 conformidad hexagonal (estricta)	40,0 %	100,0 %	100,0 %	**100,0 %**

Métrica	Inc. 1 `v1.0-PMV`	Inc. 2 `v2.0-Inc2`	Inc. 3 `v3.0-Inc3`	Inc. 4 `v4.0-Inc4`
M1.3 violaciones de dependencia	1	0	0	**0**
M2.1 cobertura funcional con capturas	100 % (5/5 RF)	100 % (4/4; 9/9 acumulado)	100 % (5/5; 14/14 acumulado)	**100 % (4/4; 18/18 acumulado)**
M2.2 defectos por RF	1,4 (7/5)	0,25 (1/4)	n/r (indicativo 0,20)	n/r (indicativo 0,75)
M3.1 brechas resueltas (principal)	25,0 %	33,3 %	50,0 %	**75,0 %**
M3.2 índice de impacto en valor (V1, V2, V3)	57,6 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
V3 F1 de controles vencidos	0,729	1,000	1,000	1,000 (476/476 controles)
V4 p95 agregado, 50 usuarios	175 ms	815 ms	n/r	**1 100 ms** (una corrida)
V5 disponibilidad durante la carga	100 % (856/856)	100 % (856/856)	n/r	100 % (64/64)

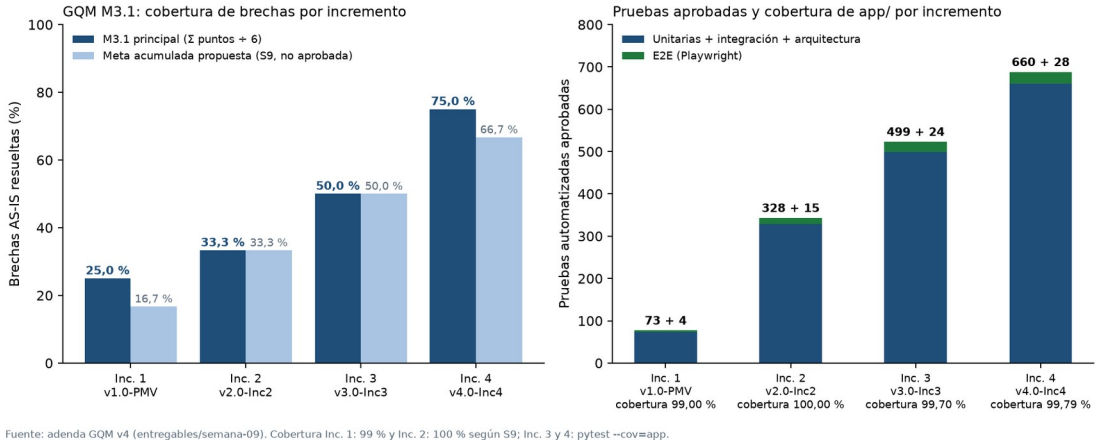

Evolución de M3.1 y de las pruebas por incremento.

Figura 8. Evolución de M3.1 frente a la meta acumulada propuesta en S9 (izquierda; no aprobada) y de las pruebas automáticas y la cobertura por incremento (derecha). Elaboración propia con `evidencias/generar_figuras.py`.

La meta acumulada propuesta en S9 (16,7 %, 33,3 %, 50,0 % y 66,7 % hasta INC-4) se alcanza en cada incremento (25,0 %, 33,3 %, 50,0 % y 75,0 %); las metas de la guía (60 % y 90 %) suponían cerrar casi todas las brechas en dos incrementos y no se alcanzaron en su momento.

Tabla 22. Puntaje de M3.1 por brecha e incremento (1 = mecanismo completo, operativo y probado; 0,5 = parcial; 0 = no; adenda S9, sección 3).

Brecha	Plan	Inc. 1	Inc. 2	Inc. 3	Inc. 4	Evidencia en `v4.0-Inc4`
B1 Triple registro	INC-1	1,0	1,0	1,0	1,0	Una escritura por evaluación
B2 Agenda sin	INC-2	0,0	0,5	0,5	**1,0**	Recordatorios con puerto

Brecha	Plan	Inc. 1	Inc. 2	Inc. 3	Inc. 4	Evidencia en `v4.0-Inc4`
recordatorios						`Notificador`; solo el modo simulado y `httpx.MockTransport` están probados
B3 Barreras ocultas	INC-4	0,0	0,0	0,0	**1,0**	8 tipos de barrera, `REGLAS_BARRERAS_V1`, vigencia de 90 días; reglas sin validar
B4 Visita en papel	INC-3	0,0	0,0	**1,0**	1,0	`VISITA-V1/V2`, captura sin conexión; pesos sin validar
B5 Riesgo tardío	INC-5	0,0	0,0	0,0	0,0	Sin modelo ni regla de riesgo (INC-5 no implementado)
B6 Conectividad	INC-3 e INC-6	0,5	0,5	0,5	0,5	Sincronización idempotente; sin dispositivo real ni INC-6
Σ puntos		**1,5**	**2,0**	**3,0**	**4,5**	**75,0 %**

Sensibilidades. M3.1 depende de cómo se puntúe lo no probado en el mundo real: si B2, B3 y B4 se puntuaran 0,5 por exigir un envío real y un dispositivo real, M3.1 bajaría a **50,0 %**; si B6 puntuara 0, a 66,7 %; la lectura estricta (solo puntaje 1,0) es 66,7 % (4 de 6). El valor de 75,0 % es la lectura principal de la guía y se informa junto a estas variaciones.

Lo que GQM no pudo medir. M2.1 de Inc. 3 e Inc. 4 se calculó con las fichas del apartado 3.6.3: 100 %, 18 de 18 requisitos con captura aprobada. M2.2 de esos incrementos sigue siendo indicativa (0,20 y 0,75 defectos por requisito): no hay registro de defectos posterior a DEF-09 y los cinco defectos de la revisión independiente (tres de ellos de concurrencia o seguridad) se corrigieron sin registrarse como DEF (ficha GQM de M2.2). El p95 de 1 100 ms (una sola corrida, sin control de la versión anterior) supera la meta de 800 ms y es el principal riesgo de rendimiento.

Fichas de evaluación GQM con evidencia por métrica

Cada métrica de la Tabla 20 tiene una ficha con el mismo formato que las fichas de prueba funcional. La ficha da la meta y la pregunta, la fórmula con los datos y el resultado, y dos evidencias:

- **Captura 1:** el software en uso, de cara al dominio: el registro de un niño, la agenda, las alertas, las visitas o la sincronización. Cuando existe, se usa la captura del entorno de producción (`softwareanemia.onrender.com`).
- **Captura 2:** la ejecución reproducible de la medición, con el comando, la fecha y el resultado.

La Tabla 23 resume la trazabilidad entre cada métrica y su evidencia.

Tabla 23. Trazabilidad de cada métrica GQM con su evidencia (valores de `v4.0-Inc4`).

Meta	Métrica	Valor Inc. 4	Meta / criterio	Evidencia en el software (dominio)	Evidencia de la medición
G-01	M1.1 Contaminación del dominio	0,0 % (0/86)	0 %	Figura 9	Figura 10


Meta	Métrica	Valor Inc. 4	Meta / criterio	Evidencia en el software (dominio)	Evidencia de la medición
G-01	M1.2 Conformidad hexagonal	100 % (5/5)	100 %	Figura 11	Figura 12
G-01	M1.3 Violaciones de dependencia	0	0	Figura 13	Figura 14
G-02	M2.1 Cobertura funcional con capturas	100 % (18/18)	100 %	Tabla 24 y fichas 3.6.3	Figura 15
G-02	M2.2 Defectos por requisito	0,75 (indicativo)	≤ 0,2 (Inc. 2)	Figura 16	Figura 17
G-03	M3.1 Brechas AS-IS resueltas	75,0 % (4,5/6)	≥ 66,7 % (meta acumulada S9)	Figuras 18 a 25	Figura 26
G-03	M3.2 Índice de impacto en valor (V1, V2, V3)	100 %	≥ 80 %	Figuras 27 a 29	Figura 30
G-03	V4 Rendimiento p95 (50 usuarios)	1 100 ms	< 800 ms	Figura 31	Figura 33
G-03	V5 Disponibilidad durante la carga	100 % (64/64)	≥ 99,5 %	Figura 32	Figura 34

FICHA DE EVALUACIÓN GQM Y EVIDENCIA VISUAL POR MÉTRICA (M1.1)

- **META:** G-01 Evaluar el desacoplamiento del dominio (mantenibilidad, punto de vista del arquitecto).
- **PREGUNTA:** Q1.1 ¿Cuánto del dominio depende de frameworks?
- **MÉTRICA Y FÓRMULA:** M1.1 Contaminación del dominio = importaciones de terceros en el dominio ÷ clases del dominio × 100.
- **DATOS Y CÁLCULO:** 86 clases en `app/domain`, 130 importaciones (63 de la biblioteca estándar, 67 internas, **0 externas**). M1.1 = 0 ÷ 86 × 100 = **0,0 %**.
- **META DE LA GUÍA:** 0 %.

[CAPTURA 1: EVIDENCIA EN EL DOMINIO]

- **Descripción: Figura 9.** Código del modelo de dominio (`app/domain/model/entidades.py`): las entidades del niño y de la evaluación solo importan la biblioteca estándar y otros módulos del dominio, sin FastAPI, SQLAlchemy ni Pydantic.

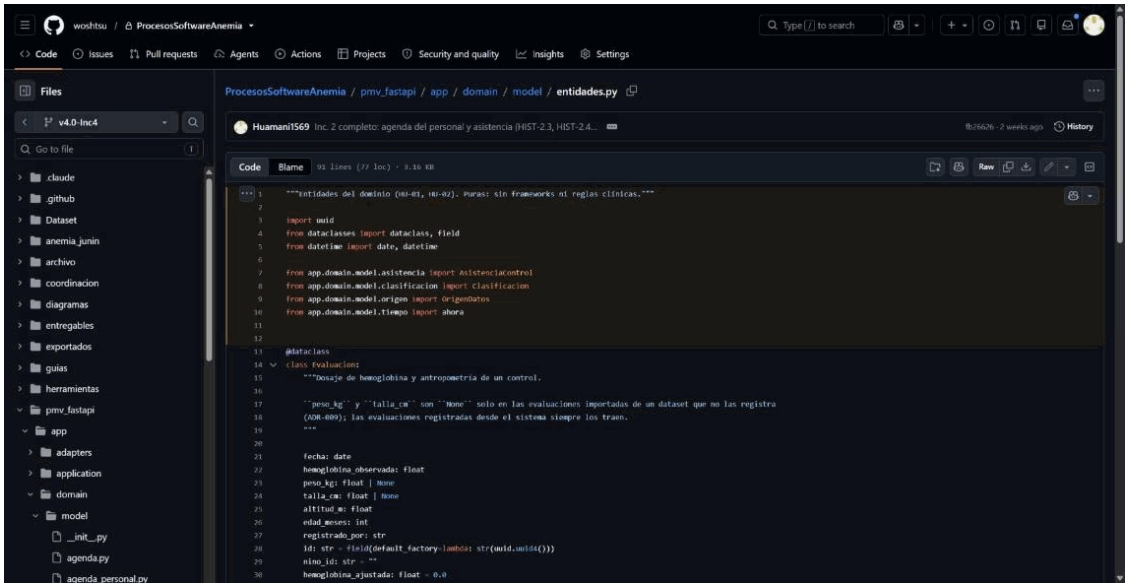

Código del dominio sin importaciones de frameworks.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-10/evidencias/github/GH_dominio_entidades_imports.png`

[CAPTURA 2: EJECUCIÓN DE LA MEDICIÓN]

- **Descripción: Figura 10.** Ejecución de `m11_contaminacion.py` del 06/11/2026 sobre el código actual: 0 importaciones externas en las 86 clases del dominio. El rótulo «v2.0» es la clave interna del script y apunta a `pmv_fastapi/` actual.

```
M1.1 Contaminación del dominio (G-01, Q1.1)

=== v2.0.0-inc2 (Inc. 2, cierre)  (raíz: pmv_fastapi)
capa                clases  imports  stdlib  interno  externo  índice %
dominio                 86      130      63       67        0      0.00
puertos_entrada         20       31      19       12        0      0.00
puertos_salida           8       21      13        8        0      0.00
aplicacion              12      125      14      111        0      0.00

M1.1 (v2.0) = 0 / 86 x 100 = 0.0 %
Importaciones externas en dominio: ninguna

$ python m11_contaminacion.py --version v2.0 --json <salida>
cwd: herramientas/gqm  |  fecha: 2026-11-06 12:20  |  código de app/: idéntico a la etiqueta v4.0-Inc4  |  «v2.0» es la clave interna del script; apunta a pmv_fastapi/ actual
```

Ejecución de M1.1.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-12/correcciones/img/G01_m11_contaminacion.png`

EVALUACIÓN: CUMPLE | FECHA: 06/11/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

FICHA DE EVALUACIÓN GQM Y EVIDENCIA VISUAL POR MÉTRICA (M1.2)

- **META:** G-01. **PREGUNTA:** Q1.2 ¿La estructura es hexagonal?
- **MÉTRICA Y FÓRMULA:** M1.2 Conformidad hexagonal = componentes conformes ÷ 5 × 100. Los 5 componentes son: núcleo de dominio, puertos de entrada, puertos de salida, adaptadores de entrada y adaptadores de salida.
- **DATOS Y CÁLCULO:** los 5 componentes son conformes: tienen paquete propio y cumplen la dirección de las dependencias. M1.2 = 5 ÷ 5 × 100 = **100 %**.
- **Sensibilidad:** la lectura ultra estricta da 80 %, porque `ServicioSesion` implementa el puerto `ProveedorIdentidad` dentro de la capa de aplicación.
- **META DE LA GUÍA:** 100 %.

[CAPTURA 1: EVIDENCIA EN EL DOMINIO]

- **Descripción: Figura 11.** Matriz de importaciones entre capas del análisis AST: ninguna celda roja. El dominio no importa ninguna otra capa y cada adaptador solo depende de su puerto.

Matriz de importaciones por capa (analisis AST de import)

Capa (origen)	Archivos	LOC	stdlib	tercero	domain.model	domain.service	ports.inbound	ports.outbound	application	adapters.inbound	adapters.outbound
domain.model	17	699	40	0	17	0	0	0	0	0	0
domain.service	12	1593	23	0	47	3	0	0	0	0	0
ports.inbound	15	156	19	0	12	0	0	0	0	0	0
ports.outbound	9	143	13	0	8	0	0	0	0	0	0
application	13	1227	14	0	32	31	19	29	0	0	0
adapters.inbound	5	1437	7	8	12	0	13	0	0	1	0
adapters.outbound	12	1359	14	7	24	0	0	15	0	0	4

Verde: dependencia permitida por la regla. Rojo: violacion. Cero celdas rojas: la regla de dependencias se cumple.

Generado con metricas/auditoria_hexagonal.py y metricas/graficos.py | fecha: 2026-10-30 20:19:52 | commit: ada827f

Matriz de importaciones por capa.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-10/evidencias/arquitectura/S_matriz_importaciones.png`

[CAPTURA 2: EJECUCIÓN DE LA MEDICIÓN]

- **Descripción: Figura 12.** Ejecución de `m12_conformidad.py` del 06/11/2026: los 5 componentes son CONFORMES (M1.2 = 100 %), con la observación de la lectura ultra estricta.

M1.2 Conformidad hexagonal (G-01, Q1.2)

```
=== v2.0.0-inc2 (Inc. 2, cierre)
- Núcleo de dominio        app/domain/model, app/domain/service a=SI  b=SI  -> CONFORME
    a) app/domain/model/: paquete propio; app/domain/service/: paquete propio
    b) 0 importaciones externas; 0 importaciones de otras capas.
- Puertos de entrada       app/ports/inbound                 a=SI  b=SI  -> CONFORME
    a) app/ports/inbound/: paquete propio
    b) 20 interfaces; violaciones de pureza: 0; importaciones de infraestructura/otras capas: 0.
- Puertos de salida        app/ports/outbound                a=SI  b=SI  -> CONFORME
    a) app/ports/outbound/: paquete propio
    b) 8 interfaces; violaciones de pureza: 0; importaciones de infraestructura/otras capas: 0.
- Adaptadores de entrada   app/adapters/inbound              a=SI  b=SI  -> CONFORME
    a) app/adapters/inbound/: paquete propio
    b) Importa 13 puerto(s) de entrada; importa 0 módulo(s) de aplicación (clases concretas); 0 de adaptadores de salida.
- Adaptadores de salida    app/adapters/outbound             a=SI  b=SI  -> CONFORME
    a) app/adapters/outbound/: paquete propio
    b) 2 clase(s) implementan RepositorioNinos; 3 importaciones de SQLAlchemy; 0 importaciones de aplicación/adaptadores de entrada.
M1.2 = 5/5 x 100 = 100.0 %   sensibilidad: {'laxa_pct': 100.0, 'estricta_pct': 100.0, 'ultra_estricta_pct': 80.0}
  observación: Implementación de un puerto de salida fuera de adaptadores de salida: app/application/servicio_sesion.py:8 ServicioSesion implementa el puerto ProveedorIdentidad
```

```
$ python m12_conformidad.py --version v2.0 --json <salida>
cwd: herramientas/gqm  |  fecha: 2026-11-06 12:20  |  código de app/: idéntico a la etiqueta v4.0-Inc4  |  extracto: se omiten las líneas de detalle por archivo
```

Ejecución de M1.2.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-12/correcciones/img/G02_m12_conformidad.png`


EVALUACIÓN: CUMPLE (lectura estricta; 80 % en la ultra estricta) | FECHA: 06/11/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

FICHA DE EVALUACIÓN GQM Y EVIDENCIA VISUAL POR MÉTRICA (M1.3)

- **META:** G-01. **PREGUNTA:** Q1.3 ¿Las dependencias apuntan al núcleo?
- **MÉTRICA Y FÓRMULA:** M1.3 Violaciones de la regla de dependencia, contadas por AST como aristas que salen del dominio hacia otras capas.
- **DATOS Y CÁLCULO:** inestabilidad del dominio I = Ce ÷ (Ce + Ca) = 0 ÷ (0 + 41) = **0,00**. Aristas hacia fuera del dominio: **0**.
- **CRITERIO:** 0 violaciones.

[CAPTURA 1: EVIDENCIA EN EL DOMINIO]

- **Descripción: Figura 13.** Pruebas de arquitectura (`tests/arquitectura/test_dependencias.py`) que hacen cumplir la regla en cada ejecución del CI: si el dominio importara un framework o un adaptador, la prueba fallaría.

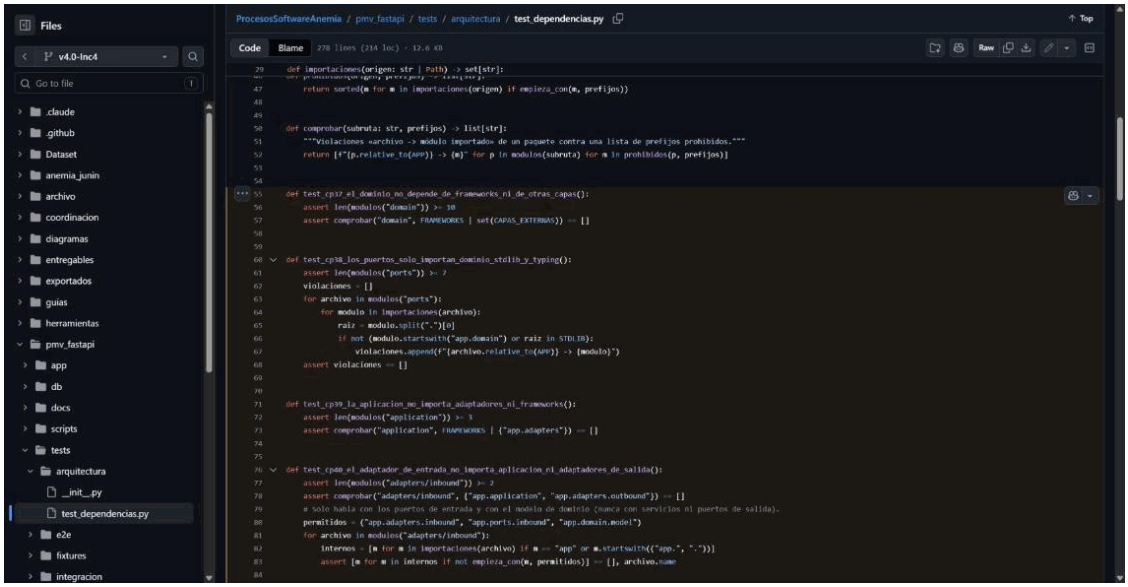

Pruebas de arquitectura que vigilan la regla de dependencia.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-10/evidencias/github/GH_pruebas_arquitectura.png`

[CAPTURA 2: EJECUCIÓN DE LA MEDICIÓN]

- **Descripción: Figura 14.** Ejecución de `m13_acoplamiento.py` del 06/11/2026: el núcleo de dominio tiene Ce = 0 e I = 0,00, y hay 0 violaciones de la regla de dependencia.



Ejecución de M1.3.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-12/correcciones/img/G03_m13_acoplamiento.png`

EVALUACIÓN: CUMPLE | FECHA: 06/11/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

FICHA DE EVALUACIÓN GQM Y EVIDENCIA VISUAL POR MÉTRICA (M2.1)


- **META:** G-02 Verificar la estabilidad funcional (punto de vista de QA).
- **PREGUNTA:** Q2.1 ¿Cada requisito tiene evidencia?
- **MÉTRICA Y FÓRMULA:** M2.1 Cobertura funcional con capturas = requisitos con captura aprobada ÷ requisitos × 100.
- **DATOS Y CÁLCULO:**
  - Inc. 1: 5/5. Inc. 2: 4/4. Inc. 3: 5/5. Inc. 4: 4/4.
  - Acumulado: 18 ÷ 18 × 100 = **100 %**. La ficha AUTH es adicional y no cuenta como requisito del plan.
- **META DE LA GUÍA:** 100 %.

Tabla 24. Requisitos de cada incremento y ficha del apartado 3.6.3 que los evidencia.

Incremento	Requisitos	Fichas con captura de entrada y de resultado	Resultado
Inc. 1 (PMV)	RF-01 a RF-05	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04 y RF-05	5/5
Inc. 2	RF-06 a RF-09	RF-06, RF-07, RF-08 y RF-09	4/4
Inc. 3	HIST-3.1 a HIST-3.4, VIS-3.5	HIST-3.1 (y 3.1b), HIST-3.2, HIST-3.3, HIST-3.4 y VIS-3.5	5/5
Inc. 4	HIST-4.1 a HIST-4.4	HIST-4.1, HIST-4.2, HIST-4.3 y HIST-4.4	4/4
Total	**18**	19 fichas de requisitos y 1 de autenticación	**18/18**

[CAPTURA: EJECUCIÓN QUE RESPALDA LAS FICHAS]

- **Descripción: Figura 15.** Las 28 pruebas E2E en el navegador (Playwright), ejecutadas el 06/11/2026: 28 aprobadas. Automatizan los escenarios de las fichas de los cuatro incrementos (CP-297 a CP-303 de Inc. 3, recordatorios y barreras de Inc. 4, agenda y alertas de Inc. 2).
  - En una primera corrida, CP-110 (agenda) excedió el tiempo de espera. Pasó 3 de 3 veces aislada y en la corrida completa de la figura. Es la inestabilidad ya registrada en H6.

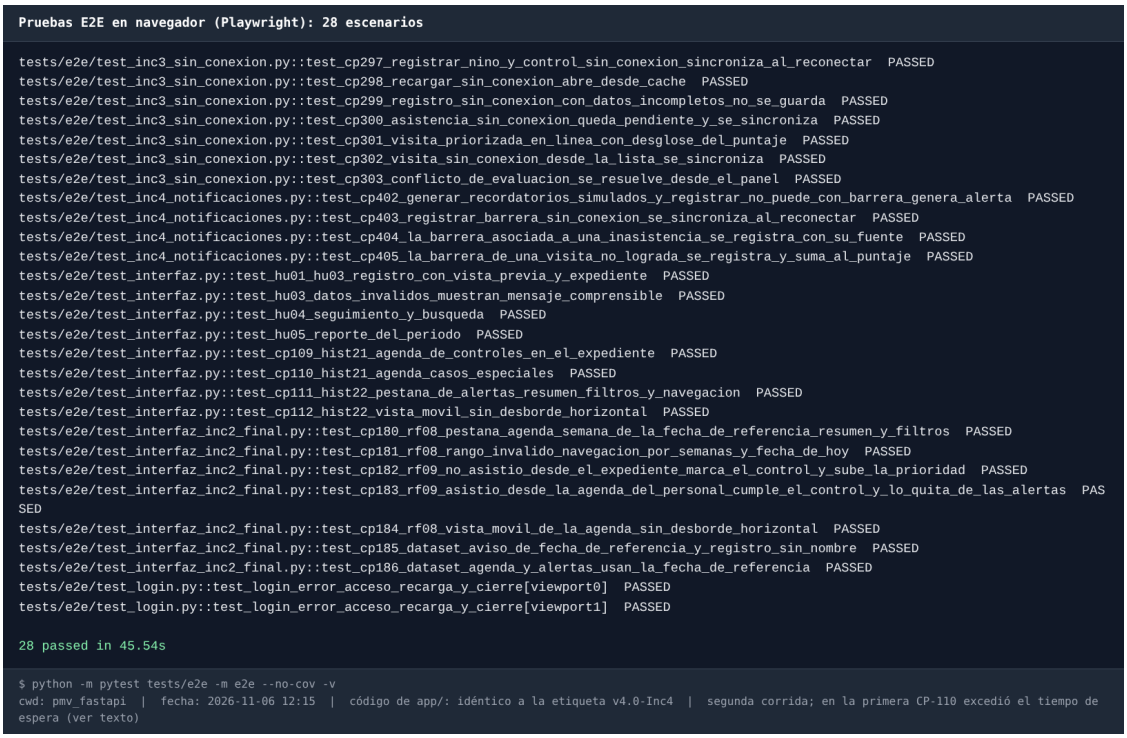

Ejecución de las pruebas E2E.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-12/correcciones/img/T02_e2e_playwright.png`


EVALUACIÓN: CUMPLE | FECHA: 06/11/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

FICHA DE EVALUACIÓN GQM Y EVIDENCIA VISUAL POR MÉTRICA (M2.2)

- **META:** G-02. **PREGUNTA:** Q2.2 ¿Cuántos defectos hay?
- **MÉTRICA Y FÓRMULA:** M2.2 Defectos por requisito = defectos funcionales ÷ requisitos del incremento.
- **DATOS Y CÁLCULO:**
  - Inc. 1: 7 ÷ 5 = 1,40. Inc. 2: 1 ÷ 4 = 0,25 (S9).
  - Inc. 3 y 4, contando los hallazgos de la revisión independiente: Inc. 3, 1 ÷ 5 = **0,20** (duplicado por concurrencia en la sincronización). Inc. 4, 3 ÷ 4 = **0,75** (webhook sin firma, recordatorio duplicado por concurrencia y detalle de barrera demasiado largo).
- **META DE LA GUÍA:** ≤ 1,0 (Inc. 1) y ≤ 0,2 (Inc. 2).
- **Lectura:** Inc. 3 está dentro de la última meta de la guía (≤ 0,2) e Inc. 4 la supera.

[CAPTURA 1: EVIDENCIA EN EL DOMINIO]

- **Descripción: Figura 16.** Defectos por requisito e incremento (DEF-01 a DEF-09 de los incrementos 1 y 2), según su tipo y momento de detección. Fuente: registro de defectos `pmv_fastapi/docs/evidencias/registro_defectos*.md`.

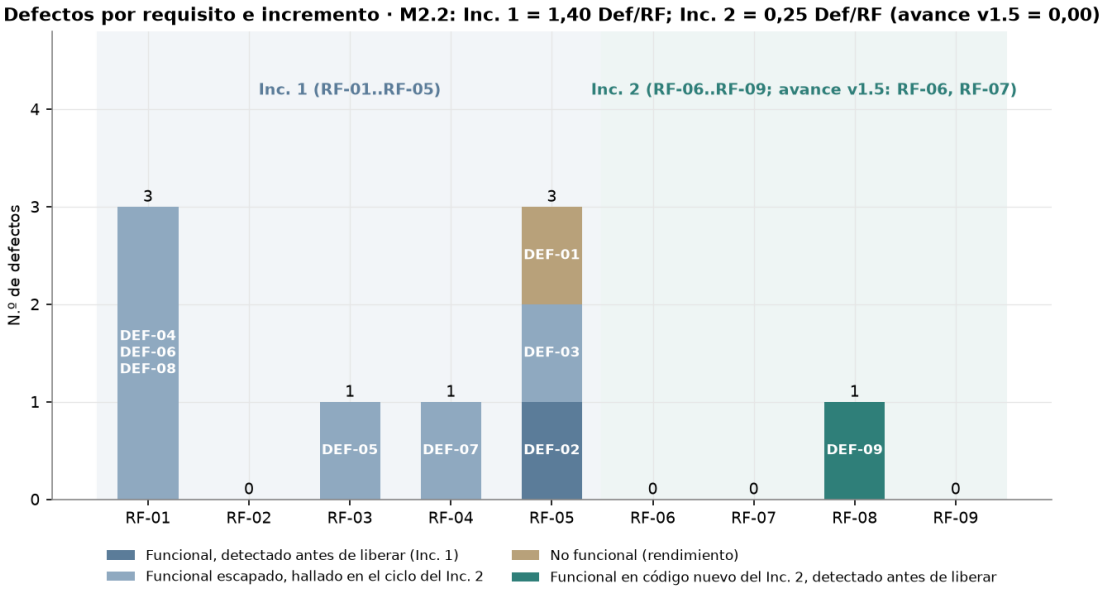


Defectos por requisito.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-09/metricas/graficos/g6_defectos.png`

[CAPTURA 2: EJECUCIÓN DE LA MEDICIÓN]

- **Descripción: Figura 17.** Pruebas de regresión de los defectos de Inc. 3 e Inc. 4 hallados en la revisión independiente, todas aprobadas: CP-357 (webhook falla cerrado), CP-264b (sincronización concurrente), CP-382b (recordatorios concurrentes), CP-391b, CP-396 y CP-405.

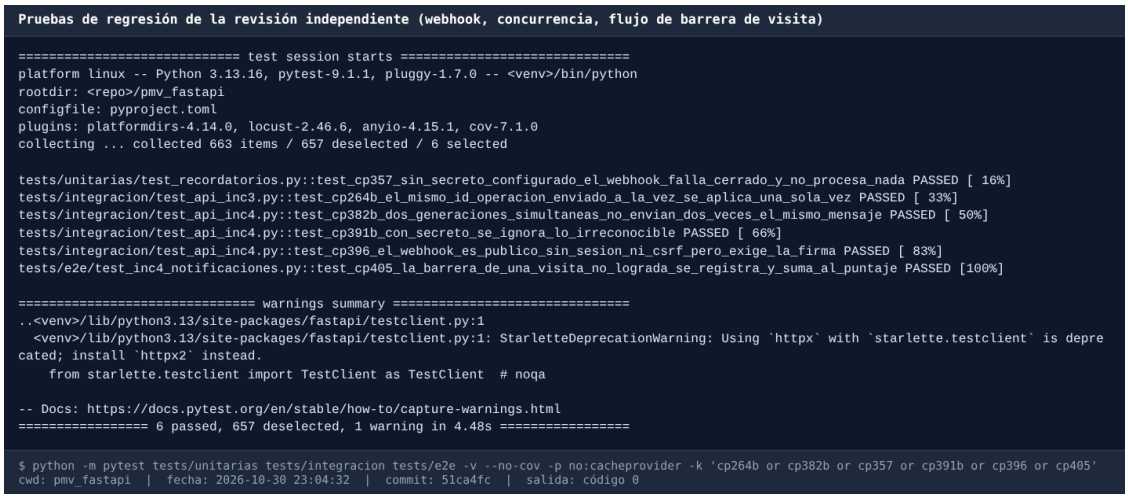

Regresión de los defectos de Inc. 3 e Inc. 4.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-11/evidencias/CMMI04_regresion_revision_independiente.png`

EVALUACIÓN: CUMPLE EN INC. 3; NO CUMPLE EN INC. 4 (0,75 frente a la última meta de la guía, ≤ 0,2); VALOR INDICATIVO | FECHA: 06/11/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE EVALUACIÓN GQM Y EVIDENCIA VISUAL POR MÉTRICA (M3.1)

- **META:** G-03 Evaluar la efectividad del proceso (valor organizacional, punto de vista del usuario).
- **PREGUNTA:** Q3.1 ¿Qué brechas del AS-IS se resolvieron?
- **MÉTRICA Y FÓRMULA:** M3.1 = (Σ puntajes B1 a B6 ÷ 6) × 100. Puntaje: 1 = mecanismo completo, operativo y probado; 0,5 = parcial; 0 = no.
- **DATOS Y CÁLCULO:** B1 1,0 + B2 1,0 + B3 1,0 + B4 1,0 + B5 0,0 + B6 0,5 = 4,5. M3.1 = 4,5 ÷ 6 × 100 = **75,0 %**.
- **META:** meta acumulada propuesta en S9 para INC-4: 66,7 %.

EVIDENCIA EN EL SOFTWARE POR BRECHA (CAPTURAS DE DOMINIO)


[B1 Triple registro manual → registro único (puntaje 1,0)]

- **Descripción: Figura 18.** Producción: formulario «Registrar niño y evaluación inicial» con la validación clínica en vista previa antes de guardar (Hb ajustada por altitud y clasificación). Una sola digitación alimenta el expediente, el seguimiento y el reporte.

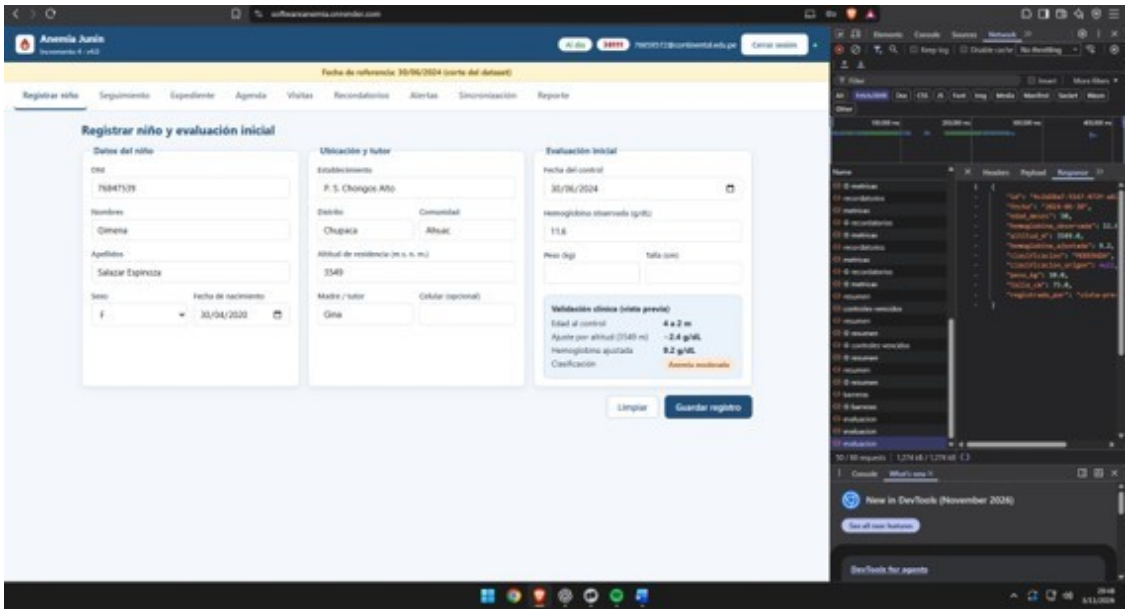

B1: registro único en producción.

- **Descripción: Figura 19.** Producción: «Niños en seguimiento» con los registros del dataset DIRESA anonimizado. Es la misma información, sin volver a digitarla.

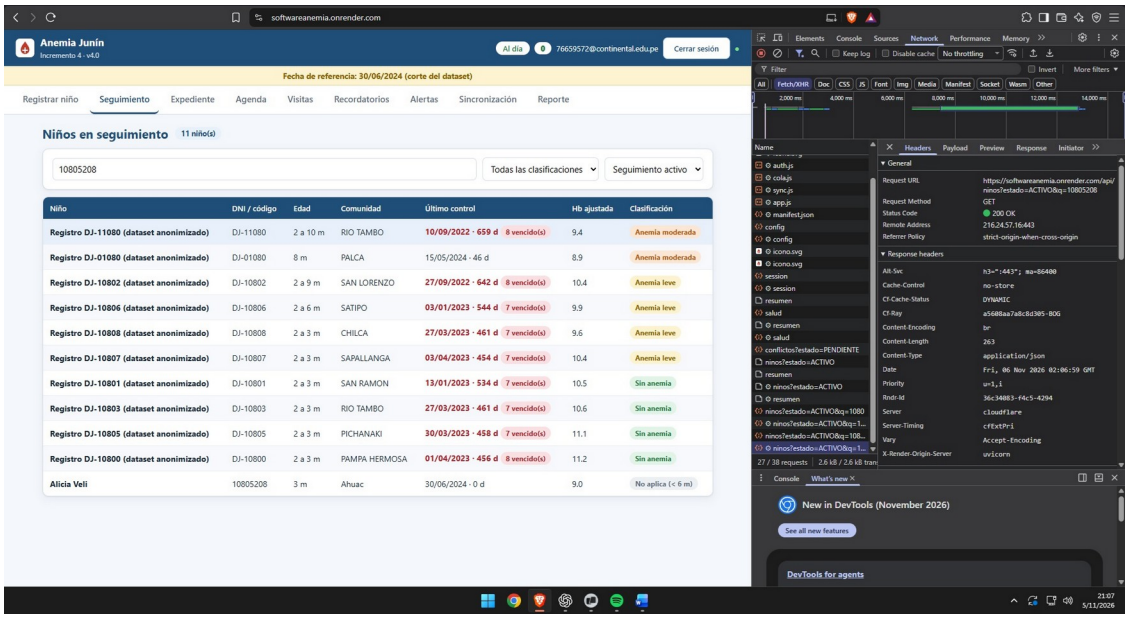


B1: seguimiento en producción.

- **Archivos de imagen:** `entregables/semana-12/evidencias/produccion/ROD_01_inc1_registro_clasificacion1.jpg`, `PROD_03_inc3_sincronizacion_seguimiento.jpg`


[B2 Agenda sin recordatorios → agenda normativa y recordatorios (puntaje 1,0)]

- **Descripción: Figura 20.** Producción: agenda del personal con los controles programados por la norma para cada niño.

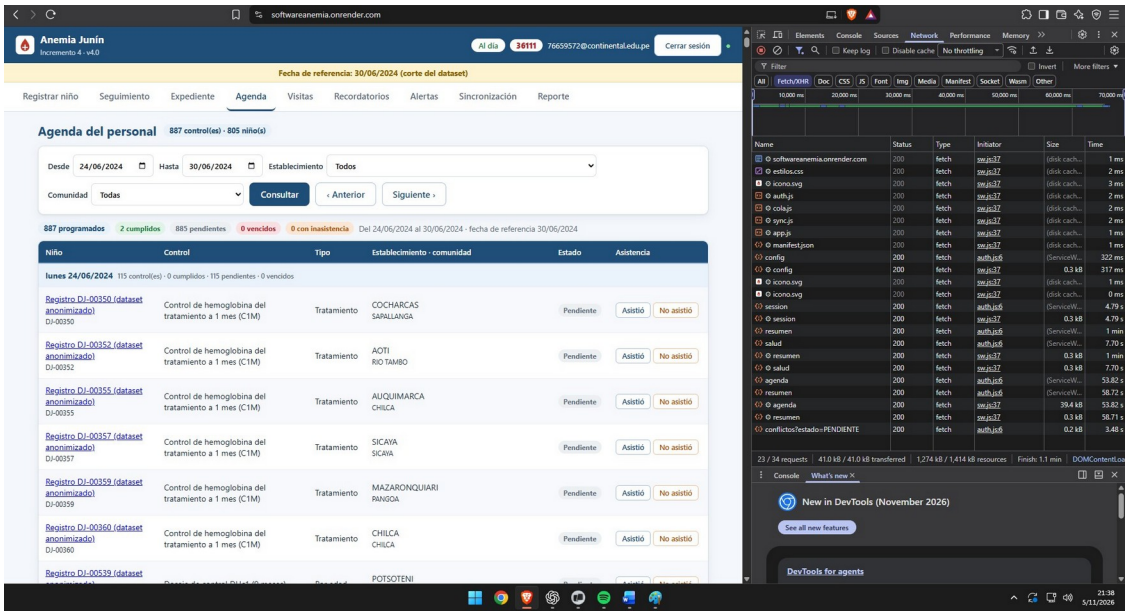

B2: agenda del personal en producción.

- **Descripción: Figura 21.** Recordatorios generados para los controles próximos, con estado SIMULADO: no sale ningún mensaje real hasta que Meta apruebe la plantilla de WhatsApp.

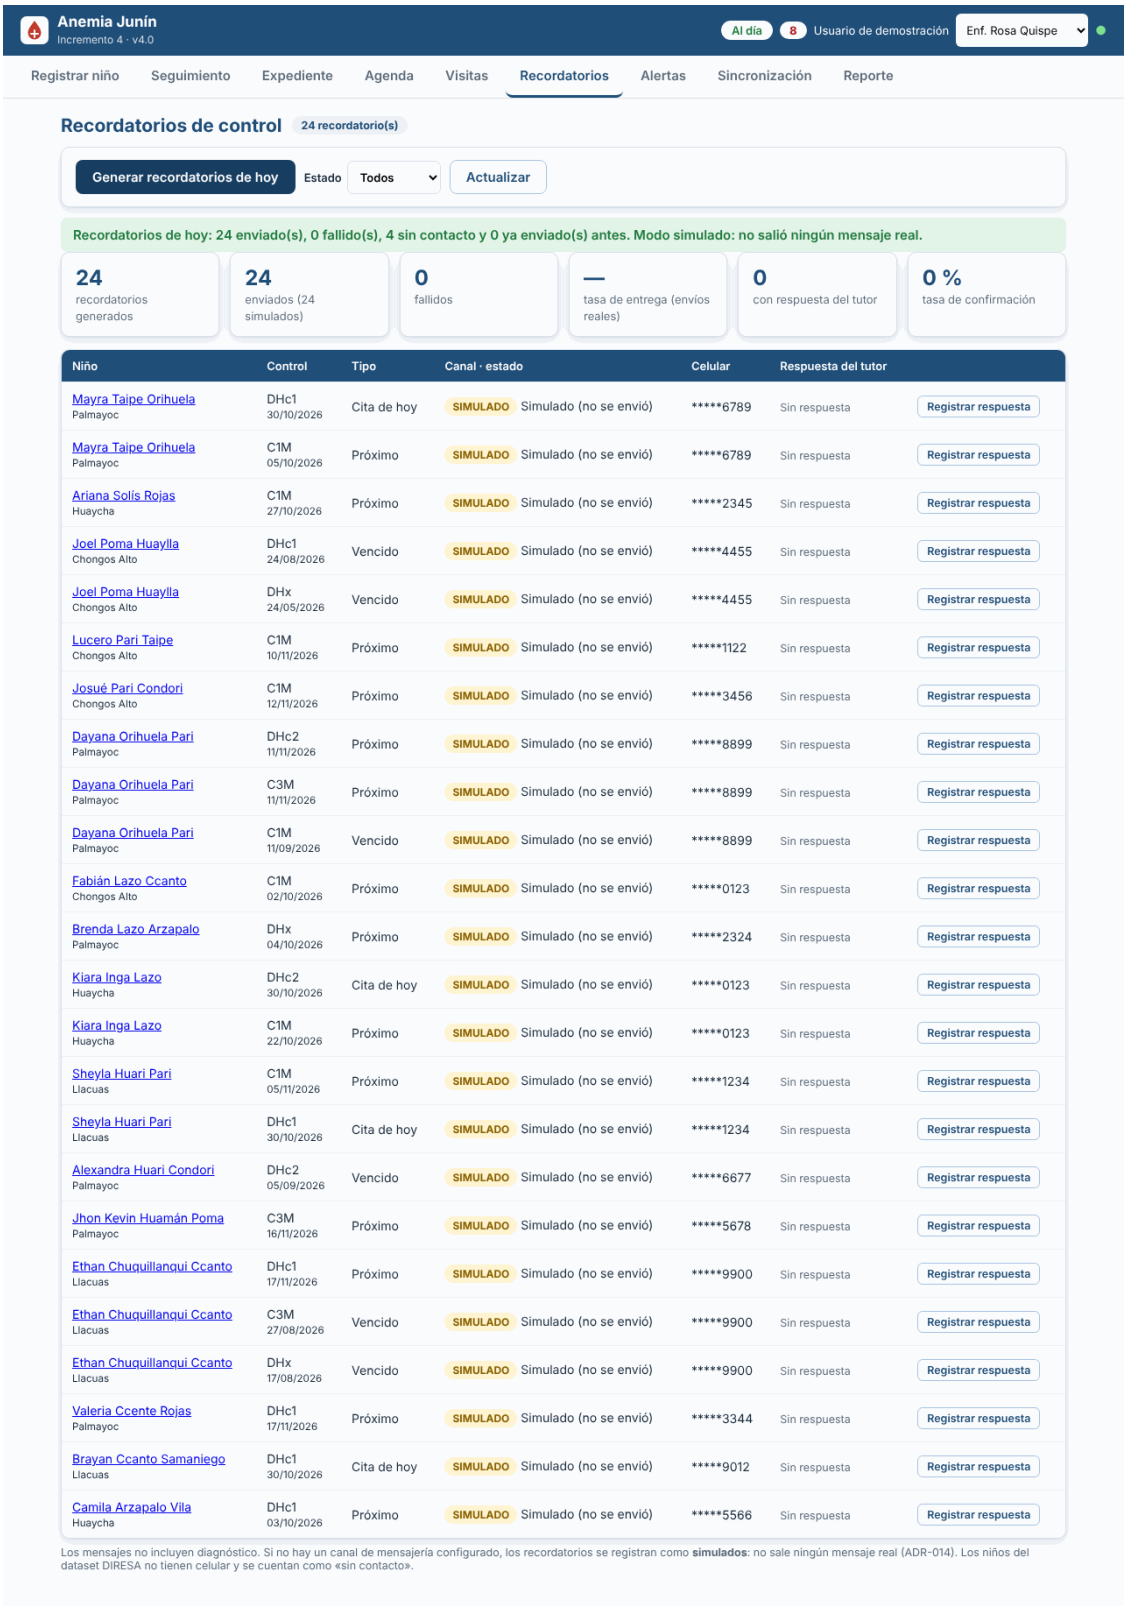


B2: recordatorios simulados.

- **Archivos de imagen:** `entregables/semana-12/evidencias/produccion/PROD_02_inc2_agendas.jpg`, `entregables/semana-10/evidencias/software/HIST41_inc4_2_recordatorios_simulados_escritorio.png`

[B3 Barreras ocultas → registro de barreras y alerta crítica (puntaje 1,0)]

- **Descripción: Figura 22.** Alertas: la tabla «Barreras críticas» muestra a los niños cuyas barreras de acceso ponen en riesgo su tratamiento, según REGLAS_BARRERAS_V1.

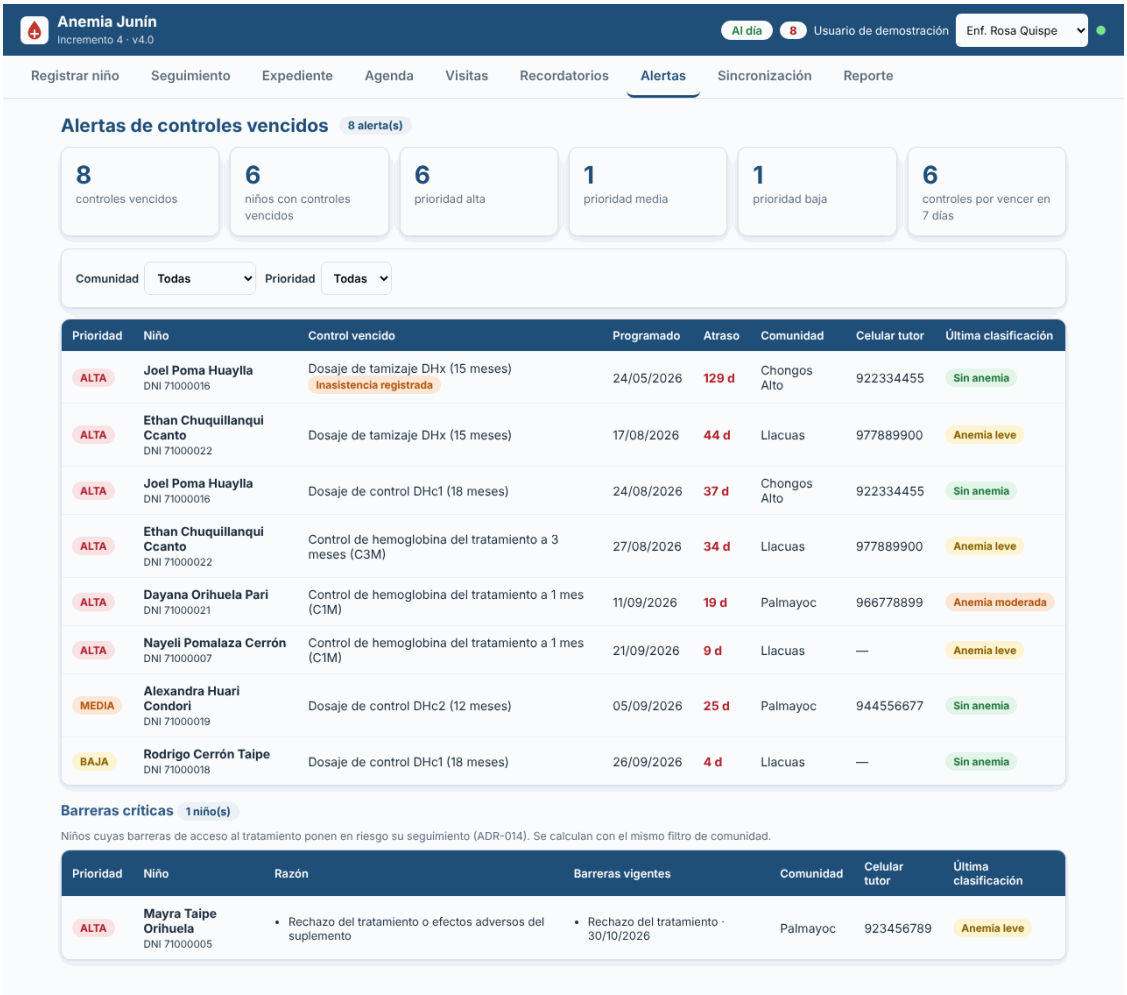


B3: barreras críticas.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-10/evidencias/software/HIST44_inc4_1_alertas_barreras_criticas_escritorio.png`

[B4 Visita domiciliaria en papel → visitas priorizadas (puntaje 1,0)]

- **Descripción: Figura 23.** Producción: «Visitas domiciliarias priorizadas» con puntaje explicable. Los niños con anemia severa y el control más vencido aparecen primero. A la derecha, la solicitud a la API de producción responde 200 OK.

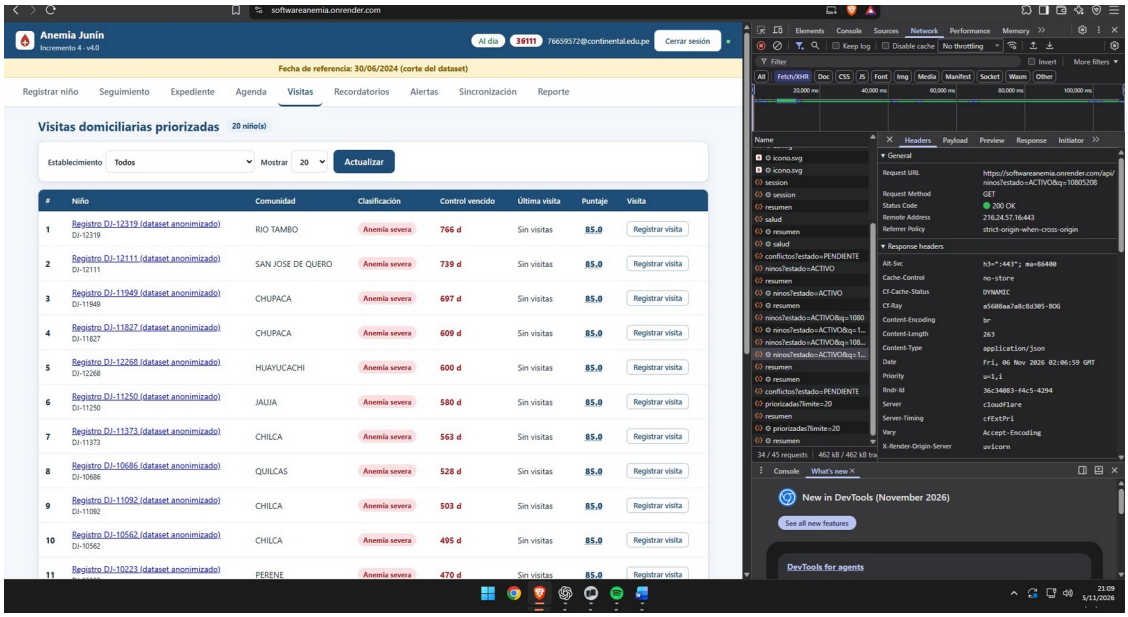

B4: visitas priorizadas en producción.


- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-12/evidencias/produccion/PROD_03_inc3_sincronizacion_visitas.jpg`

[B5 Riesgo identificado tarde (puntaje 0,0)]

- Sin evidencia en el software, porque no se implementó: el modelo de riesgo de abandono es del INC-5. La visita priorizada usa controles ya vencidos y es reactiva. Se informa como brecha abierta.

[B6 Conectividad intermitente → registro sin conexión y sincronización (puntaje 0,5)]

- **Descripción: Figura 24.** Producción, en un celular: sin conexión a internet, el registro de un niño queda «Pendiente de sincronizar» y guardado en el dispositivo.

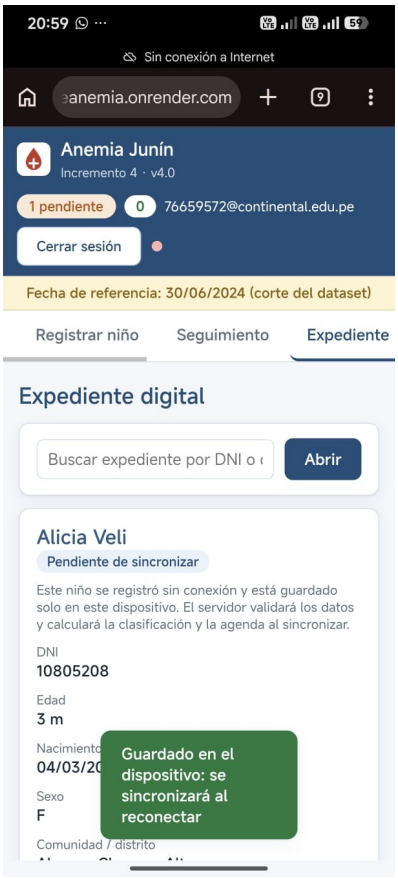

B6: registro sin conexión en el celular.

- **Descripción: Figura 25.** Producción, en el mismo celular: al volver la conexión, «De nuevo en línea», el indicador pasa a «Al día» y aparece «Sincronización: 1 aplicado(s)».



B6: sincronización al reconectar.

- **Archivos de imagen:** `entregables/semana-12/evidencias/produccion/PROD_03_inc3_sincronizacion_celular1.jpg`, `PROD_03_inc3_sincronizacion_celular3.jpg`
- **Por qué el puntaje es 0,5:** falta el INC-6 y no hubo prueba en una posta con red intermitente real.

[CAPTURA: EJECUCIÓN DE LA MEDICIÓN]

- **Descripción: Figura 26.** Ejecución de `m31_brechas_v4.py` del 06/11/2026 y el detalle de su archivo de salida.
  - Puntaje por brecha y M3.1 = 75,0 %.
  - Rutas de la API presentes para B2, B3, B4 y B6.
  - Archivos de la cola sin conexión.
  - «abandono»: 0 ocurrencias, que explica B5 = 0.

```
M3.1 Brechas AS-IS resueltas (G-03, Q3.1)

v4.0 {'suma': 4.5, 'de_6': 6, 'pct': 75.0} {'brechas': ['B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B6'], 'puntos': 4.5, 'pct': 90.0} {'brechas_con_1': 4, 'pct': 66.7} {'B6_igual_0': 66.7, 'B2_a_0_5_si_se_exige_envio_real_probado': 66.7, 'B5_a_0_5_si_la_visita_priorizada_cuenta_como_busqueda_activa': 83.3}

# Detalle guardado en entregables/semana-09/metricas/salidas/m31_brechas_v4.json (clave "v4.0"):
codigo_evaluado: pmv_fastapi en el commit e6886e2 (4.0.0-inc4)
puntos por brecha: {"B1": 1.0, "B2": 1.0, "B3": 1.0, "B4": 1.0, "B5": 0.0, "B6": 0.5}

B2 rutas presentes: POST /recordatorios/generar -> True, GET /recordatorios -> True, POST /recordatorios/{recordatorio_id}/respuesta -> True, POST /notificaciones/whatsapp/webhook -> True
B3 rutas presentes: POST /ninos/{nino_id}/barreras -> True, GET /ninos/{nino_id}/barreras -> True, GET /alertas/barreras -> True
B4 rutas presentes: POST /ninos/{nino_id}/visitas -> True, GET /ninos/{nino_id}/visitas -> True, GET /visitas/priorizadas -> True
B6 rutas presentes: POST /sincronizacion -> True, GET /sincronizacion/conflictos -> True, POST /sincronizacion/conflictos/{conflicto_id}/resolver -> True
archivos sin conexión: {"cola.js": true, "sync.js": true}
ocurrencias en app/: {"recordatorio": 216, "barrera": 302, "riesgo": 2, "abandono": 0, "sms": 22, "whatsapp": 63, "push": 4}
M3.1 principal = 4.5 / 6 x 100 = 75.0 %

$ python m31_brechas_v4.py --version v4.0
cwd: herramientas/gqm  |  fecha: 2026-11-06 12:24  |  código de app/: idéntico a la etiqueta v4.0-Inc4  |  la primera línea es la salida del script; el resto, su archivo JSON
```

Ejecución de M3.1.

- **Archivo de imagen:**
  `entregables/semana-12/correcciones/img/G04_m31_brechas.png`


EVALUACIÓN: CUMPLE (75,0 % ≥ 66,7 %; 50,0 % si se exigiera envío real y dispositivo real) | FECHA: 06/11/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

FICHA DE EVALUACIÓN GQM Y EVIDENCIA VISUAL POR MÉTRICA (M3.2)

- **META:** G-03. **PREGUNTA:** Q3.2 ¿Mejoraron los indicadores de valor para el usuario?
- **MÉTRICA Y FÓRMULA:** M3.2 = promedio de las mejoras de V1, V2 y V3 frente a la línea base AS-IS.
  - V1: escrituras manuales por evaluación.
  - V2: % de niños activos con agenda generada.
  - V3: F1 de la detección de controles vencidos frente a un oráculo independiente.
- **DATOS Y CÁLCULO** (muestra B150, 140 niños activos):
  - V1 = **1 escritura** por evaluación; el AS-IS tenía 3 registros.
  - V2 = 140 ÷ 140 = **100 %**.
  - V3: TP 93, FP 0, FN 0, TN 47, F1 = **1,000**; 476 de 476 controles vencidos coinciden.
  - M3.2 = **100 %**.
- **META DE LA GUÍA:** ≥ 80 % (Inc. 2).


[CAPTURA 1: EVIDENCIA EN EL DOMINIO]

- **Descripción: Figura 27.** V1: producción, «Reporte del periodo». Cuenta los niños registrados y las evaluaciones del periodo (762 niños y 2 630 evaluaciones) a partir del registro único, sin volver a digitar.

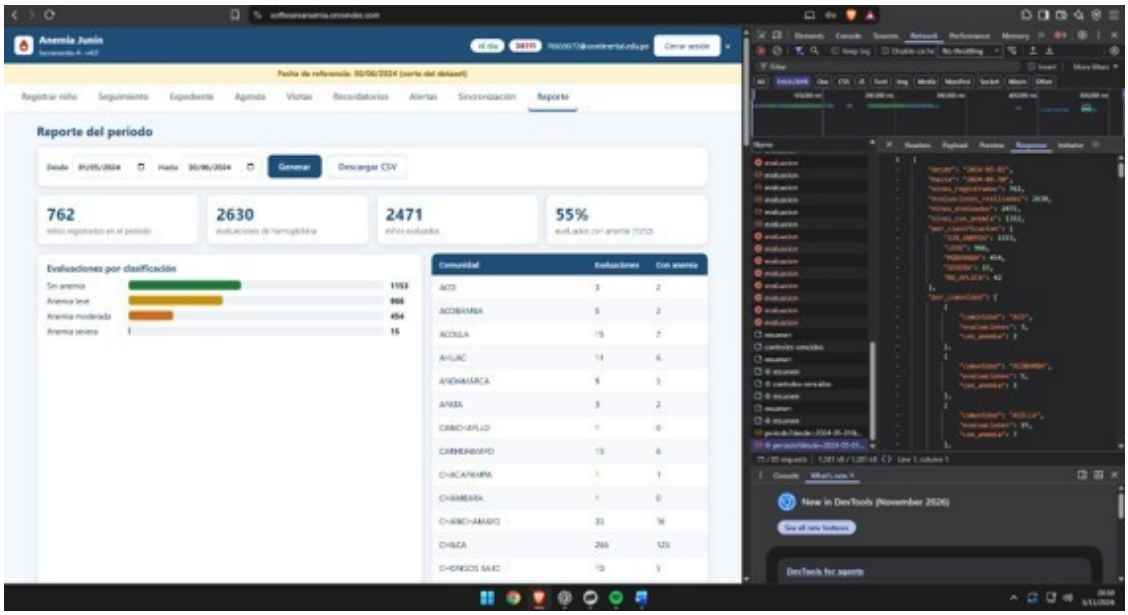


V1: resultado del registro único en producción.

- **Descripción: Figura 28.** V2: la agenda normativa se genera sola para cada niño activo. Expediente con sus controles cumplidos, pendientes y vencidos.

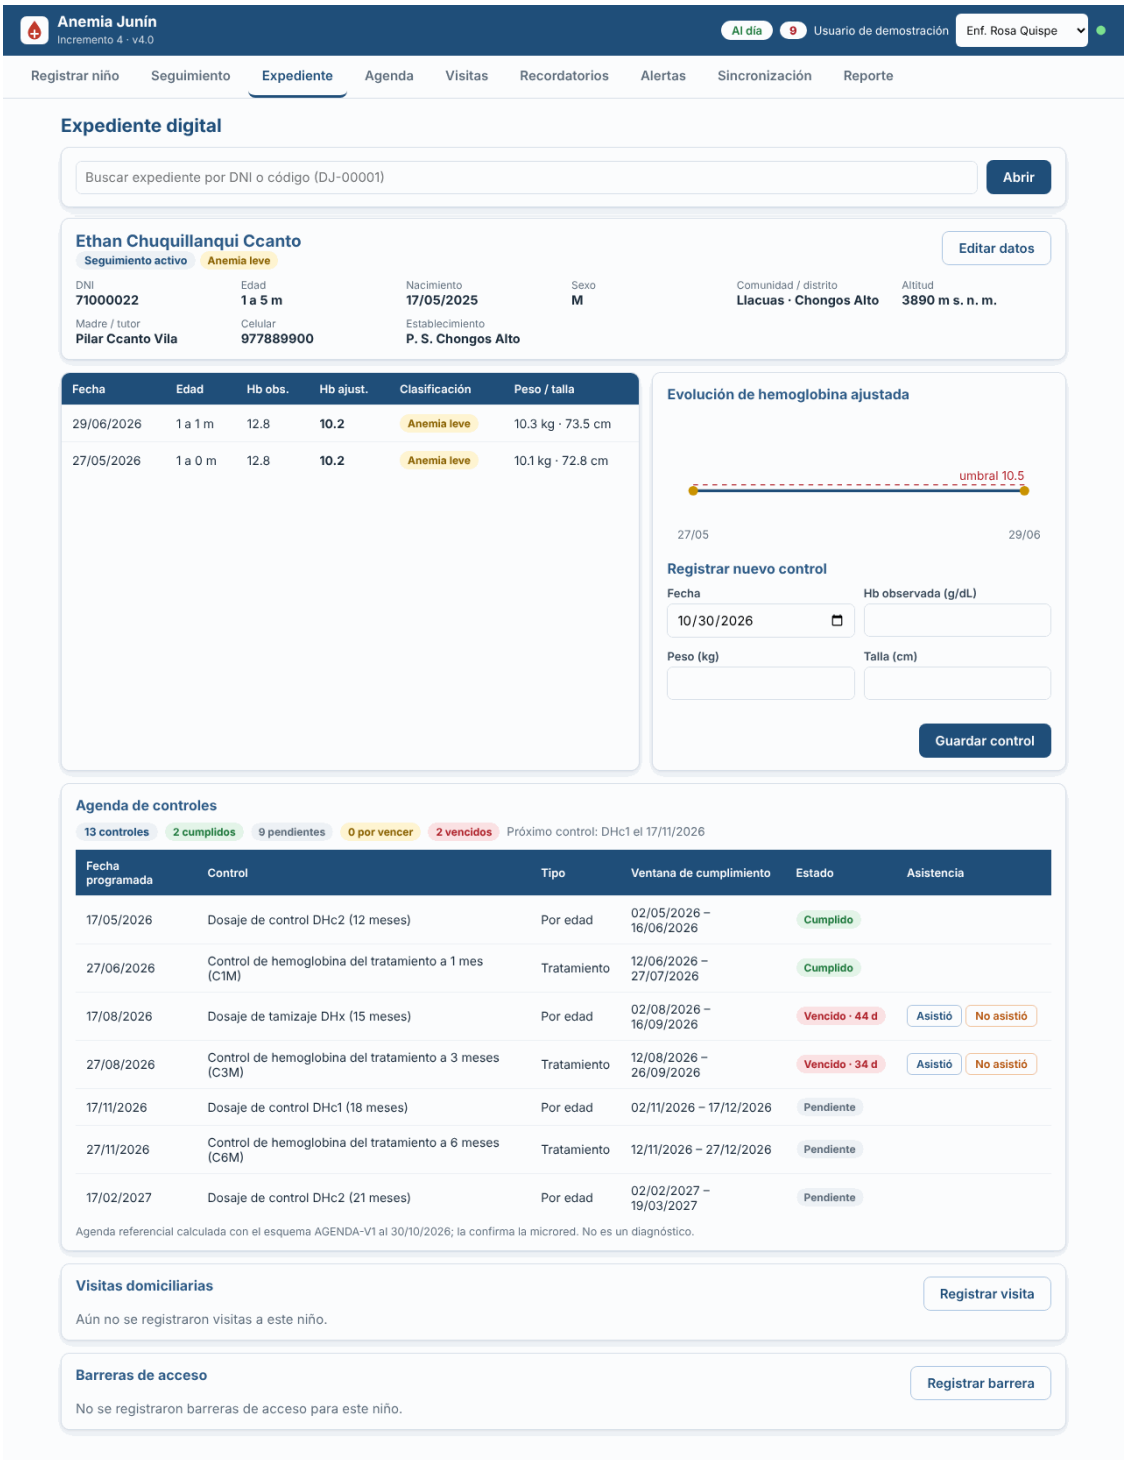

V2: agenda generada en el expediente.

- **Descripción: Figura 29.** V3: producción, «Alertas de controles vencidos» sobre el dataset DIRESA anonimizado, con prioridad, días de atraso y comunidad.

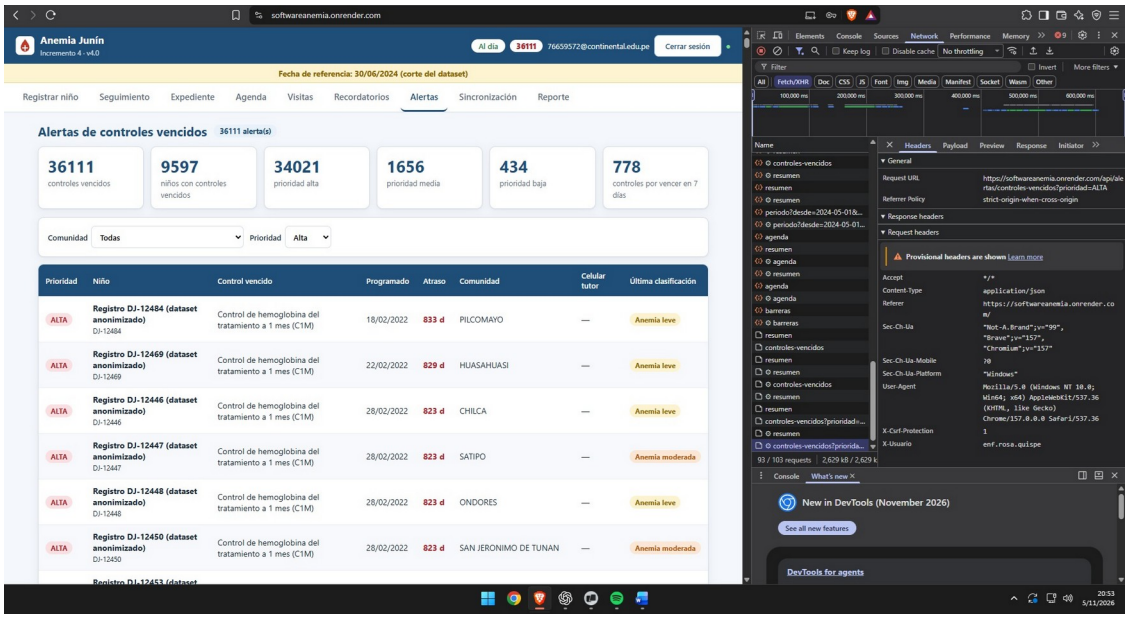

V3: alertas de controles vencidos en producción.

- **Archivos de imagen:** `entregables/semana-12/evidencias/produccion/ROD_01_inc1_registro_clasificacion2.jpg`, `entregables/semana-10/evidencias/software/RF06_inc2_1_agenda_expediente_escritorio.png`, `entregables/semana-12/evidencias/produccion/PROD_02_inc2_alertas.jpg`

[CAPTURA 2: EJECUCIÓN DE LA MEDICIÓN]

- **Descripción: Figura 30.** Resultado de `m32_valor.py`, corrida de la adenda S9 del 30/10/2026 sobre `v4.0-Inc4`. Muestra V1 (1 escritura; 4 vistas que reflejan el registro), V2 (140/140) y V3 (matriz de confusión con F1 = 1,0 y 476/476 controles).

```
M3.2 Índice de impacto en valor: V1, V2 y V3 (G-03, Q3.2)

# V1: escrituras manuales por evaluación (sección "V1")
escrituras_para_registrar_nino_con_evaluacion: 1
escrituras_para_agregar_un_control: 1
registros_por_evaluacion: 1
filas_bd_antes: [148, 804]
filas_bd_despues_registro: [149, 805]
vistas_que_reflejan_el_registro: {"expediente_con_1_evaluacion": true, "seguimiento_lista_al_nino": true, "reporte_cuenta_la_evaluacion": tr
ue, "agenda_sin_digitacion_adicional": true}

# V2: niños activos con agenda generada (sección "V2")
activos: 140
con_agenda_generada: 140
pct_agenda: 100.0
codigos_http_agenda: {"200": 140}

# V3: detección de controles vencidos frente al oráculo independiente (sección "V3")
n_activos_evaluados: 140   prevalencia_oraculo: 0.664
control_atrasado_api_ninos: TP=93 FP=0 FN=0 TN=47  precision=1.0 sensibilidad=1.0 F1=1.0
nivel_control: {"controles_oraculo": 476, "controles_api": 476, "coinciden": 476, "solo_oraculo": [], "solo_api": []}
resumen_api: {"total_vencidos": 476, "por_prioridad": {"ALTA": 450, "MEDIA": 17, "BAJA": 9}, "ninos_con_vencidos": 93, "proximos_7_dias": 1
0}

$ python m32_valor.py --version v2.0 --base <servidor local> --dataset datos/dataset_B150.json --seccion v1 v2 v3 v6
cwd: herramientas/gqm  |  fecha: 2026-10-30 19:43 (corrida de la adenda S9)  |  código de app/: idéntico a la etiqueta v4.0-Inc4  |  extracto del archivo
entregables/semana-09/metricas/salidas/m32_valor_v4.json
```

Resultado de M3.2.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-12/correcciones/img/G05_m32_valor.png`


EVALUACIÓN: CUMPLE | FECHA: 06/11/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

FICHA DE EVALUACIÓN GQM Y EVIDENCIA VISUAL POR MÉTRICA (V4 Y V5)

- **META:** G-03 (indicadores complementarios de valor).
- **MÉTRICAS:** V4 p95 agregado con 50 usuarios simultáneos; V5 disponibilidad durante la carga = sondas disponibles ÷ sondas × 100.
- **DATOS Y CÁLCULO:**
  - V4: 1 960 solicitudes, 0 fallos, p95 = **1 100 ms** (una corrida).
  - V5: 64 ÷ 64 × 100 = **100 %**.
- **META:** V4 < 800 ms; V5 ≥ 99,5 %.

[CAPTURA 1: EVIDENCIA EN EL DOMINIO]

- **Descripción: Figura 31.** Carga con Locust sobre las pantallas de los incrementos 3 y 4 (20 usuarios). La curva p95 queda por debajo del umbral de 800 ms con 20 usuarios. Con 50 usuarios lo supera (Figura 33).

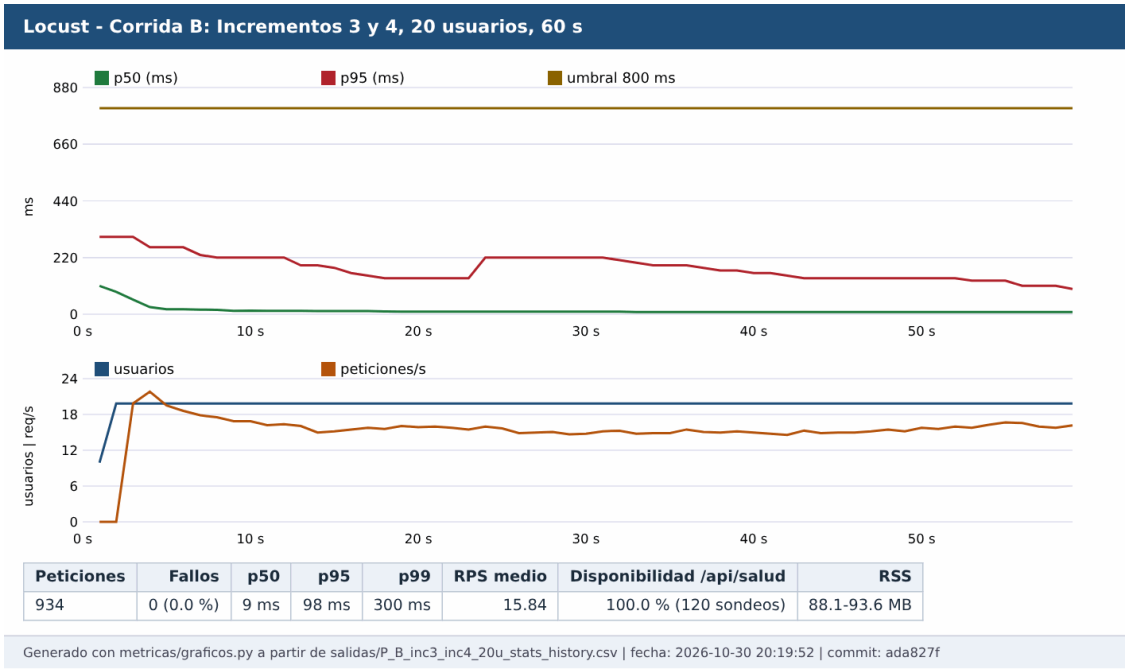


Peticiones	Fallos	p50	p95	p99	RPS medio	Disponibilidad /api/salud	RSS
934	0 (0.0 %)	9 ms	98 ms	300 ms	15.84	100.0 % (120 sondeos)	88.1-93.6 MB

Generado con metricas/graficos.py a partir de salidas/P_B_inc3_inc4_20u_stats_history.csv | fecha: 2026-10-30 20:19:52 | commit: ada827f

Carga con Locust.

- **Descripción: Figura 32.** Producción: `GET /api/salud` responde «ok» y `/openapi.json` declara la versión 4.0.0-inc4.

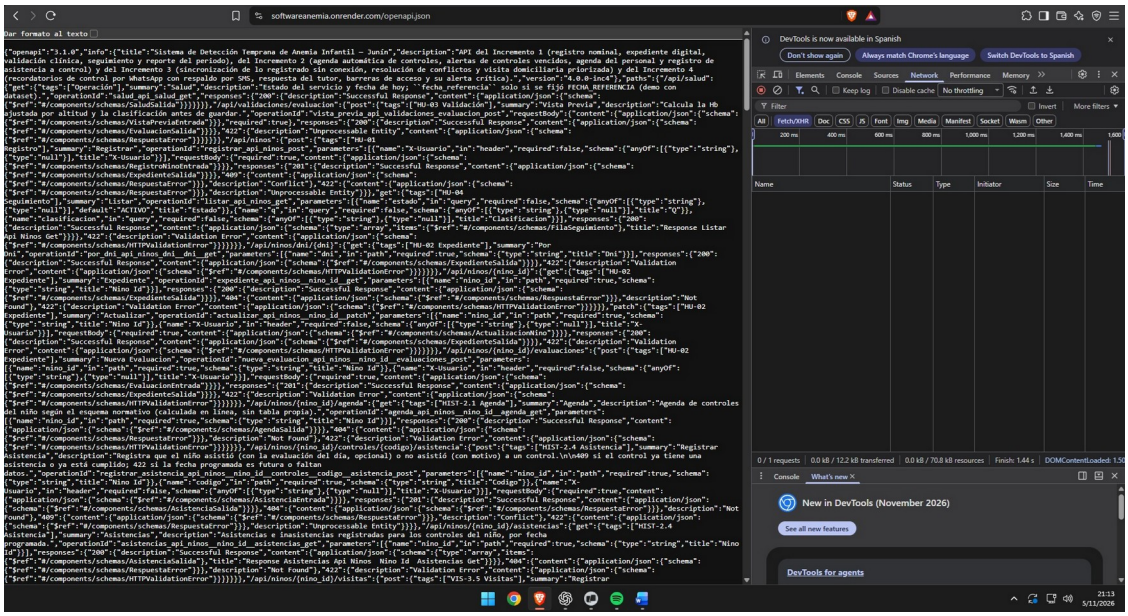

Salud y contrato en producción.

- **Archivos de imagen:** `entregables/semana-10/evidencias/rendimiento/P_locust_B_inc3_inc4_20u.png`, `entregables/semana-12/evidencias/produccion/PROD_06_salud_openapi.jpg`

[CAPTURA 2: EJECUCIÓN DE LA MEDICIÓN]

- **Descripción: Figura 33.** Corrida de carga de la adenda v4 (50 usuarios, 60 s): p95 por endpoint y agregado de 1 100 ms.

Corrida de carga de la adenda v4 (50 usuarios, 60 s, Inc. 4): p95 por endpoint

Locust, 50 usuarios, 10/s, 60 s, mix comun, B150, AUTH_MODE=demo; una sola corrida, sin control de v1.0

GET /api/ninos	n= 669	fallos=0	mediana= 250 ms	p95= 1200 ms	p99= 2000 ms
GET /api/ninos/{id}	n= 519	fallos=0	mediana= 59 ms	p95= 870 ms	p99= 1600 ms
GET /api/reportes/periodo	n= 141	fallos=0	mediana= 150 ms	p95= 1200 ms	p99= 2200 ms
POST /api/ninos	n= 266	fallos=0	mediana= 130 ms	p95= 1300 ms	p99= 2300 ms
POST /api/validaciones/evaluacion	n= 365	fallos=0	mediana= 24 ms	p95= 210 ms	p99= 310 ms
AGREGADO	n= 1960	fallos=0	mediana= 120 ms	p95= 1100 ms	p99= 1800 ms

```
$ python -c <imprime m32_carga_v4.json, corrida r1>
cwd: .  |  fecha: 2026-10-30 23:04:32  |  commit: 51ca4fc  |  salida: código 0
```

Carga de la adenda v4.

- **Descripción: Figura 34.** Sonda de disponibilidad `GET /api/salud` cada segundo durante la carga: 64 de 64 respuestas, 100 %.

V5 Disponibilidad durante la prueba de carga


```
{
 "nota": "Sonda GET /api/salud cada 1 s durante la corrida de carga de la version actual",
 "durante_carga": {
  "version": "v2.0",
  "modalidad": "sonda GET /api/salud cada 1 s durante la prueba de carga",
  "corridas": {
   "r1": {
    "sondas": 64,
    "disponibles": 64,
    "disponibilidad_pct": 100.0,
    "latencia_mediana_ms": 21.0,
    "latencia_p95_ms": 211.8,
    "latencia_max_ms": 315.1
   }
  },
  "sondas_total": 64,
  "disponibles_total": 64,
  "disponibilidad_pct_global": 100.0
 }
}
```


```
$ python ejecutar_carga.py --corridas v20_comun:1 (sonda GET /api/salud cada 1 s)
cwd: herramientas/gqm  |  fecha: 2026-10-30 19:43 (corrida de la adenda S9)  |  código de app/: idéntico a la etiqueta v4.0-Inc4  |  contenido de
entregables/semana-09/metricas/salidas/m32_disponibilidad_v4.json
```

Disponibilidad durante la carga.

- **Archivos de imagen:** `entregables/semana-11/evidencias/CMMI05_carga_p95_v4.png`, `entregables/semana-12/correcciones/img/G06_v5_disponibilidad.png`

EVALUACIÓN: V4 NO CUMPLE (1 100 ms > 800 ms; acción 16 del plan de mejora) · V5 CUMPLE | FECHA: 06/11/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

3.6.2 Estrategia de pruebas

Tabla 25. Pruebas automáticas del repositorio en `v4.0-Inc4`, re-ejecutadas el 30/10/2026 (adenda S9, sección 4; S10, Tabla 8).

Conjunto	Cantidad	Resultado	Comando (desde `pmv_fastapi/`)
Unitarias	416	Aprobadas	`python -m pytest --cov=app`
Integración (el CI las ejecuta además contra PostgreSQL 16)	219	Aprobadas	idem
Arquitectura (regla de dependencia)	25	Aprobadas	idem
Subtotal	**660**	**0 fallas; cobertura 99,79 %** (umbral del proyecto: 80 %)	
E2E con Playwright (navegador real)	28	Aprobadas, 0 fallas	`python -m pytest tests/e2e -m e2e`

pytest: unitarias + integracion + arquitectura con cobertura

```
........................................................................ [ 10%]
........................................................................ [ 21%]
........................................................................ [ 32%]
........................................................................ [ 43%]
........................................................................ [ 54%]
........................................................................ [ 65%]
........................................................................ [ 76%]
........................................................................ [ 87%]
........................................................................ [ 98%]
............                                                             [100%]
============================== warnings summary ===============================
..<venv>/lib/python3.13/site-packages/fastapi/testclient.py:1
  <venv>/lib/python3.13/site-packages/fastapi/testclient.py:1: StarletteDeprecationWarning: Using `httpx` with `starlette.testclient` is depre
cated; install `httpx2` instead.
    from starlette.testclient import TestClient as TestClient  # noqa


-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
================================ tests coverage ================================
_________________ coverage: platform linux, python 3.13.16-final-0 _________________

Name                                                                                 Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
app/__init__.py                                                                          0      0      0      0   100%
app/adapters/__init__.py                                                                 0      0      0      0   100%
app/adapters/inbound/__init__.py                                                         0      0      0      0   100%
app/adapters/inbound/http/__init__.py                                                    0      0      0      0   100%
app/adapters/inbound/http/api.py                                                       261      0     10      0   100%
app/adapters/inbound/http/autenticacion.py                                             100      4     26      4    94%   96, 110, 120, 136->143, 140
app/adapters/inbound/http/esquemas.py                                                  406      0      0      0   100%
app/adapters/outbound/__init__.py                                                        0      0      0      0   100%
app/adapters/outbound/notificaciones/__init__.py                                        19      0      4      0   100%
app/adapters/outbound/notificaciones/respaldo.py                                        15      0      2      0   100%
app/adapters/outbound/notificaciones/simulado.py                                         5      0      0      0   100%
app/adapters/outbound/notificaciones/sms.py                                             32      0      4      0   100%
app/adapters/outbound/notificaciones/whatsapp_cloud.py                                  33      0      4      0   100%
app/adapters/outbound/persistence/__init__.py                                            0      0      0      0   100%
[... 44 líneas omitidas en la captura; salida completa en metricas/salidas/R01_pytest_cobertura.txt ...]
app/domain/service/operaciones.py                                                       47      0     20      0   100%
app/domain/service/reglas_clinicas.py                                                   41      0     12      0   100%
app/domain/service/validaciones.py                                                      88      0     44      0   100%
app/domain/service/visitas.py                                                           75      0     20      0   100%
app/main.py                                                                             74      0      6      0   100%
app/ports/__init__.py                                                                    0      0      0      0   100%
app/ports/inbound/__init__.py                                                            0      0      0      0   100%
app/ports/inbound/agenda.py                                                              3      0      0      0   100%
app/ports/inbound/agenda_personal.py                                                     5      0      0      0   100%
app/ports/inbound/alertas.py                                                             3      0      0      0   100%
app/ports/inbound/asistencia.py                                                          4      0      0      0   100%
app/ports/inbound/barreras.py                                                            5      0      0      0   100%
app/ports/inbound/contexto.py                                                            3      0      0      0   100%
app/ports/inbound/expediente.py                                                          5      0      0      0   100%
app/ports/inbound/importacion.py                                                         7      0      0      0   100%
app/ports/inbound/notificaciones.py                                                     12      0      0      0   100%
app/ports/inbound/reportes.py                                                            3      0      0      0   100%
app/ports/inbound/seguimiento.py                                                         3      0      0      0   100%
app/ports/inbound/sesiones.py                                                            3      0      0      0   100%
app/ports/inbound/sincronizacion.py                                                      5      0      0      0   100%
app/ports/inbound/visitas.py                                                             5      0      0      0   100%
app/ports/outbound/__init__.py                                                           0      0      0      0   100%
app/ports/outbound/notificador.py                                                        3      0      0      0   100%
app/ports/outbound/proveedor_identidad.py                                                3      0      0      0   100%
app/ports/outbound/reloj.py                                                              4      0      0      0   100%
app/ports/outbound/repositorio_barreras.py                                               7      0      0      0   100%
app/ports/outbound/repositorio_ninos.py                                                 11      0      0      0   100%
app/ports/outbound/repositorio_recordatorios.py                                          9      0      0      0   100%
app/ports/outbound/repositorio_sincronizacion.py                                         7      0      0      0   100%
app/ports/outbound/repositorio_visitas.py                                                8      0      0      0   100%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                                                 4030      5    680      5    99%
Coverage JSON written to file /tmp/cov.json
Required test coverage of 80.0% reached. Total coverage: 99.79%
660 passed, 1 warning in 49.70s
```

```
$ python -m pytest --cov=app --cov-report=term-missing --cov-report=json:/tmp/cov.json -q -p no:cacheprovider
cwd: pmv_fastapi  |  fecha: 2026-10-30 19:38:52  |  commit: e6886e2  |  salida: código 0  |  duración: 52.1 s
```


pytest con cobertura: 660 aprobadas.

Figura 35. pytest con cobertura: 660 pruebas aprobadas y 99,79 % de cobertura (S10, 30/10/2026).

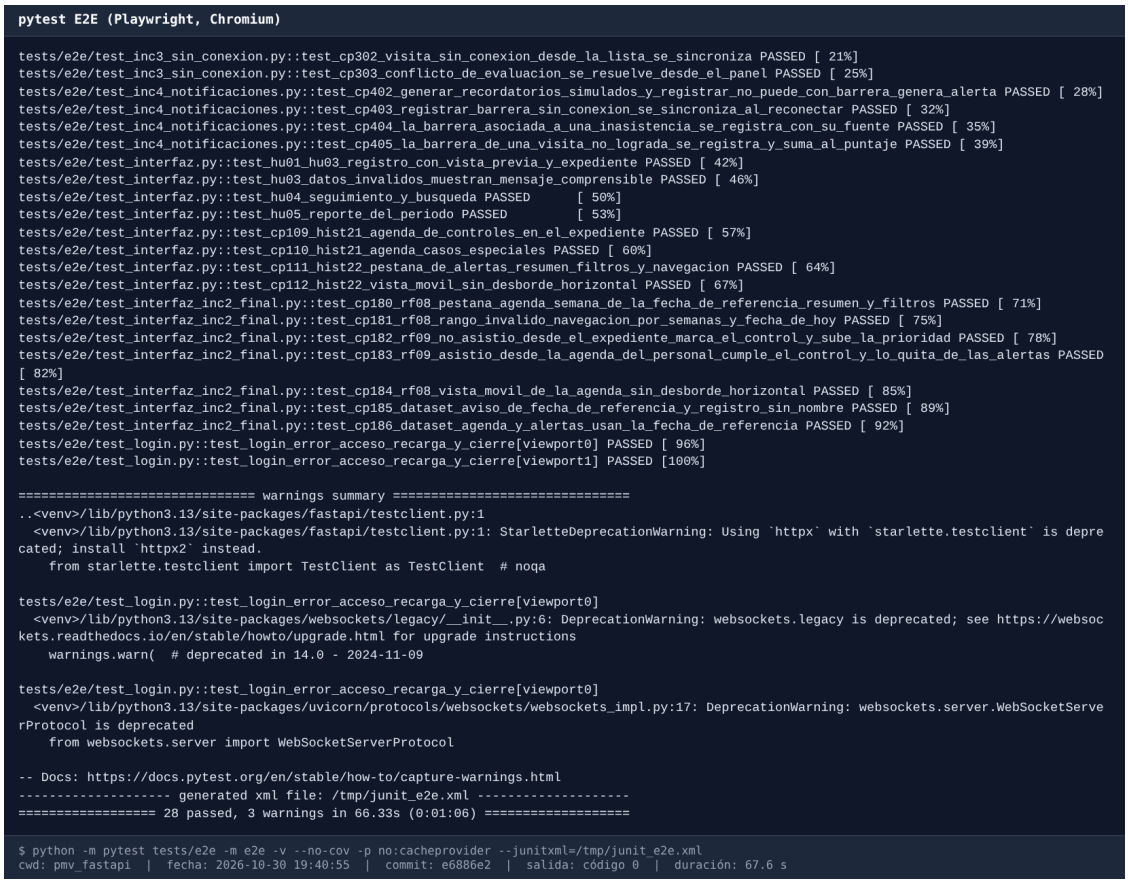

28 pruebas E2E aprobadas.

Figura 36. 28 pruebas E2E con Playwright aprobadas.

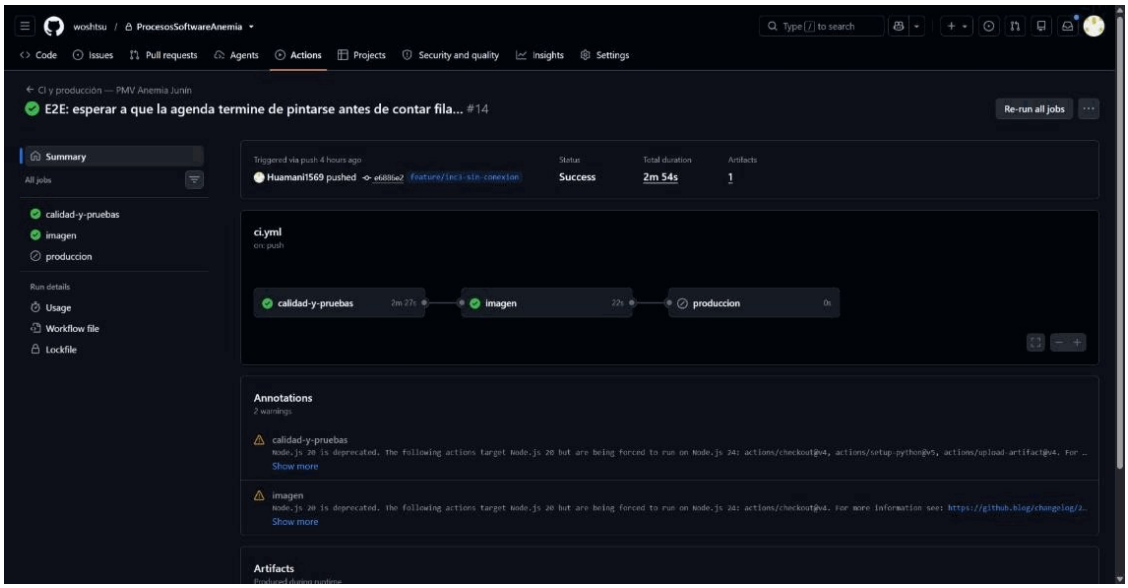

Ejecución de GitHub Actions en verde.

Figura 37. Ejecución #14 del CI en la rama de los incrementos 3 y 4: `calidad-y-pruebas` (2 min 27 s) e `imagen` (22 s) en verde; `produccion` se omite fuera de `main`.

Despliegue en producción. El trabajo `produccion` publica `main` en Render con Supabase. El 31/10/2026 se verificó la URL pública (https://softwareanemia.onrender.com): `GET /api/salud` respondió

`{"estado":"ok","fecha_hoy":"2024-06-30","fecha_referencia":"2024-06-30"}` y `GET /openapi.json` declara la versión `4.0.0-inc4` con 29 rutas, igual que el contrato de `v4.0-Inc4`. La aplicación desplegada usa un reloj fijo al corte del dataset (30/06/2024): sus agendas y vencimientos se calculan a esa fecha y no a la real. El 09/11/2026 el servicio se recreó en la región Virginia (https://softwareanemia-virginia.onrender.com), junto a la base de Supabase; el 12/11/2026 respondió con la misma versión y las mismas 29 rutas. Las capturas tomadas en producción están en las fichas GQM (apartado 3.6.1) y en la ficha VAL de la sección 3.8.

La cobertura alta no garantizó ausencia de defectos: seis de los siete defectos del Incremento 1 y cinco de los incrementos 3 y 4 escaparon a las pruebas, porque estas verificaban casos válidos y no entradas hostiles ni concurrencia. La revisión independiente (commit `d2ab78b`) corrigió cinco defectos: el webhook de WhatsApp aceptaba cuerpos sin firma si faltaba el secreto (alta), el reenvío simultáneo de una operación duplicaba una evaluación (media), dos generaciones simultáneas de recordatorios enviaban el mensaje dos veces (media) y dos defectos de interfaz (baja; la adenda S9 los cuenta como uno). Cada corrección tiene prueba de regresión salvo los dos de interfaz.

3.6.3 Fichas de prueba funcional con evidencia fotográfica

Cada ficha sigue el formato de la «Ficha Modelo de Prueba Funcional con Evidencia Fotográfica» de la plantilla: encabezado, proyecto, incremento, requerimiento, caso de prueba, dato de entrada, resultado esperado, dos capturas (datos de entrada cargados y confirmación o resultado) y evaluación. Hay 20 fichas: los 19 escenarios de aceptación de los cuatro incrementos y la autenticación. Las capturas son del software en ejecución sobre `v4.0-Inc4` (Playwright con Chromium; escritorio 1366x768; datos sintéticos, `AUTH_MODE=demo`, 30/10/2026), producidas por `entregables/semana-10/metricas/capturar_software.py`; cada escenario incluye aserciones y, si una falla, queda «Rechazado». Excepciones: la captura 1 de RF-05 y de RF-06 y la captura 2 de RF-05 son de S9 sobre `v1.0-PMV` y sobre el hito `v1.5.0-inc2-avance` (el pie de la imagen indica versión y fecha). Los identificadores `CP-RF0X-01` son los de S9; los demás siguen la misma convención. Las vistas móviles (390x844) están en `../semana-10/evidencias/software/`. El evaluador es el QA Lead; la firma manuscrita está pendiente. Cada incremento cierra con el marcador de su captura en producción (https://softwareanemia.onrender.com); la aplicación desplegada usa un reloj fijo al 30/06/2024, por lo que sus fechas difieren de las de las capturas locales.

Tabla 26. Resumen de las fichas por incremento (S10, Tabla 7).

Incremento	Fichas	Aprobadas	Capturas (S10, incluye móvil)
Inc. 1 (`v1.0-PMV`)	RF-01 a RF-05	5/5	15

Incremento	Fichas	Aprobadas	Capturas (S10, incluye móvil)
Inc. 2 (`v2.0-Inc2`)	RF-06 a RF-09	4/4	13
Inc. 3 (`v3.0-Inc3`)	HIST-3.1, HIST-3.1b, HIST-3.2, HIST-3.3, HIST-3.4, VIS-3.5	6/6	13
Inc. 4 (`v4.0-Inc4`)	HIST-4.1 a HIST-4.4	4/4	13
Total	**19 escenarios** (más la ficha AUTH)	**19/19**	**54**


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (RF-01)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 1 (PMV), etiqueta `v1.0-PMV`
- **REQUERIMIENTO:** RF-01 / HU-01 - Registro del niño con evaluación inicial (`POST /api/ninos`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-RF01-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/integracion/test_api.py` y `tests/unitarias/test_casos_uso.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** { dni: “72000001”, sexo: “F”, fecha_nacimiento: “09/10/2025”, altitud_m: 3720, hemoglobina_observada: 11.6, peso_kg: 8.4, talla_cm: 71 } (datos sintéticos); segundo envío con el mismo DNI
- **RESULTADO ESPERADO:** Registro persistido, confirmación visible y expediente abierto en menos de 2 s; el DNI repetido se rechaza con HTTP 409.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 38.** RF-01, captura 1. Formulario de registro con los datos sintéticos cargados antes de «Guardar registro»; la vista previa ya muestra Hb ajustada 9,1 g/dL y «Anemia moderada».

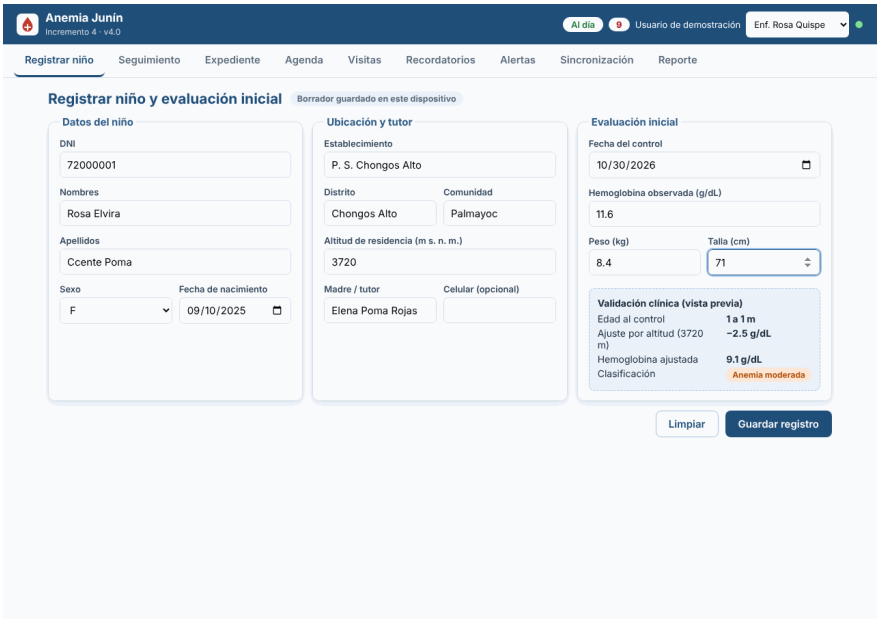


RF-01, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF01_inc1_1_entrada_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 39.** RF-01, captura 2. Confirmación y expediente creado tras «Guardar registro» (130 ms); el DNI repetido respondió HTTP 409.

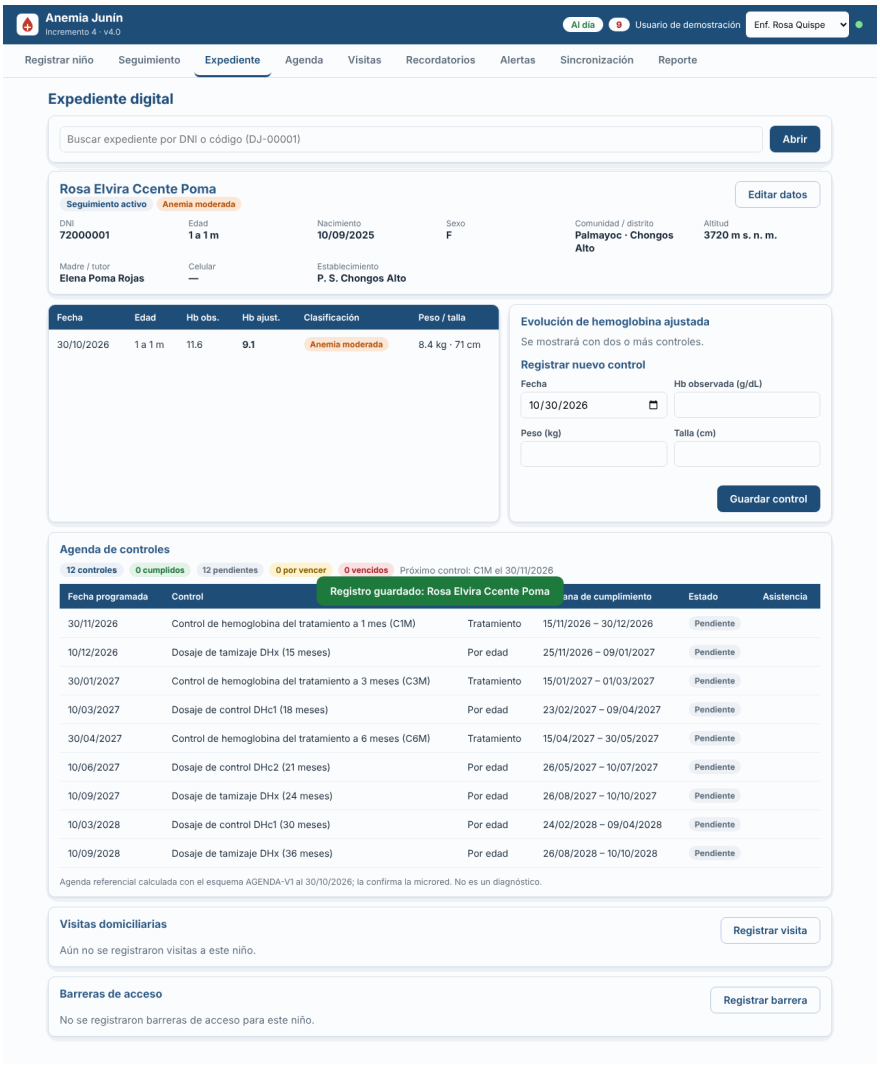

RF-01, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF01_inc1_2_resultado_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (RF-02)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 1 (PMV), etiqueta `v1.0-PMV`
- **REQUERIMIENTO:** RF-02 / HU-02 - Consulta y actualización del expediente; nuevo control (`GET /api/ninos/dni/{dni}`, `PATCH /api/ninos/{id}`, `POST /api/ninos/{id}/evaluaciones`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-RF02-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/integracion/test_api.py` y `tests/unitarias/test_entidades.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** { dni: “71000001”, edición: { comunidad: “Llacuas”, tutor_celular: “987654322” }, nuevo_control: { hemoglobina_observada: 11.5, peso_kg: 8.2, talla_cm: 69 } }
- **RESULTADO ESPERADO:** Expediente consultado, campos permitidos actualizados y nuevo control persistido: el historial pasa de 2 a 3 evaluaciones.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 40.** RF-02, captura 1. Expediente del DNI 71000001 recién consultado, con su historial de 2 evaluaciones y el formulario de nuevo control.

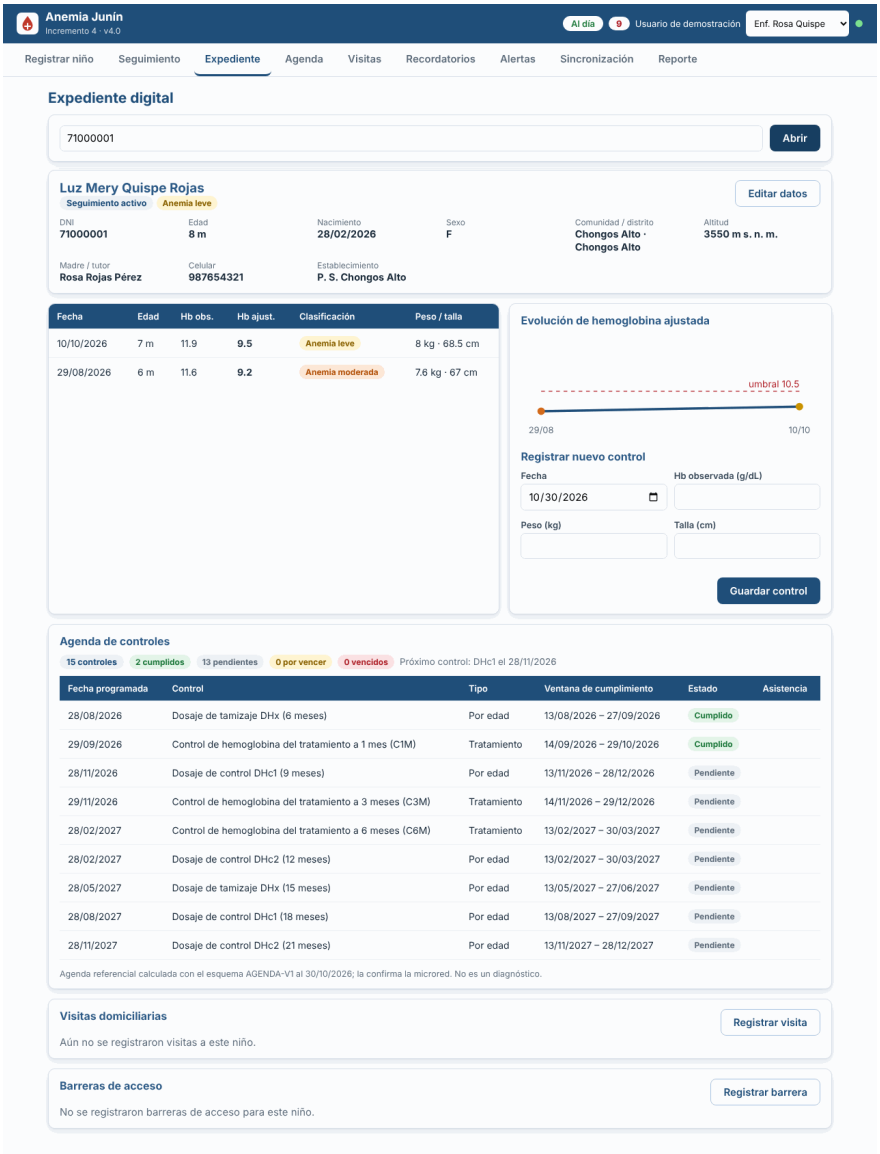


RF-02, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF02_inc1_1_expediente_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 41.** RF-02, captura 2. Nuevo control agregado: el historial pasa de 2 a 3 evaluaciones (la edición de datos se registró en `RF02_inc1_2_edicion_escritorio.png`).

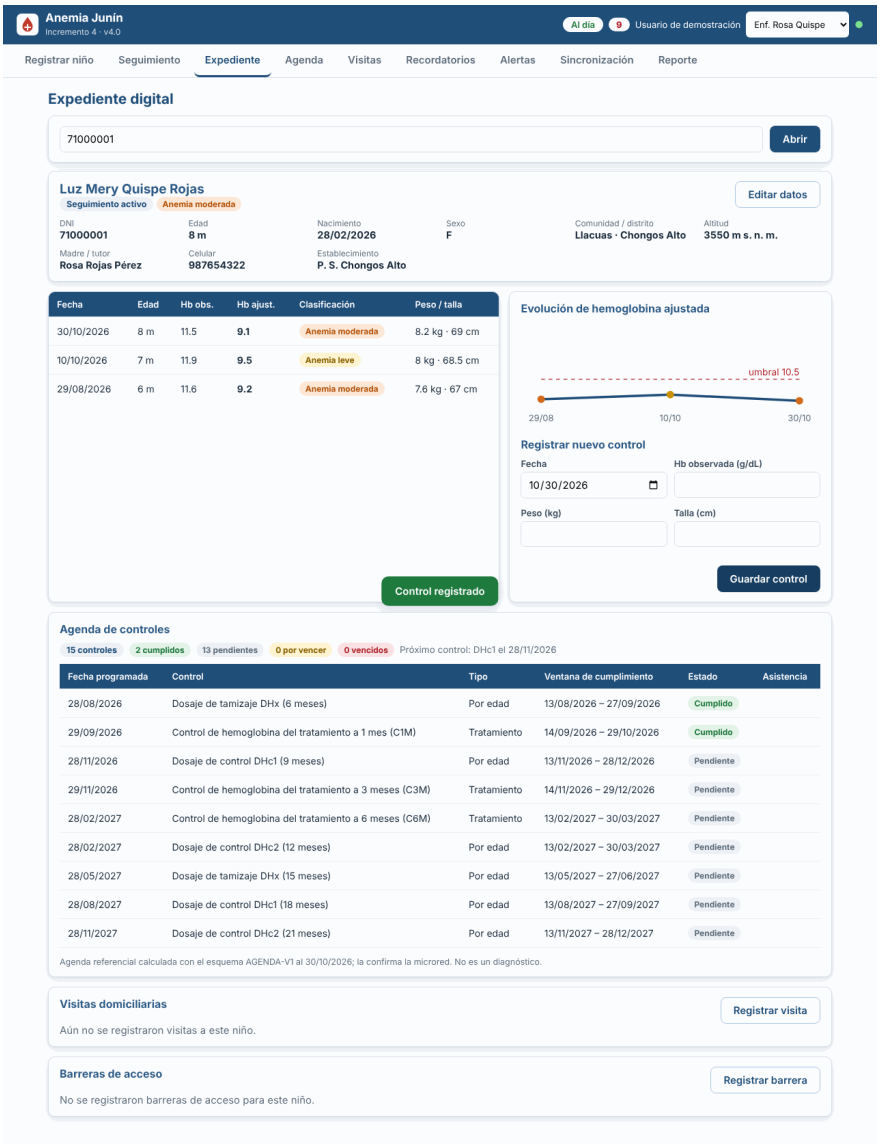

RF-02, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF02_inc1_3_nuevo_control_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (RF-03)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 1 (PMV), etiqueta `v1.0-PMV`
- **REQUERIMIENTO:** RF-03 / HU-03 - Validación con reglas clínicas (`POST /api/validaciones/evaluacion`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-RF03-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/unitarias/test_reglas_clinicas.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Válido: { hemoglobina_observada: 11.6, altitud_m: 3720 }. Inválido: { dni: “123”, hemoglobina_observada: 25 }
- **RESULTADO ESPERADO:** Con datos válidos, vista previa con Hb ajustada por altitud y clasificación; con datos inválidos, rechazo por campo (HTTP 422) sin guardar nada.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 42.** RF-03, captura 1. Formulario con Hb 11,6 g/dL a 3 720 m: la vista previa muestra Hb ajustada 9,1 g/dL y «Anemia moderada».

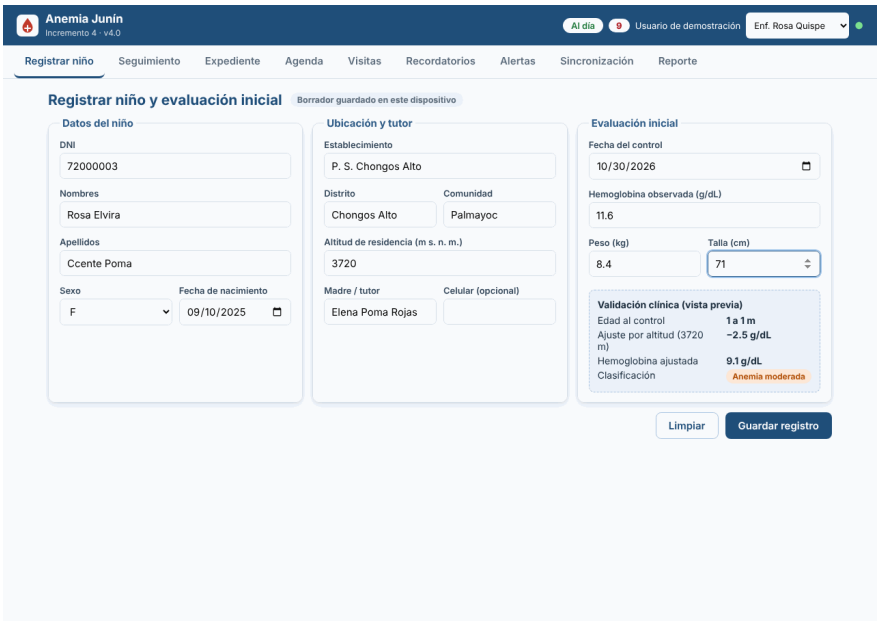


RF-03, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF03_inc1_1_vista_previa_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 43.** RF-03, captura 2. Datos inválidos (DNI «123», Hb 25 g/dL) rechazados con mensajes por campo (HTTP 422); no se guardó nada.

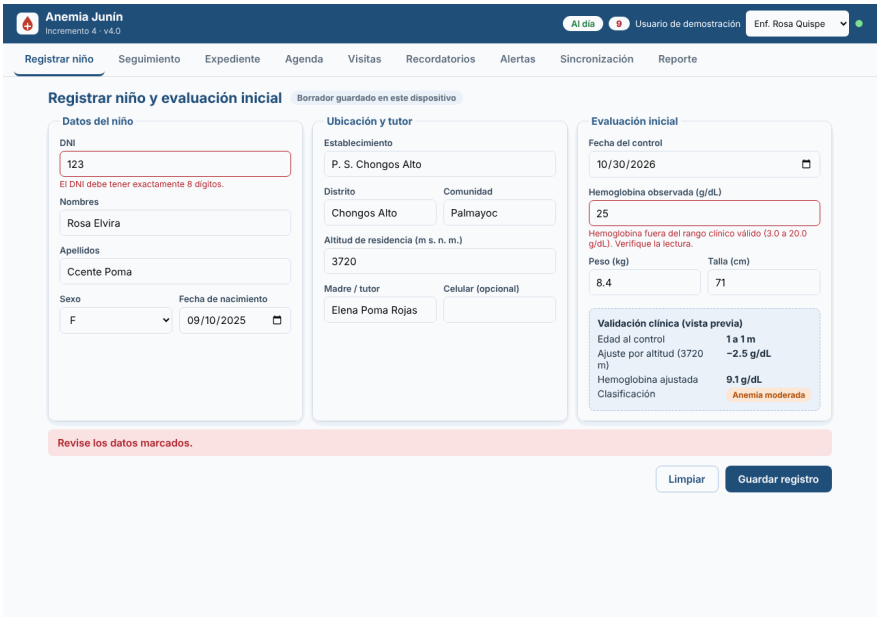

RF-03, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF03_inc1_2_rechazo_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (RF-04)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 1 (PMV), etiqueta `v1.0-PMV`
- **REQUERIMIENTO:** RF-04 / HU-04 - Listado de niños en seguimiento (`GET /api/ninos`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-RF04-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/integracion/test_api.py` y `tests/e2e/test_interfaz.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Base sintética de 27 niños; filtro de clasificación «Moderada»
- **RESULTADO ESPERADO:** Listado de seguimiento que respeta el filtro por clasificación.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 44.** RF-04, captura 1. Pestaña «Seguimiento» con el listado completo de niños, sin filtro.




RF-04, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF04_inc1_1_seguimiento_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 45.** RF-04, captura 2. Filtro por clasificación «Moderada» aplicado: 6 niños de 27.

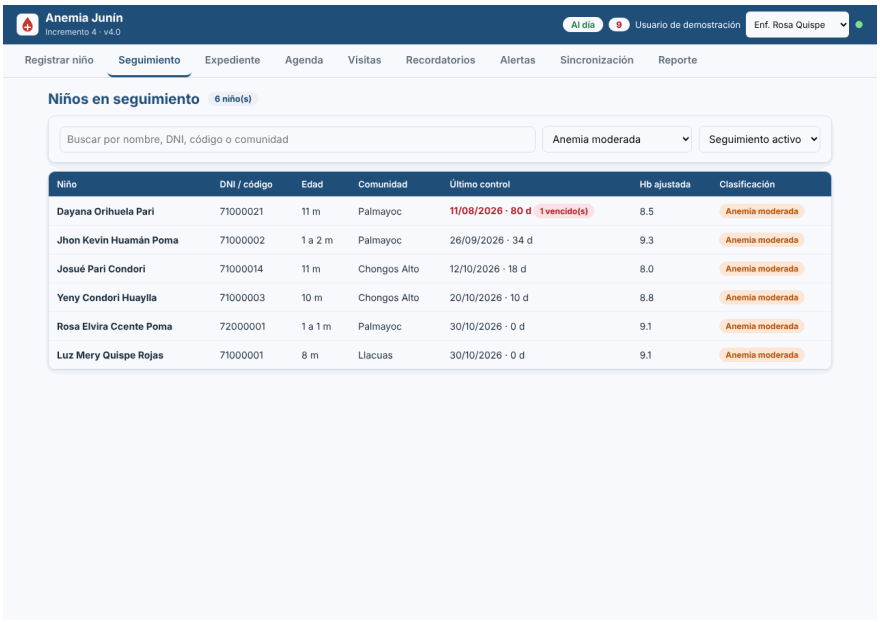

RF-04, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF04_inc1_2_filtro_moderada_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (RF-05)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 1 (PMV), etiqueta `v1.0-PMV`
- **REQUERIMIENTO:** RF-05 / HU-05 - Reporte del periodo en JSON y CSV (`GET /api/reportes/periodo`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-RF05-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/integracion/test_api.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** { desde: “01/09/2026”, hasta: “16/10/2026” } sobre la base sintética (captura de S9 sobre `v1.0-PMV`)
- **RESULTADO ESPERADO:** Indicadores del periodo en pantalla y CSV descargable en menos de 2 s.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 46.** RF-05, captura 1. Pestaña «Reporte» con el periodo cargado antes de pulsar «Generar» (captura de S9, `v1.0-PMV`; el pie de la imagen indica versión y fecha).

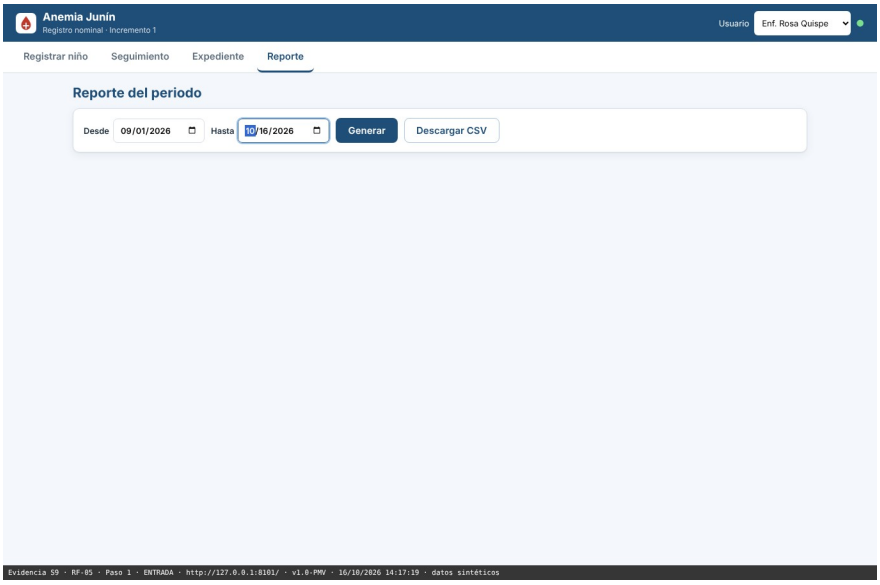


RF-05, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-09/evidencias_capturas/RF-05/RF05_inc1_paso1_entrada.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 47.** RF-05, captura 2. Reporte generado: 15 niños registrados, 15 evaluaciones, 13 evaluados y 77 % con anemia. En `v4.0-Inc4` el mismo flujo dio 28 registrados y un CSV de 43 líneas en 86 ms (`RF05_inc1_1_reporte_escritorio.png`).

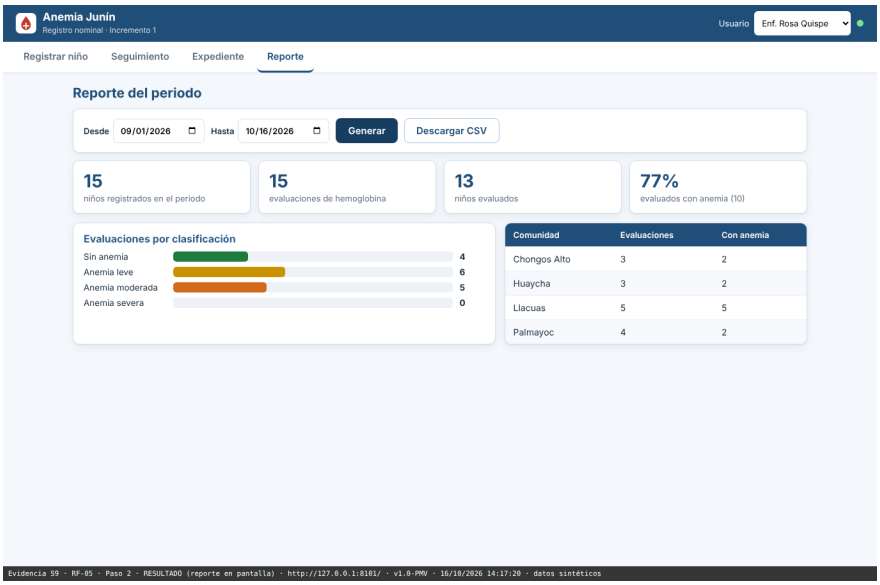

RF-05, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-09/evidencias_capturas/RF-05/RF05_inc1_paso2_resultado.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

Captura en producción (PMV, Incremento 1): el formulario «Registrar niño» con la vista previa de la clasificación en `softwareanemia.onrender.com` está en la Figura 18 y el «Reporte del periodo» en producción, en la Figura 27 (fichas GQM del apartado 3.6.1).


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (RF-06)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 2, etiqueta `v2.0-Inc2`
- **REQUERIMIENTO:** RF-06 / HIST-2.1 - Agenda de controles según la normativa (`GET /api/ninos/{id}/agenda`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-RF06-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/unitarias/test_agenda.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** { dni: “71000022” } (niño con anemia leve en tratamiento)
- **RESULTADO ESPERADO:** Agenda normativa en el expediente con estados cumplido, pendiente y vencido por control.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 48.** RF-06, captura 1. Búsqueda del DNI 71000022 en «Seguimiento»: 1 niño con 2 controles vencidos (captura de S9, hito `v1.5.0-inc2-avance`).

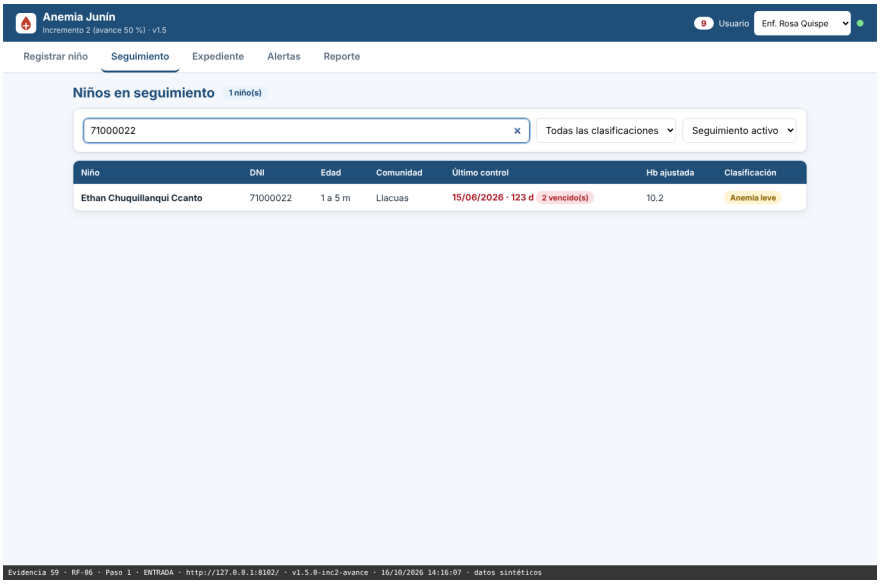


RF-06, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-09/evidencias_capturas/RF-06/RF06_inc2_paso1_entrada.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 49.** RF-06, captura 2. Expediente con la agenda de 13 controles (2 cumplidos, 9 pendientes, 2 vencidos) en `v4.0-Inc4`.

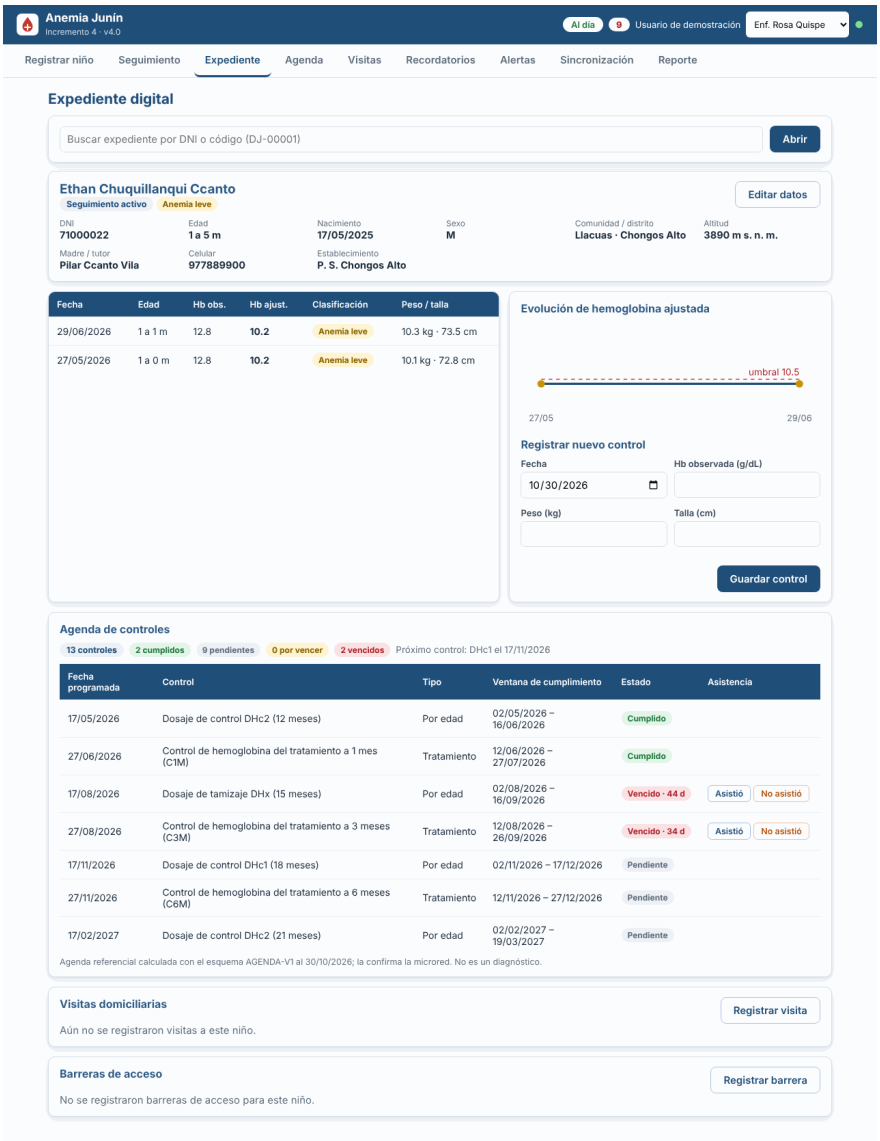

RF-06, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF06_inc2_1_agenda_expediente_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (RF-07)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 2, etiqueta `v2.0-Inc2`
- **REQUERIMIENTO:** RF-07 / HIST-2.2 - Controles vencidos y alertas priorizadas (`GET /api/alertas/controles-vencidos`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-RF07-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/unitarias/test_alertas.py` y `tests/integracion/test_api_inc2.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Base sintética con 9 controles vencidos; filtro de prioridad MEDIA
- **RESULTADO ESPERADO:** Controles vencidos ordenados por prioridad, con filtro por prioridad.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 50.** RF-07, captura 1. Pestaña «Alertas» con los 9 controles vencidos priorizados (7 ALTA, 1 MEDIA, 1 BAJA).

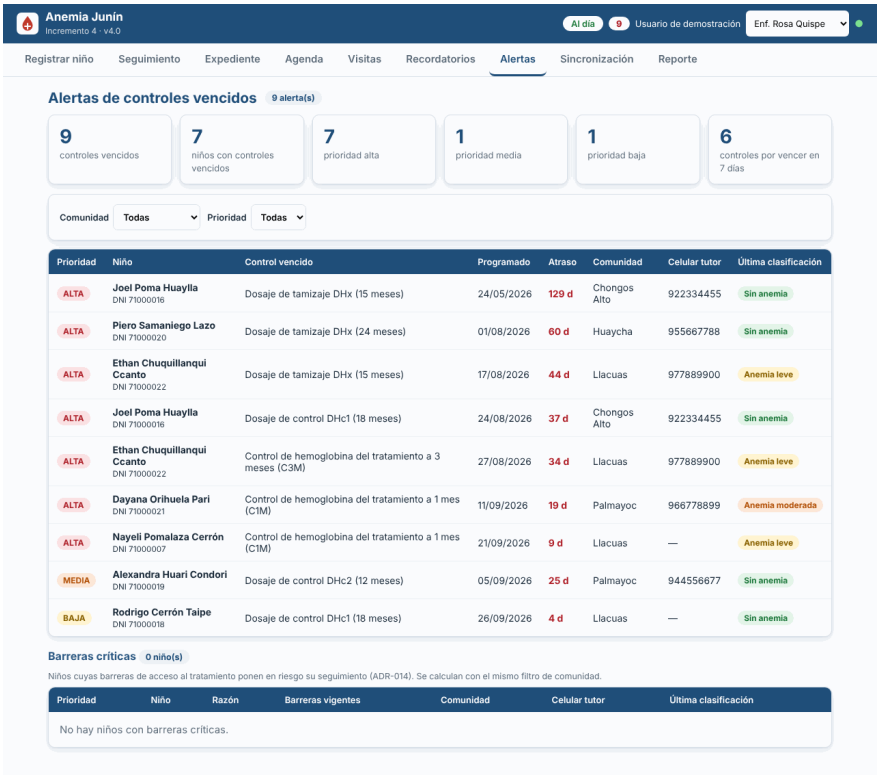


RF-07, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF07_inc2_1_alertas_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 51.** RF-07, captura 2. Lista filtrada por prioridad MEDIA.

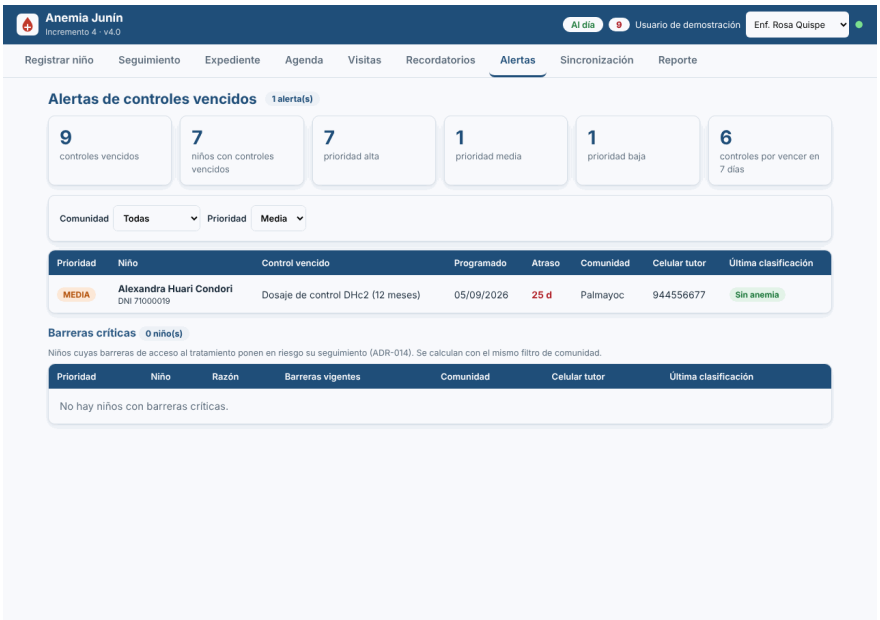

RF-07, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF07_inc2_2_filtro_media_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (RF-08)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 2, etiqueta `v2.0-Inc2`
- **REQUERIMIENTO:** RF-08 / HIST-2.3 - Agenda del personal por rango de fechas (`GET /api/agenda`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-RF08-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/unitarias/test_agenda_personal.py` y `tests/e2e/test_interfaz_inc2_final.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Rangos de 7 y 30 días; rango mayor de 31 días para la validación
- **RESULTADO ESPERADO:** Controles agrupados por día para un rango de hasta 31 días; un rango mayor se rechaza.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 52.** RF-08, captura 1. Pestaña «Agenda» con el rango de la semana cargado.

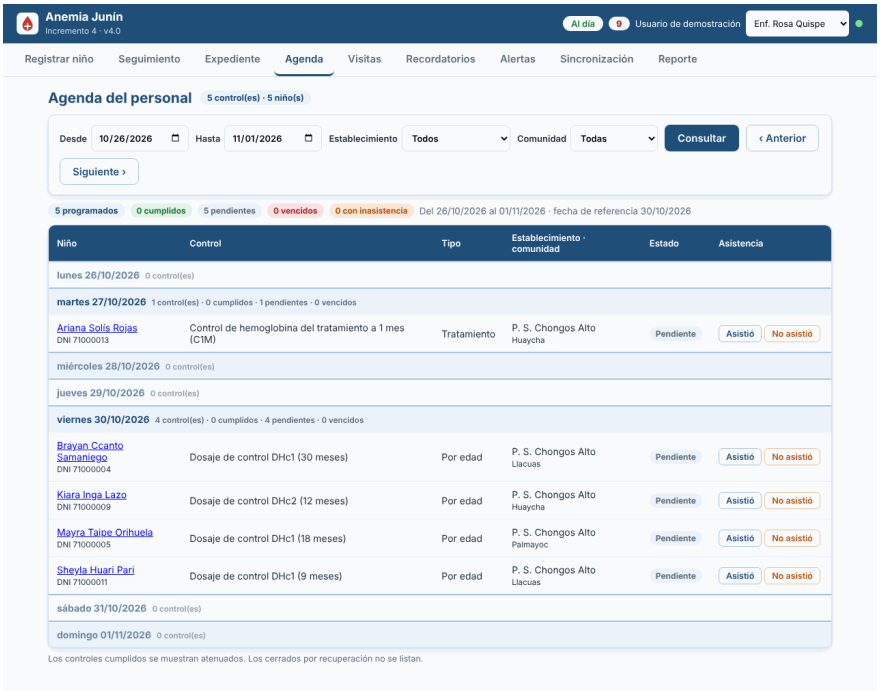


RF-08, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF08_inc2_1_agenda_semana_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 53.** RF-08, captura 2. Agenda de 30 días: 17 controles de 14 niños; el rango mayor de 31 días se rechaza (`RF08_inc2_3_rango_invalido_escritorio.png`).

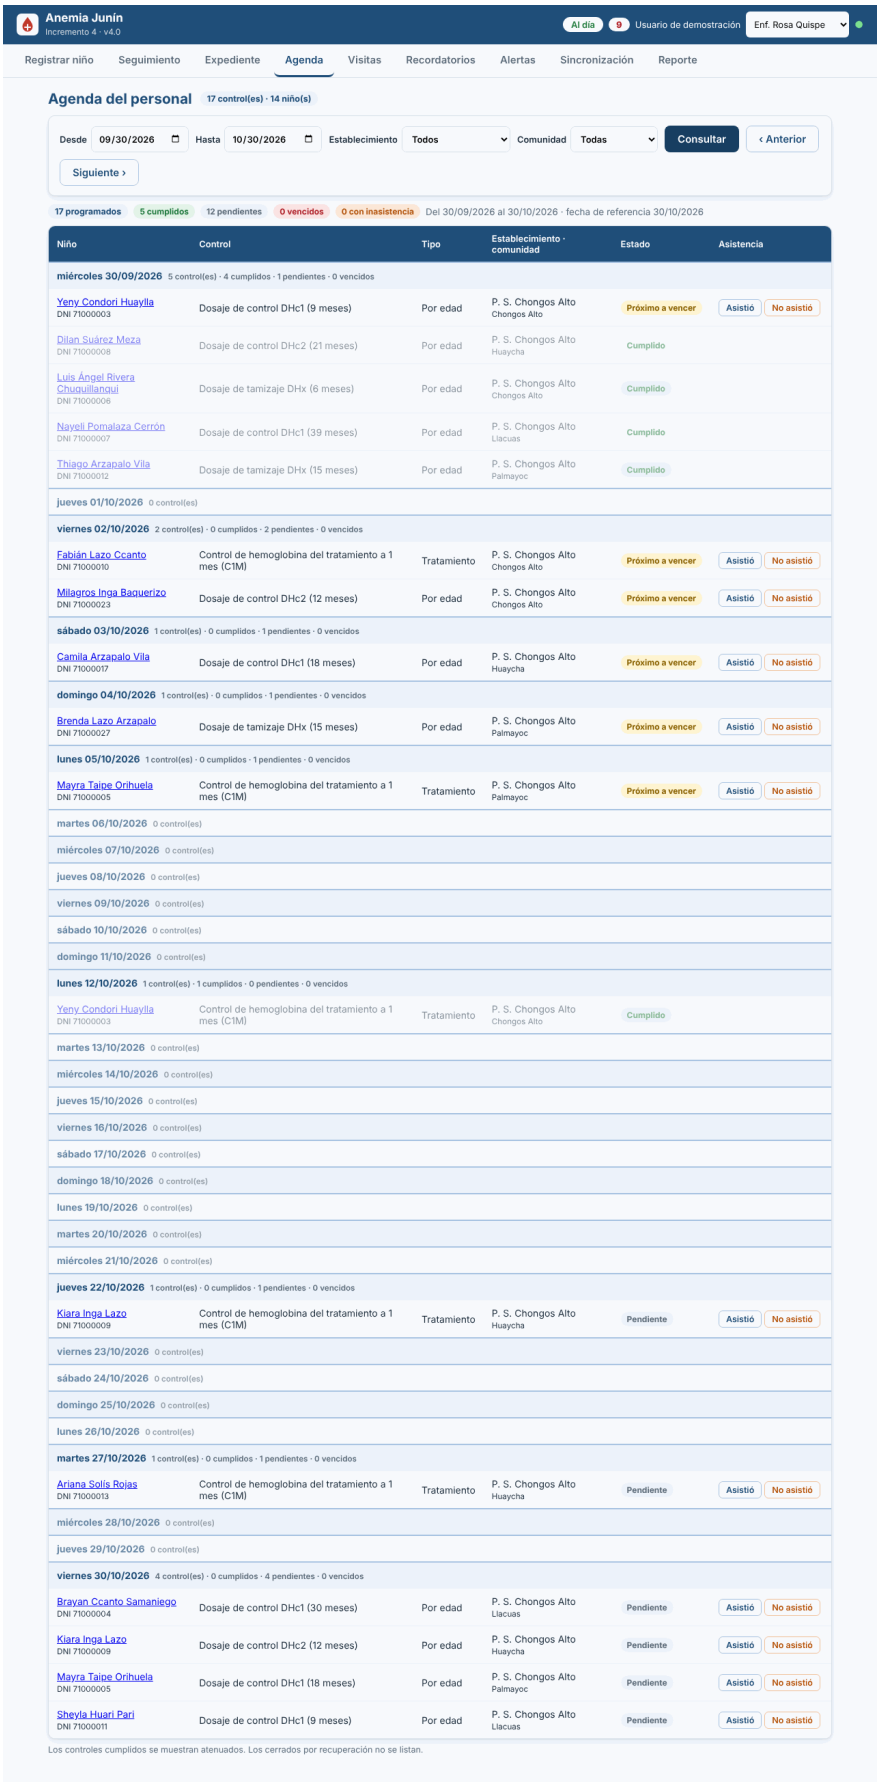

RF-08, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF08_inc2_2_agenda_30_dias_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (RF-09)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 2, etiqueta `v2.0-Inc2`
- **REQUERIMIENTO:** RF-09 / HIST-2.4 - Registro de asistencia a un control (`POST /api/ninos/{id}/controles/{codigo}/asistencia`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-RF09-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/unitarias/test_asistencia.py` y `tests/e2e/test_interfaz_inc2_final.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Control vencido de un niño sintético; «No asistió» con motivo
- **RESULTADO ESPERADO:** Marca de inasistencia registrada y prioridad de la alerta actualizada.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 54.** RF-09, captura 1. Modal «No asistió» con el motivo cargado antes de confirmar.

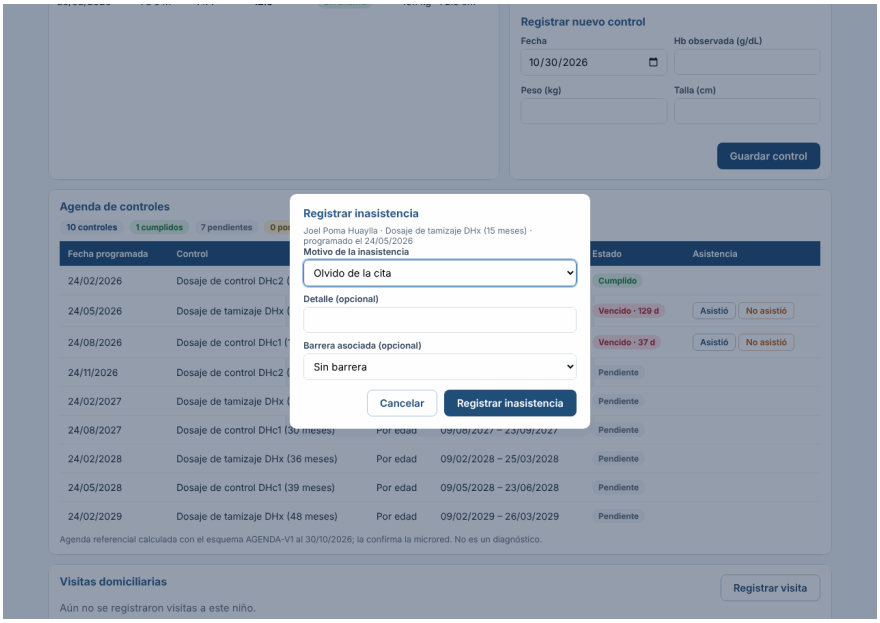


RF-09, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF09_inc2_1_modal_inasistencia_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 55.** RF-09, captura 2. Inasistencia registrada y prioridad actualizada; los vencidos sin registro pasan de 9 a 8.

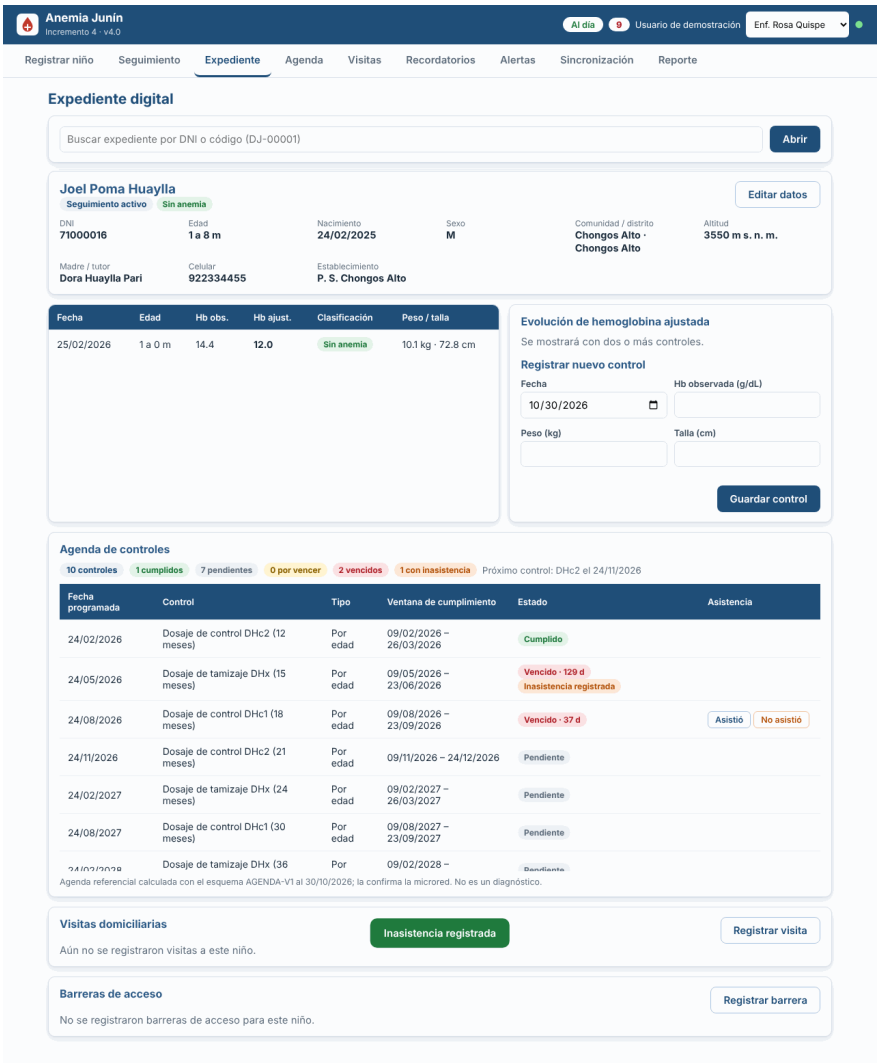

RF-09, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/RF09_inc2_2_inasistencia_registrada_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

Captura en producción (Incremento 2): la «Agenda del personal» y las «Alertas de controles vencidos» en producción, con el aviso de la fecha de referencia 30/06/2024, están en las Figuras 20 y 29 (fichas GQM del apartado 3.6.1).


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (HIST-3.1)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 3, etiqueta `v3.0-Inc3`
- **REQUERIMIENTO:** HIST-3.1 - Registro sin conexión (cola en el dispositivo); cola IndexedDB (`cola.js`) y service worker (`sw.js`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-HIST31-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/e2e/test_inc3_sin_conexion.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Sin red: { dni: “72300001”, hemoglobina_observada: 9.4 } y un nuevo control { hemoglobina_observada: 10.1, peso_kg: 8.6, talla_cm: 72 }
- **RESULTADO ESPERADO:** Las operaciones quedan en la cola local con indicador de pendientes y el servidor no las tiene.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 56.** HIST-3.1, captura 1. Aplicación en línea (indicador «Al día») antes de cortar la conexión; los datos se digitan ya sin red.

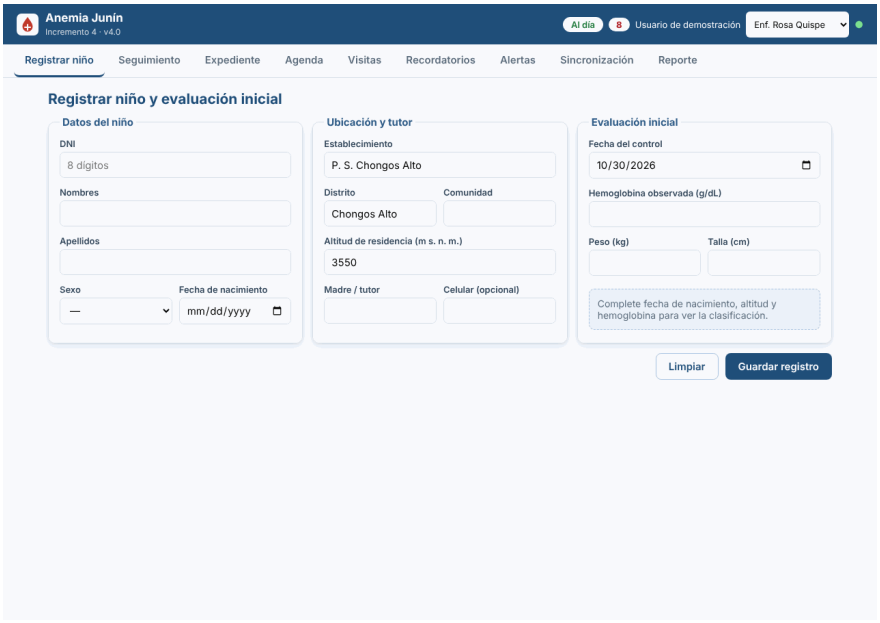


HIST-3.1, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST31_inc3_1_en_linea_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 57.** HIST-3.1, captura 2. Sin conexión: 2 operaciones pendientes en el dispositivo; el servidor responde 404 para ese DNI.

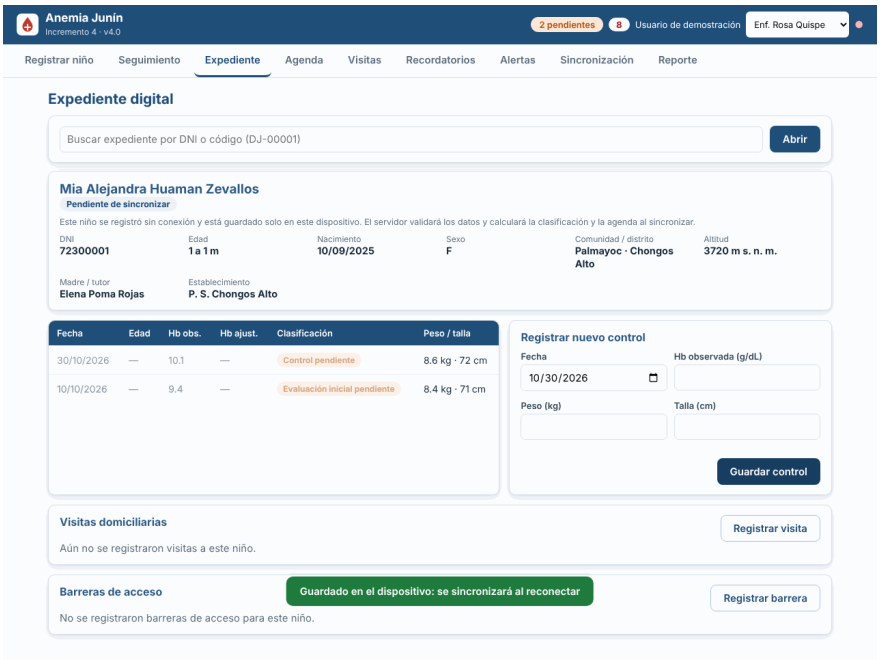

HIST-3.1, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST31_inc3_2_pendientes_sin_conexion_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (HIST-3.1b)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 3, etiqueta `v3.0-Inc3`
- **REQUERIMIENTO:** HIST-3.1b - Apertura sin conexión desde el caché; service worker (`sw.js`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-HIST31b-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/e2e/test_inc3_sin_conexion.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Servidor detenido y red cortada; recarga de la aplicación
- **RESULTADO ESPERADO:** La aplicación abre desde el caché con aviso y muestra las lecturas guardadas.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 58.** HIST-3.1b, captura 1. Estado previo: aplicación en línea con el servidor activo, antes de detenerlo.

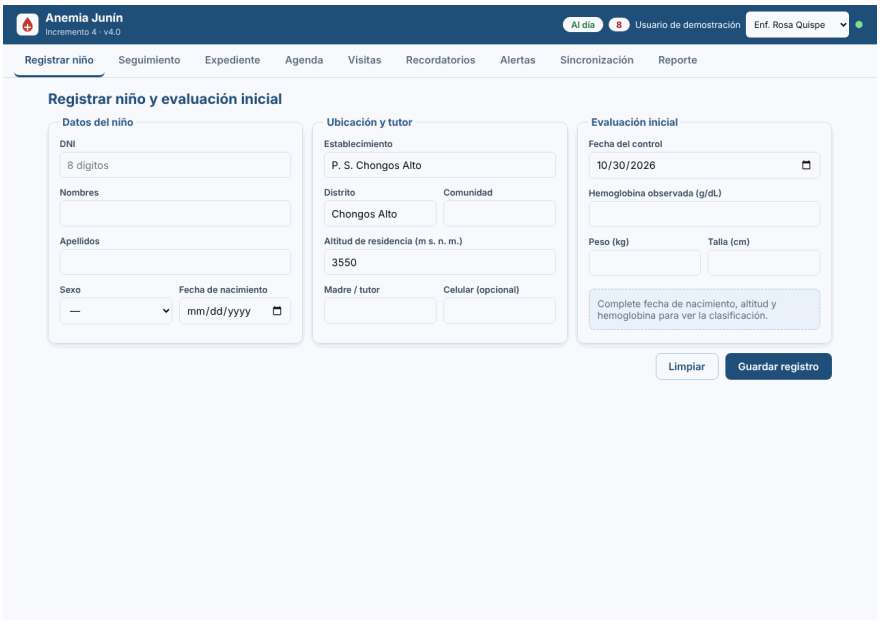

HIST-3.1b, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST31_inc3_1_en_linea_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 59.** HIST-3.1b, captura 2. Recarga con el servidor detenido: la aplicación abre desde el caché con el aviso de «sin conexión» y 30 de 30 filas servidas desde el caché.



HIST-3.1b, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST31_inc3_3_recarga_sin_conexion_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

Prueba en un celular real (producción). El mismo flujo se repitió en un celular con la red cortada: el registro quedó «Pendiente de sincronizar» y al volver la conexión pasó a «Al día» con «Sincronización: 1 aplicado(s)» (Figuras 24 y 25, ficha GQM de M3.1, brecha B6). Falta la prueba con red intermitente en una posta.


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (HIST-3.2)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 3, etiqueta `v3.0-Inc3`
- **REQUERIMIENTO:** HIST-3.2 - Sincronización idempotente al reconectar (`POST /api/sincronizacion`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-HIST32-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/unitarias/test_sincronizacion.py` y `tests/integracion/test_api_inc3.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Operaciones pendientes de HIST-3.1; reenvío de la misma operación (mismo identificador)
- **RESULTADO ESPERADO:** Cada operación se aplica una sola vez; el reenvío figura como DUPLICADA y no duplica datos.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 60.** HIST-3.2, captura 1. Pestaña «Sincronización» con las operaciones pendientes, antes de volver la red.

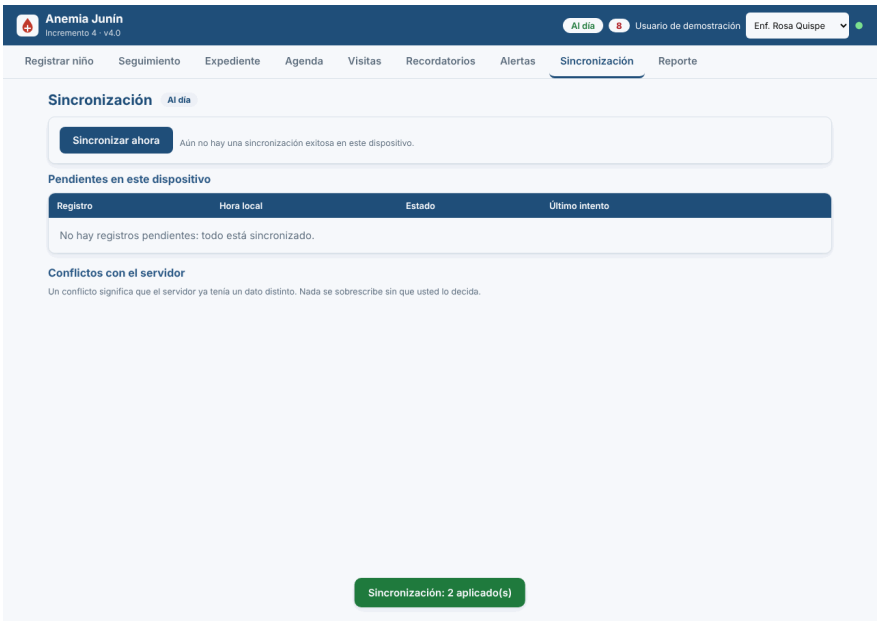


HIST-3.2, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST32_inc3_1_panel_antes_de_sincronizar_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 61.** HIST-3.2, captura 2. Red restablecida: operaciones aplicadas, indicador «Al día»; el reenvío se marca DUPLICADA y no duplica datos.

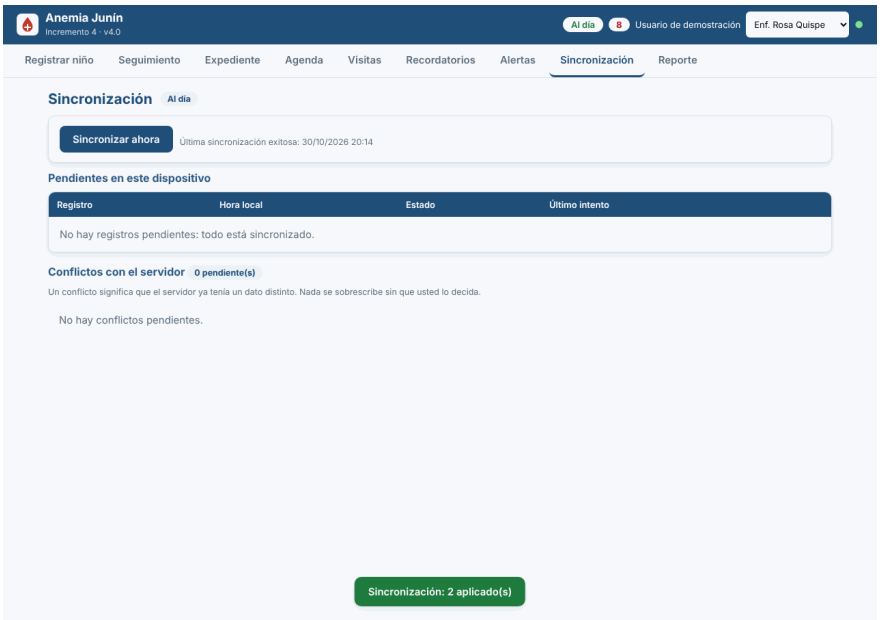

HIST-3.2, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST32_inc3_2_sincronizado_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (HIST-3.3)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 3, etiqueta `v3.0-Inc3`
- **REQUERIMIENTO:** HIST-3.3 - Resolución de conflictos sin sobrescribir a ciegas (`GET /api/sincronizacion/conflictos`, `POST /api/sincronizacion/conflictos/{id}/resolver`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-HIST33-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/unitarias/test_conflictos.py` y `tests/integracion/test_api_inc3.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** { dni: “72300003” } con un dato distinto en el servidor; control registrado sin conexión; decisión «Conservar servidor»
- **RESULTADO ESPERADO:** Queda un conflicto pendiente y el personal decide; no se sobrescribe a ciegas.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 62.** HIST-3.3, captura 1. Conflicto pendiente en «Sincronización»: el servidor tiene un dato distinto al del dispositivo.

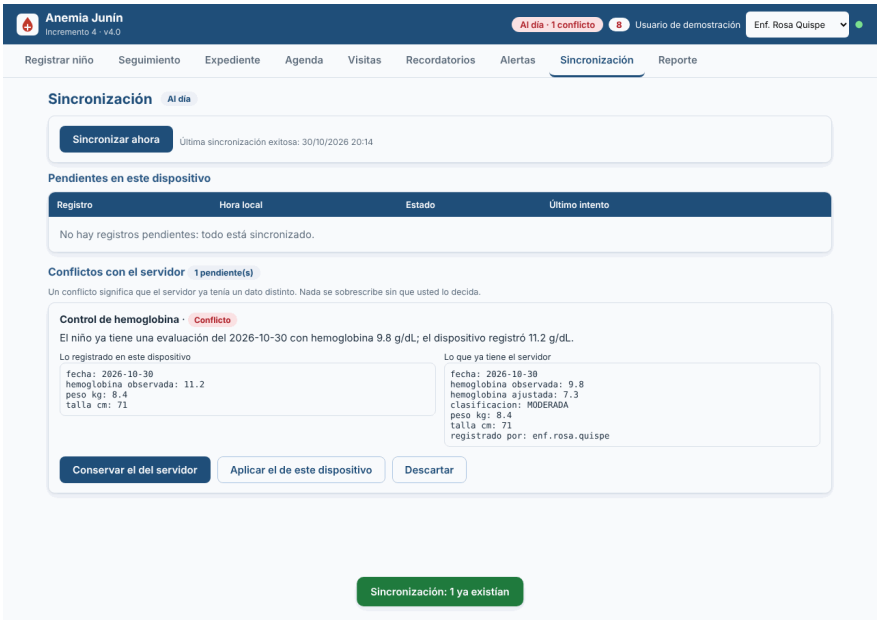


HIST-3.3, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST33_inc3_1_conflicto_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 63.** HIST-3.3, captura 2. Conflicto resuelto conservando el dato del servidor; aparece «sin conflictos».

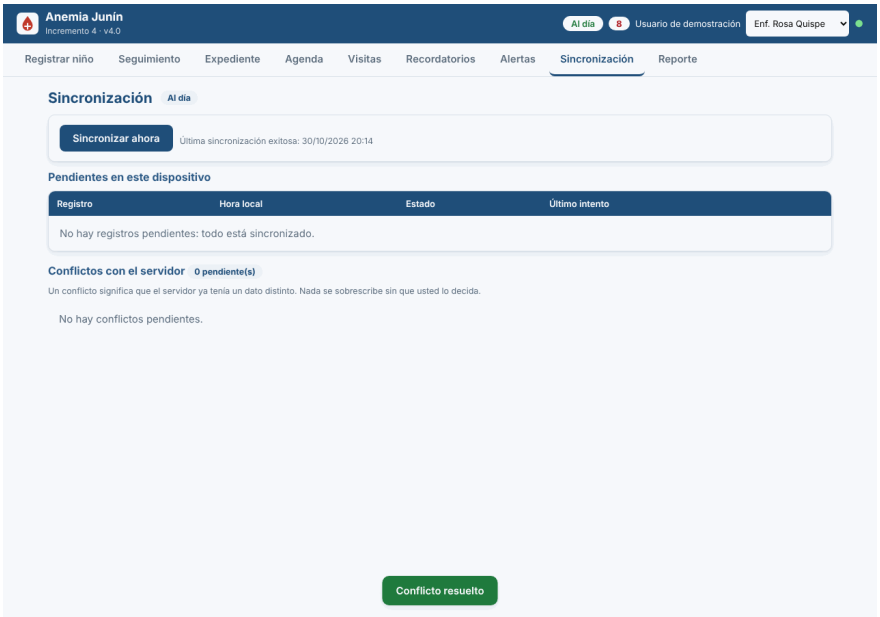

HIST-3.3, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST33_inc3_2_conflicto_resueltoescritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (HIST-3.4)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 3, etiqueta `v3.0-Inc3`
- **REQUERIMIENTO:** HIST-3.4 - Ver lo pendiente y desde cuándo; pestaña «Sincronización»
- **CASO DE PRUEBA:** CP-HIST34-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/e2e/test_inc3_sin_conexion.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** { dni: “72300004” } registrado sin conexión
- **RESULTADO ESPERADO:** Contador de pendientes y antigüedad visibles en la cabecera y en la pestaña «Sincronización».

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 64.** HIST-3.4, captura 1. Panel con «1 pendiente(s)» y desde cuándo, con el dispositivo sin conexión.

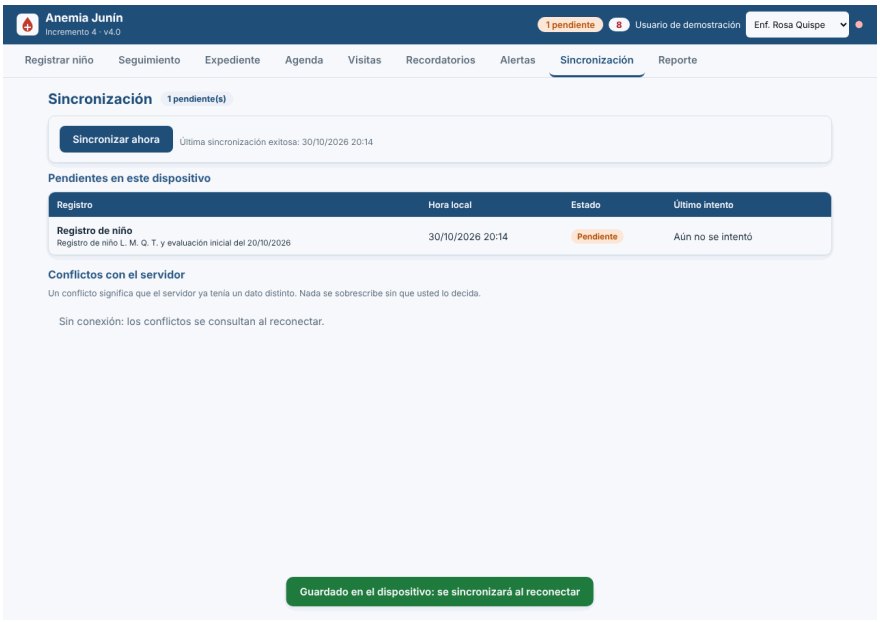


HIST-3.4, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST34_inc3_1_panel_pendientes_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 65.** HIST-3.4, captura 2. Tras reconectar y sincronizar, el panel queda «al día» sin pendientes.

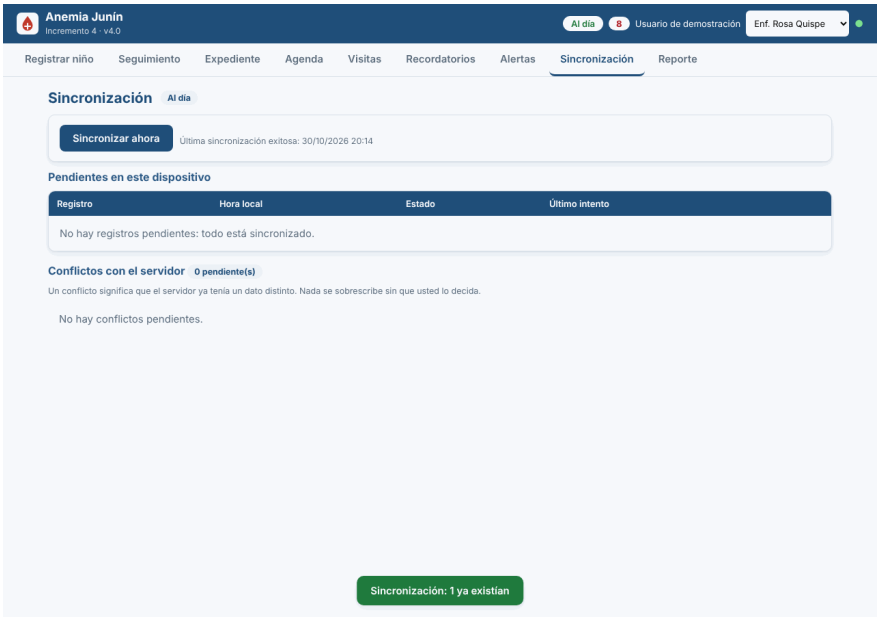

HIST-3.4, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST34_inc3_2_panel_al_dia_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (VIS-3.5)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 3, etiqueta `v3.0-Inc3`
- **REQUERIMIENTO:** VIS-3.5 - Visita domiciliaria priorizada (`GET /api/visitas/priorizadas`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-VIS35-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/unitarias/test_visitas.py` y `tests/integracion/test_api_inc3.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Base sintética con niños en tratamiento; visita registrada con { resultado: “REALIZADA”, suplemento: “SI”, observaciones: “Familia receptiva” }
- **RESULTADO ESPERADO:** Lista ordenada por puntaje explicable con desglose por componente; la visita se puede registrar.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 66.** VIS-3.5, captura 1. Pestaña «Visitas»: 18 filas ordenadas por puntaje de 49,5 a 25,0, con desglose por componente.

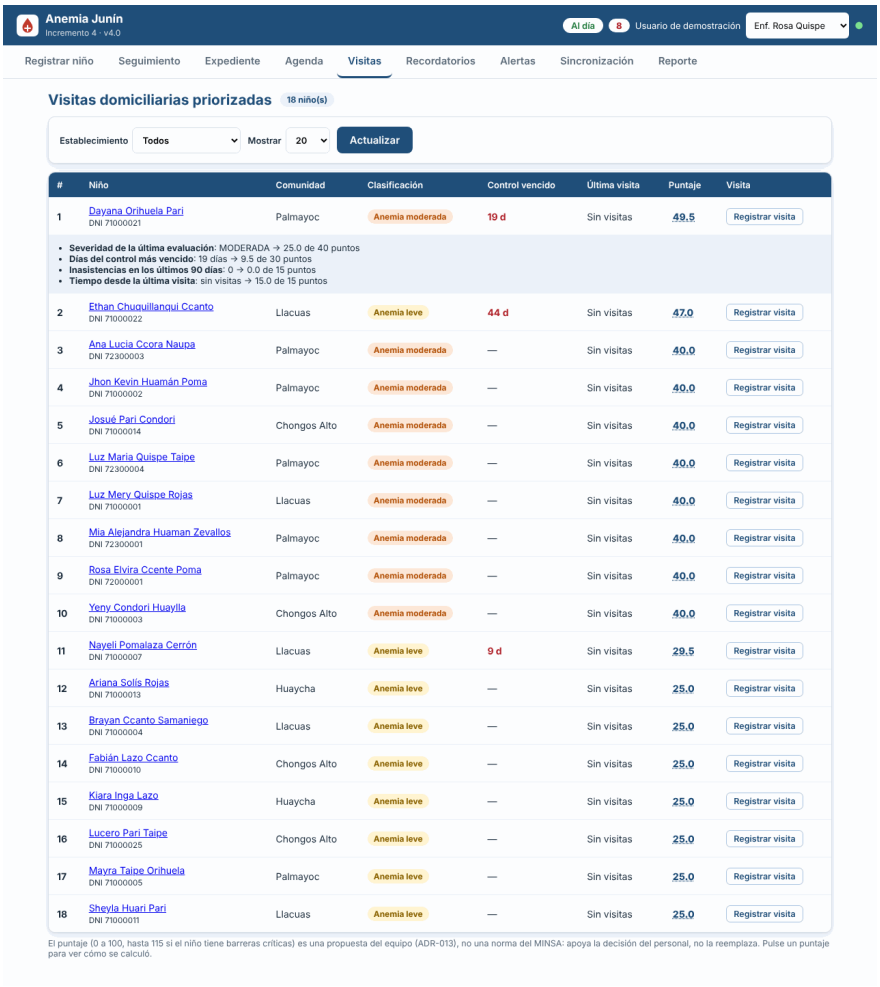


VIS-3.5, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/VIS35_inc3_1_visitas_desglose_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 67.** VIS-3.5, captura 2. Modal de registro de la visita con el resultado, el suplemento y las observaciones cargados; tras confirmar, el niño sale del primer lugar de la lista.

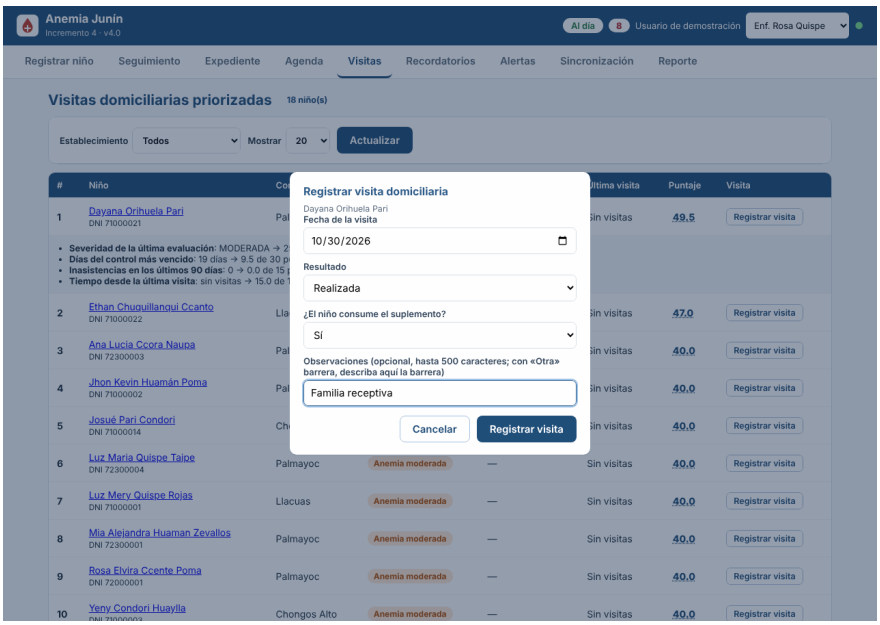

VIS-3.5, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/VIS35_inc3_2_modal_visita_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

Captura en producción (Incremento 3): la sincronización en un celular real (de «Pendiente de sincronizar» a «Al día») y la lista de visitas priorizadas en producción están en las Figuras 24, 25 y 23 (fichas GQM del apartado 3.6.1).


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (HIST-4.1)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 4, etiqueta `v4.0-Inc4`
- **REQUERIMIENTO:** HIST-4.1 - Recordatorio de control (SIMULADO) (`POST /api/recordatorios/generar`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-HIST41-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/unitarias/test_recordatorios.py` y `tests/integracion/test_api_inc4.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Base sintética con niños con control próximo o vencido; «Generar recordatorios de hoy» dos veces
- **RESULTADO ESPERADO:** Mensajes rotulados SIMULADO (sin envío real) y sin duplicados al repetir la generación.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 68.** HIST-4.1, captura 1. Pestaña «Recordatorios» antes de generar.

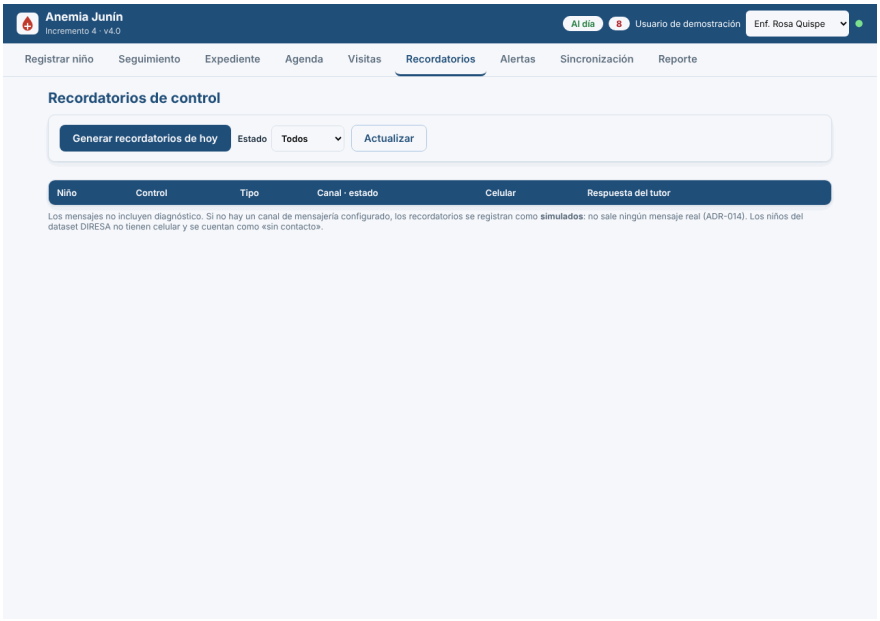


HIST-4.1, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST41_inc4_1_recordatorios_antes_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 69.** HIST-4.1, captura 2. 24 recordatorios rotulados SIMULADO («no se envió»); repetir la generación no duplica.

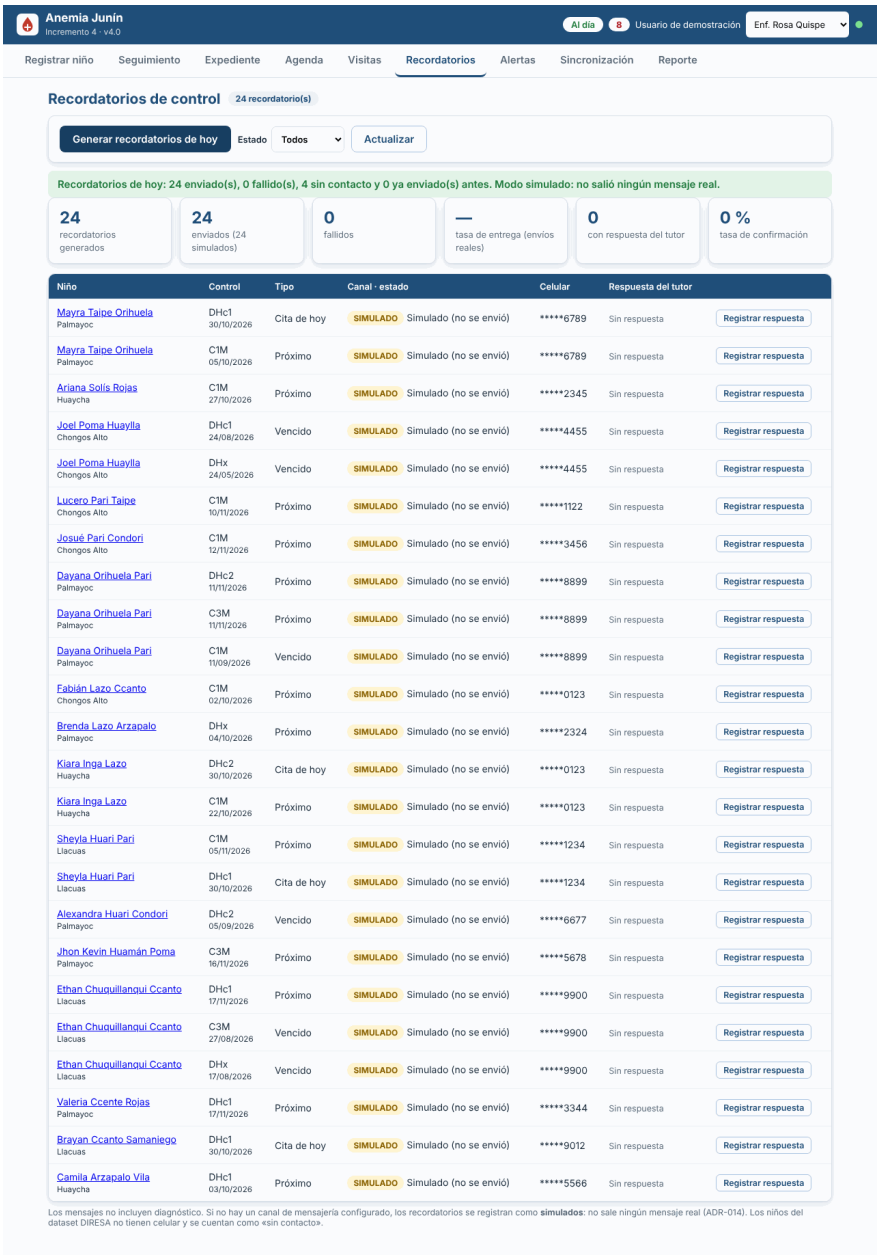

HIST-4.1, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST41_inc4_2_recordatorios_simulados_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

Pendiente: el envío real por WhatsApp o SMS no se ha probado. Depende de que Meta apruebe la plantilla `recordatorio_control`; hasta entonces los recordatorios se registran como SIMULADO (ADR-014).


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (HIST-4.2)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 4, etiqueta `v4.0-Inc4`
- **REQUERIMIENTO:** HIST-4.2 - Confirmación del tutor (personal y webhook firmado) (`POST /api/recordatorios/{id}/respuesta` y webhook de WhatsApp)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-HIST42-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/unitarias/test_recordatorios.py` y `tests/e2e/test_inc4_notificaciones.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Respuesta 1, 2 o 3 registrada por el personal («No puede asistir» con barrera); webhook con firma válida, ausente e inválida
- **RESULTADO ESPERADO:** Respuesta registrada; el webhook sin firma válida responde 403.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 70.** HIST-4.2, captura 1. Modal «Registrar respuesta» del tutor (1 confirmo, 2 no puedo, 3 reprogramar) con la opción cargada.

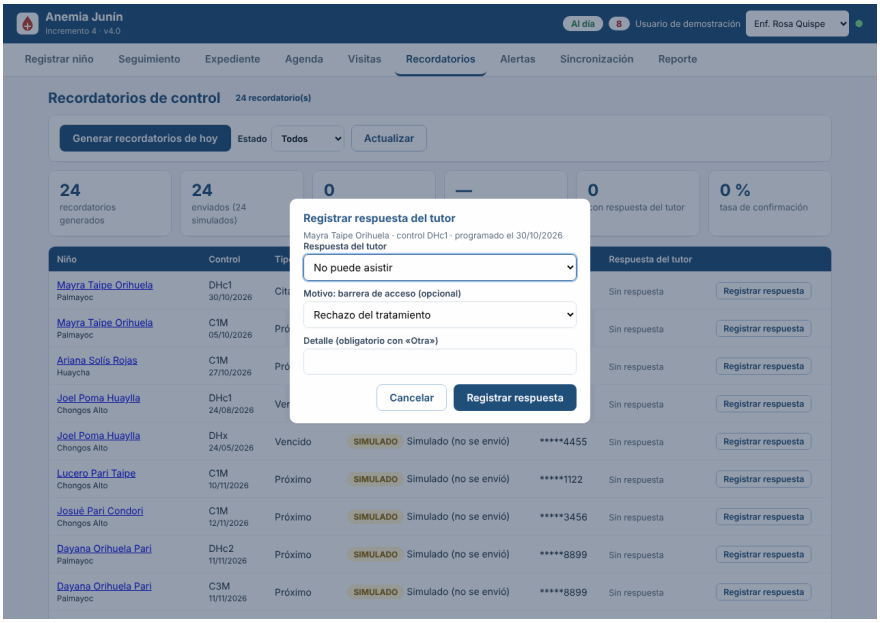


HIST-4.2, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST42_inc4_1_modal_respuesta_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 71.** HIST-4.2, captura 2. Respuesta «No puede asistir» registrada por el personal. El webhook sin firma o con firma inválida respondió 403 y con firma válida 200, pero en modo simulado el mensaje se ignora (sin canal real que asociar; `HIST42_inc4_3_tras_webhook_escritorio.png`).

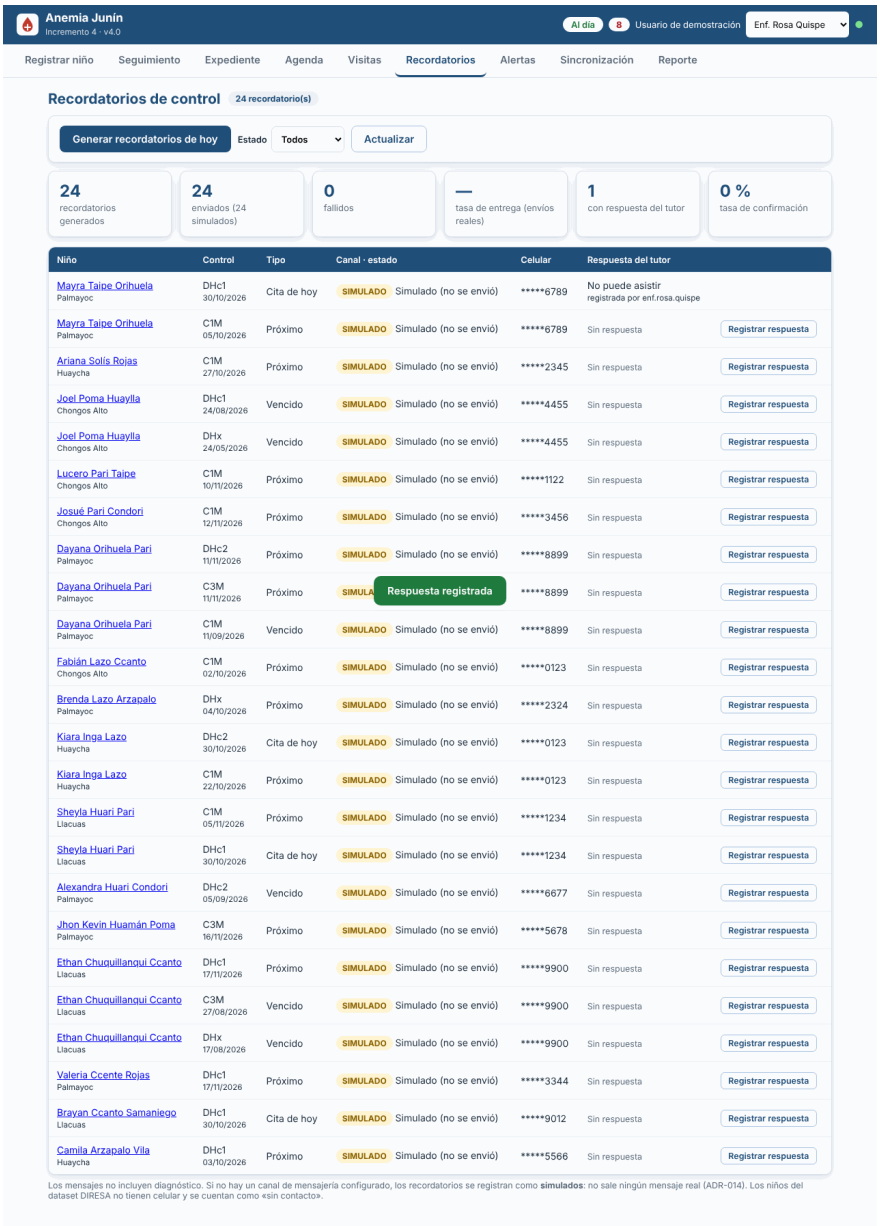

HIST-4.2, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST42_inc4_2_respuesta_registrada_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (HIST-4.3)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 4, etiqueta `v4.0-Inc4`
- **REQUERIMIENTO:** HIST-4.3 - Barreras de acceso al tratamiento (`POST/GET /api/ninos/{id}/barreras`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-HIST43-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/unitarias/test_barreras.py` y `tests/integracion/test_api_inc4.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Barrera «Falta de transporte» con detalle, registrada sin conexión
- **RESULTADO ESPERADO:** Barrera pendiente de sincronizar y, al volver la red, en el expediente.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 72.** HIST-4.3, captura 1. Modal «Registrar barrera» con el tipo y el detalle cargados.

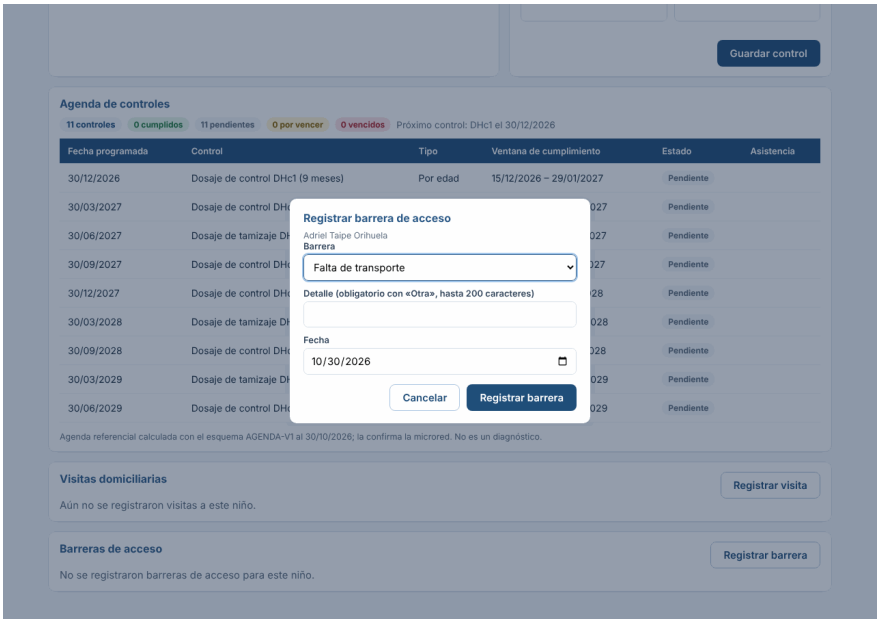


HIST-4.3, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST43_inc4_1_modal_barrera_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 73.** HIST-4.3, captura 2. Barrera sincronizada y visible en el expediente (antes de reconectar figuraba como pendiente: `HIST43_inc4_2_barrera_pendiente_sin_conexion_escritorio.png`).

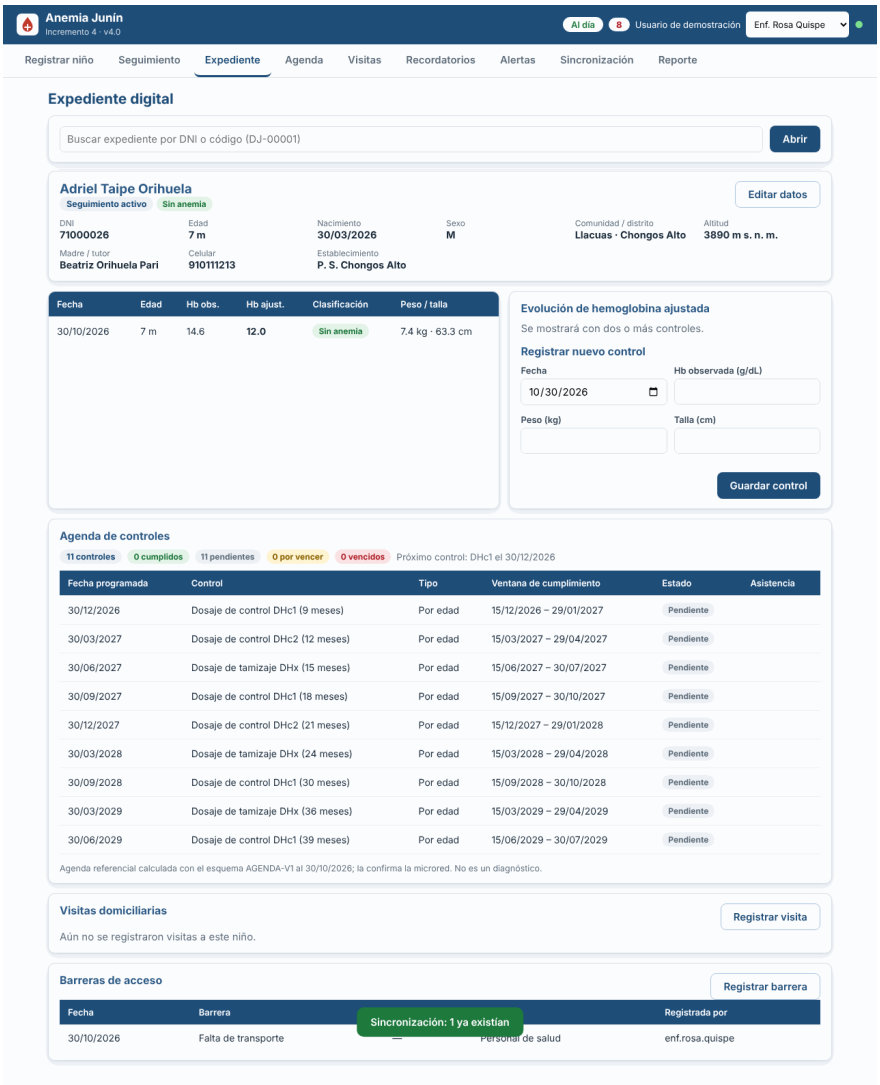

HIST-4.3, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST43_inc4_3_barrera_sincronizada_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)


FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (HIST-4.4)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Incremento 4, etiqueta `v4.0-Inc4`
- **REQUERIMIENTO:** HIST-4.4 - Alerta de barreras críticas y suma a la visita priorizada (`GET /api/alertas/barreras`)
- **CASO DE PRUEBA:** CP-HIST44-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/unitarias/test_barreras.py` y `tests/integracion/test_api_inc4.py`)
- **DATO DE ENTRADA:** Niño con barrera grave (rechazo del tratamiento o efectos adversos), o 2 o más barreras en 60 días
- **RESULTADO ESPERADO:** Alerta de prioridad ALTA y componente BARRERA_CRITICA en el puntaje de la visita.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 74.** HIST-4.4, captura 1. Pestaña «Alertas» con las alertas de barreras críticas.

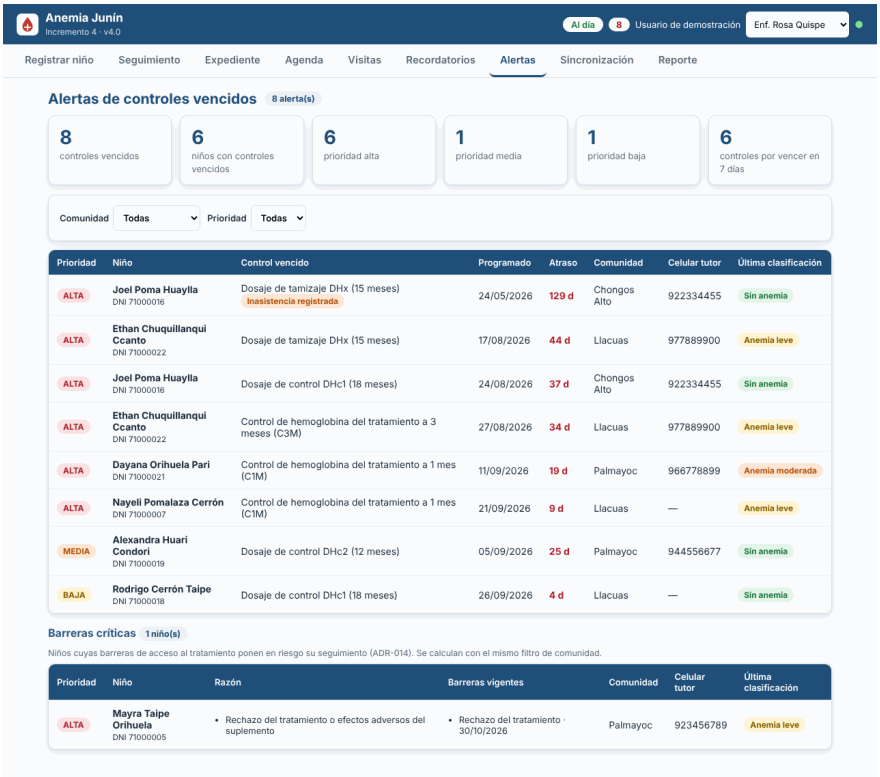


HIST-4.4, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST44_inc4_1_alertas_barreras_criticas_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 75.** HIST-4.4, captura 2. Visita priorizada con el componente BARRERA_CRITICA (40,0 puntos) y alerta ALTA.

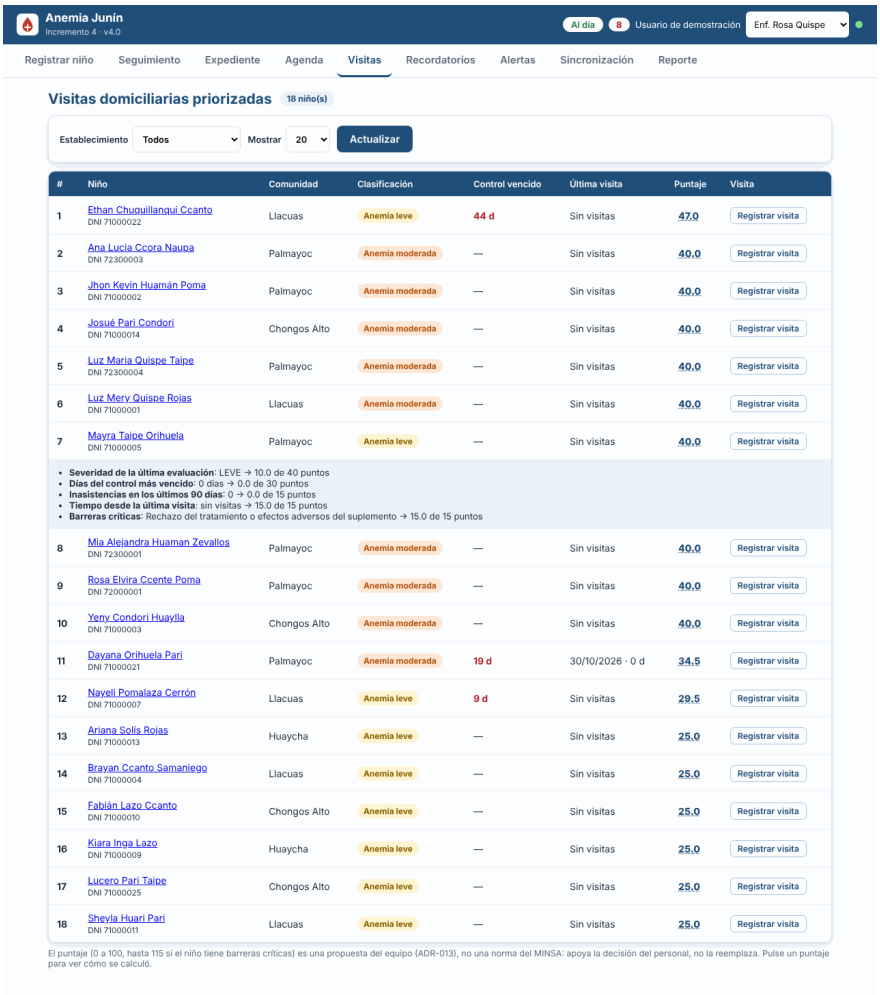

HIST-4.4, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/software/HIST44_inc4_2_visita_con_barrera_critica_escritorio.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

Captura en producción (Incremento 4): pendiente. Los recordatorios en producción siguen en modo SIMULADO hasta que Meta apruebe la plantilla de WhatsApp; la evidencia del flujo es la de esta ficha, tomada sobre `v4.0-Inc4` en local.

FICHA DE PRUEBA FUNCIONAL Y EVIDENCIA VISUAL POR REQUERIMIENTO (AUTH)

- **PROYECTO:** Anemia Junín - Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín
- **INCREMENTO EVALUADO:** Autenticación con Supabase Auth (ADR-011), incorporada antes del Incremento 3 y vigente en `v4.0-Inc4`
- **REQUERIMIENTO:** AUTH - Inicio y cierre de sesión; sesión en cookies HttpOnly con protección CSRF
- **CASO DE PRUEBA:** CP-AUTH-01 (Prueba Funcional de UI / Aceptación; automatizada en `tests/integracion/test_autenticacion.py` y `tests/e2e/test_login.py`, con Supabase simulado)
- **DATO DE ENTRADA:** { correo: “enfermeria@example.test”, contraseña: (valor ficticio de la prueba) }; credencial errónea; petición de la API sin sesión
- **RESULTADO ESPERADO:** Con una credencial válida, la sesión queda en cookies HttpOnly y se abre la aplicación; la API clínica rechaza (401) las peticiones sin sesión; cerrar la sesión la invalida; una credencial errónea muestra un mensaje de error.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (CAPTURAS DE PANTALLA EN EJECUCIÓN):

[CAPTURA 1: DATOS DE ENTRADA CARGADOS]

- **Descripción: Figura 76.** AUTH, captura 1. Pantalla de acceso con el correo y la contraseña de prueba cargados antes de «Iniciar sesión» (axe: 0 violaciones).




AUTH, captura 1.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/usabilidad/U_login_escritorio.png`

[CAPTURA 2: CONFIRMACIÓN / RESULTADO]

- **Descripción: Figura 77.** AUTH, captura 2. Acceso en móvil (390x844). No hay captura de la aplicación tras el ingreso: ese resultado se verificó por aserciones (aplicación visible, correo en la cabecera, sin token en `localStorage`, 27 de 27 operaciones no públicas con 401 sin sesión) y la prueba con una cuenta real de Supabase queda como captura en producción.

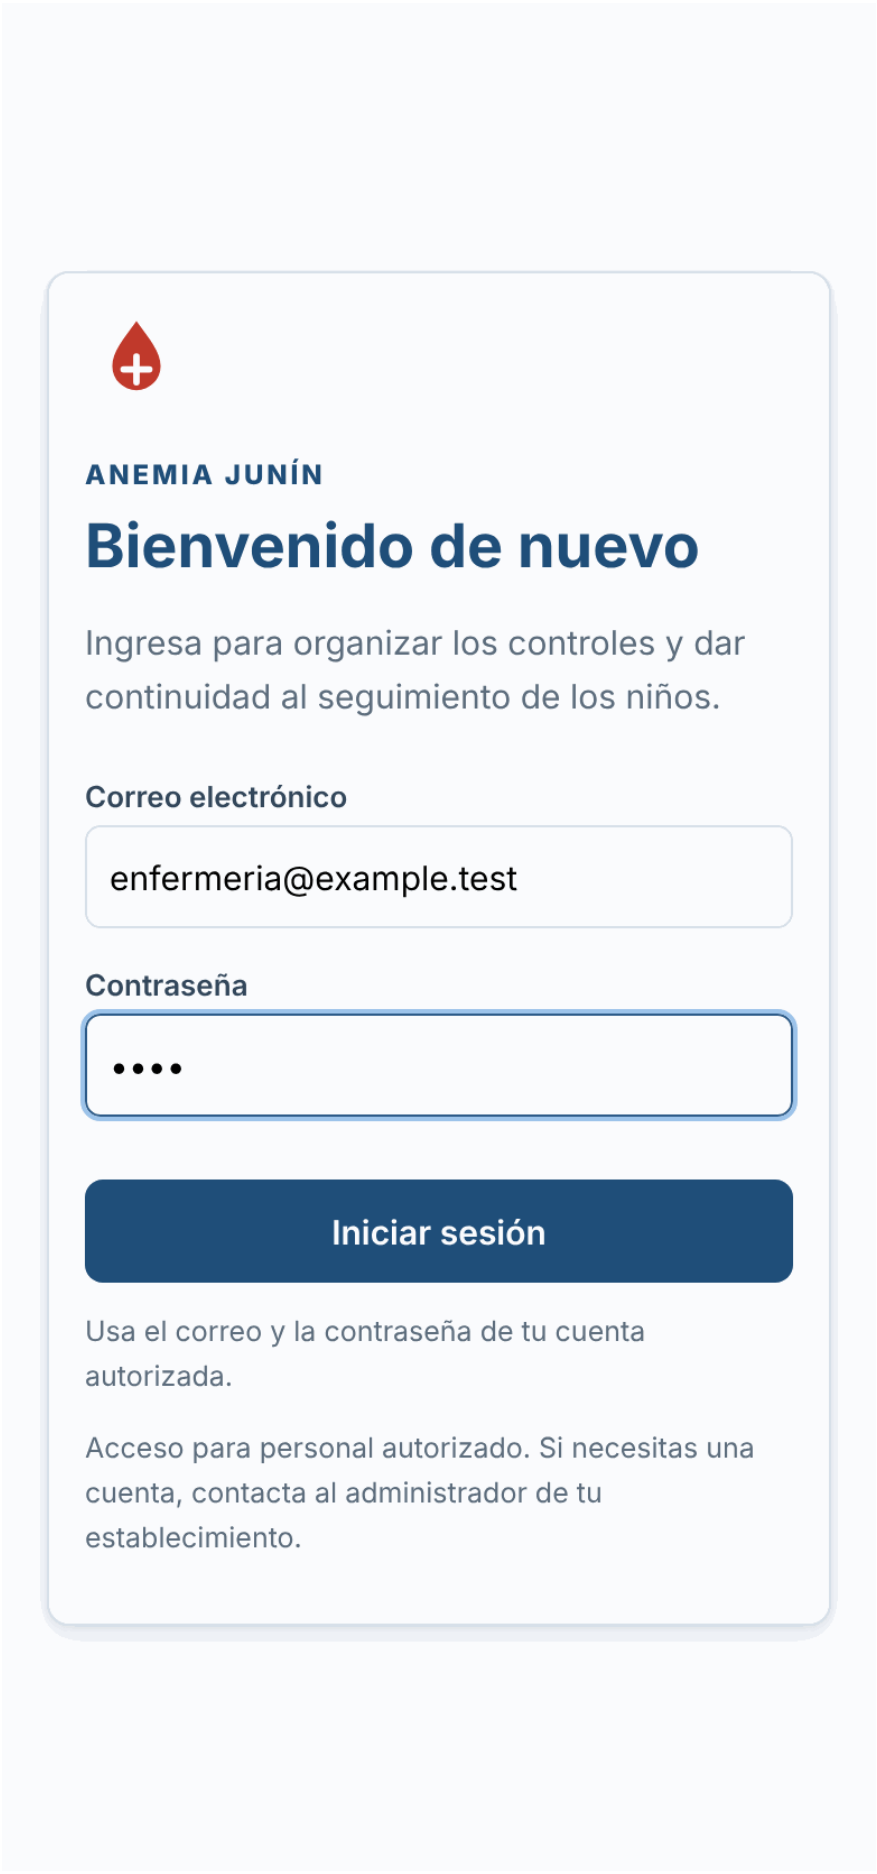
ANEMIA JUNÍN
Bienvenido de nuevo
Ingresa para organizar los controles y dar continuidad al seguimiento de los niños.
Correo electrónico
enfermeria@example.test
Contraseña
••••
Iniciar sesión
Usa el correo y la contraseña de tu cuenta autorizada.
Acceso para personal autorizado. Si necesitas una cuenta, contacta al administrador de tu establecimiento.

AUTH, captura 2.

- **Archivo de Imagen:** `../semana-10/evidencias/usabilidad/U_login_movil.png`

EVALUACIÓN: APROBADO | FECHA: 30/10/2026 | EVALUADOR: QA Lead (Huamani R.)

Nota de la evaluación: Verificado con Supabase simulado (21 pruebas de integración y 2 E2E en escritorio y móvil); validación parcial: no consta una prueba con una cuenta real de Supabase..

Captura en producción (autenticación): la pantalla de inicio de sesión en `softwareanemia.onrender.com` está en la Figura 113 (ficha VAL de la sección 3.8).

3.6.4 Estructura de directorios de la arquitectura hexagonal en GitHub

Este apartado documenta cómo está organizado el repositorio. La evidencia de que la arquitectura cumple las métricas M1.1 a M1.3 está en las fichas GQM del apartado 3.6.1 (código del dominio, matriz de importaciones y ejecución de las mediciones).

El código del producto está en `pmv_fastapi/app/` (https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia/tree/v4.0-Inc4/pmv_fastapi/app). La plantilla de la guía usa nombres de un proyecto Java (`/src/domain|ports|adapters`, JPA); aquí el lenguaje es Python y los puertos son interfaces estructurales (`typing.Protocol`). La Tabla 27 traduce cada carpeta de la plantilla a la del repositorio, con su enlace en la etiqueta `v4.0-Inc4`.


```
pmv_fastapi/app/
├── domain/        <-- NÚCLEO (solo biblioteca estándar y módulos del
propio dominio)
│   ├── model/     entidades y reglas puras (16 módulos)
│   └── service/   reglas clínicas, agenda, alertas, conflictos,
puntaje de visitas (11 módulos)
├── ports/         <-- PUERTOS (Protocol)
│   ├── inbound/   interfaces de casos de uso (14)
│   └── outbound/  repositorios, reloj, notificador, proveedor de
identidad (8)
├── application/   casos de uso que implementan los puertos de entrada
(12 servicios)
├── adapters/      <-- INFRAESTRUCTURA
│   ├── inbound/http/   FastAPI: rutas, esquemas Pydantic, sesión y
CSRF
│   └── outbound/       SQLAlchemy y memoria, WhatsApp Cloud, SMS,
simulado, Supabase Auth, relojes
├── web/           cliente PWA (JavaScript, service worker, cola
IndexedDB); fuera del hexágono
└── main.py        raíz de composición: único módulo que conecta
adaptadores con el núcleo
```

Tabla 27. Equivalencia entre la estructura de la plantilla y la del proyecto, con archivos y líneas de código por capa (S10, Tabla 17; análisis AST; el conteo incluye `__init__.py`).

Plantilla (`/src/...`)	Proyecto (`pmv_fastapi/app/...`)	Contenido real	Archivos / LOC	Enlace en `v4.0-Inc4`
`domain/model/`	`domain/model/`	Entidades puras: niño, evaluación, agenda, barrera, visita, notificación, sincronización	17 / 699	`domain/model`
`domain/service/`	`domain/service/`	Reglas clínicas, agenda, alertas, validaciones, conflictos, puntaje de visitas (funciones puras)	12 / 1 593	`domain/service`
`ports/inbound/`	`ports/inbound/`	14 interfaces de casos de uso	15 / 156	`ports/inbound`

Plantilla (`/src/...`)	Proyecto (`pmv_fastapi/app/...`)	Contenido real	Archivos / LOC	Enlace en `v4.0-Inc4`
`ports/outbound/`	`ports/outbound/`	8 interfaces: repositorios, reloj, notificador, proveedor de identidad	9 / 143	`ports/outbound`
(la plantilla no la contempla)	`application/`	12 servicios que implementan los puertos de entrada	13 / 1 227	`application`
`adapters/inbound/`	`adapters/inbound/http/`	FastAPI: rutas, esquemas Pydantic, sesión y CSRF	5 / 1 437	`adapters/inbound`
`adapters/outbound/`	`adapters/outbound/`	SQLAlchemy y memoria, WhatsApp Cloud, SMS, Supabase Auth, relojes	12 / 1 359	`adapters/outbound`
(composición)	`main.py`	Conecta cada puerto con su adaptador; versión `4.0.0-inc4`	1	`main.py`

Dos diferencias respecto de la plantilla: se usa SQLAlchemy y no JPA, y no hay Redis; el caché y la cola viven en el navegador (service worker e IndexedDB). La carpeta `application/` se agregó porque separa los casos de uso de las reglas puras del dominio (ADR-001 y ADR-008).

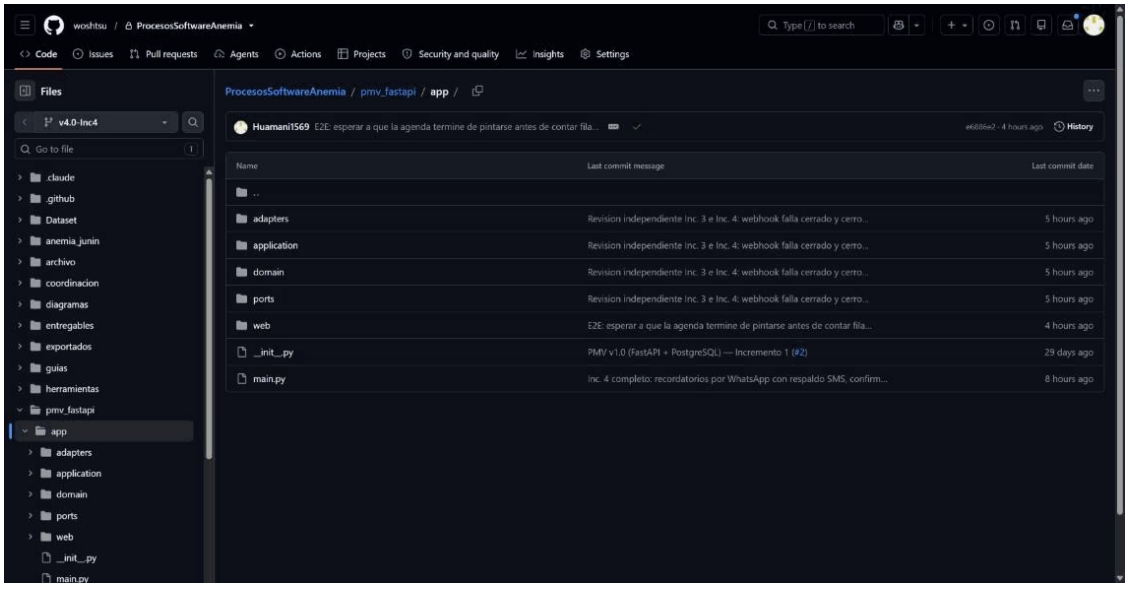

Estructura hexagonal de pmv_fastapi/app en GitHub, etiqueta v4.0-Inc4.


Figura 78. Carpeta `pmv_fastapi/app/` en GitHub con la etiqueta `v4.0-Inc4` seleccionada: `adapters`, `application`, `domain`, `ports` y `web`, y `main.py` (captura del 30/10/2026).

Estructura real de carpetas de la capa hexagonal (pmv_fastapi/app)

```
pmv_fastapi/app/
├── adapters/  (12 archivos .py)
│   ├── inbound/  (3 archivos .py)
│   │   └── http/  (3 archivos .py)
│   │       ├── api.py
│   │       ├── autenticacion.py
│   │       └── esquemas.py
│   └── outbound/  (9 archivos .py)
│       ├── notificaciones/  (4 archivos .py)
│       │   ├── respaldo.py
│       │   ├── simulado.py
│       │   ├── sms.py
│       │   └── whatsapp_cloud.py
│       ├── persistence/  (2 archivos .py)
│       │   ├── memoria.py
│       │   └── sqlalchemy_repo.py
│       ├── reloj_fijo.py
│       ├── reloj_sistema.py
│       └── supabase_auth.py
├── application/  (12 archivos .py)
│   ├── servicio_agenda.py
│   ├── servicio_agenda_personal.py
│   ├── servicio_alertas.py
│   ├── servicio_asistencia.py
│   ├── servicio_barreras.py
│   ├── servicio_contexto.py
│   ├── servicio_expediente.py
│   ├── servicio_importacion.py
│   ├── servicio_recordatorios.py
│   ├── servicio_sesion.py
│   ├── servicio_sincronizacion.py
│   └── servicio_visitas.py
├── domain/  (27 archivos .py)
│   ├── model/  (16 archivos .py)
│   │   ├── agenda.py
│   │   ├── agenda_personal.py
│   │   ├── alertas.py
│   │   ├── asistencia.py
│   │   ├── autenticacion.py
│   │   ├── barrera.py
│   │   ├── clasificacion.py
│   │   ├── contexto.py
│   │   ├── entidades.py
│   │   ├── errores.py
│   │   ├── importacion.py
│   │   ├── notificacion.py
│   │   ├── origen.py
│   │   ├── sincronizacion.py
│   │   ├── tiempo.py
│   │   └── visita.py
│   └── service/  (11 archivos .py)
│       ├── agenda.py
│       ├── agenda_personal.py
│       ├── alertas.py
│       ├── asistencia.py
│       ├── barreras.py
│       ├── conflictos.py
│       ├── notificaciones.py
│       ├── operaciones.py
│       ├── reglas_clinicas.py
│       ├── validaciones.py
│       └── visitas.py
├── ports/  (22 archivos .py)
│   ├── inbound/  (14 archivos .py)
│   │   ├── agenda.py
│   │   ├── agenda_personal.py
│   │   ├── alertas.py
│   │   ├── asistencia.py
│   │   ├── barreras.py
│   │   ├── contexto.py
│   │   ├── expediente.py
│   │   ├── importacion.py
│   │   ├── notificaciones.py
│   │   ├── reportes.py
│   │   ├── seguimiento.py
│   │   ├── sesiones.py
│   │   ├── sincronizacion.py
│   │   └── visitas.py
│   └── outbound/  (8 archivos .py)
│       ├── notificador.py
│       ├── proveedor_identidad.py
│       ├── reloj.py
│       ├── repositorio_barreras.py
│       ├── repositorio_ninos.py
│       ├── repositorio_recordatorios.py
│       ├── repositorio_sincronizacion.py
```


Árbol real de carpetas de la capa hexagonal.

Figura 79. Árbol real de `pmv_fastapi/app/` generado recorriendo el sistema de archivos.

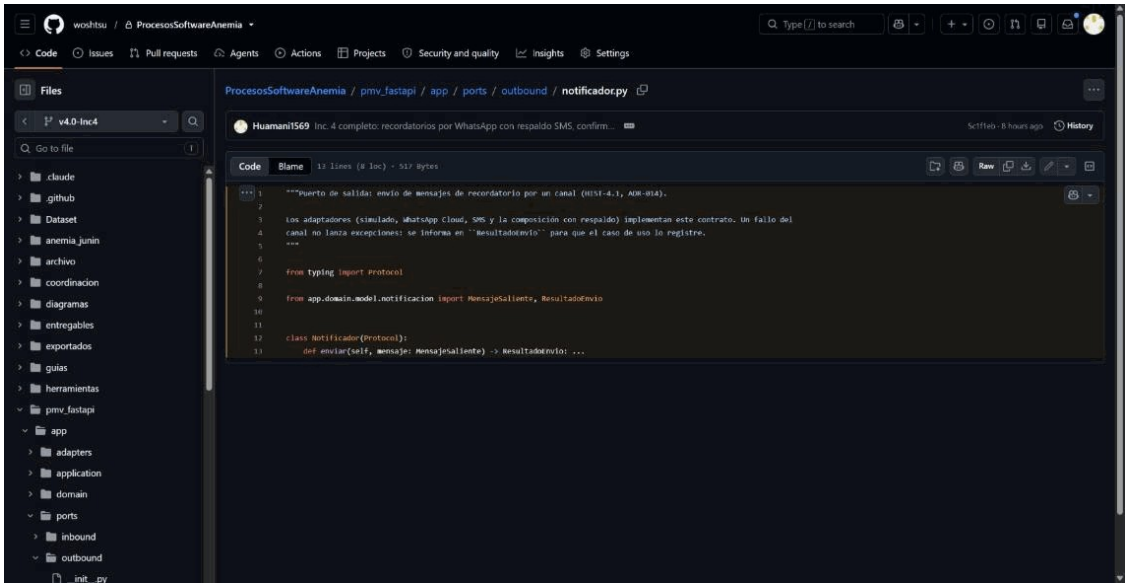

Puerto de salida Notificador en GitHub.

Figura 80. Ejemplo de puerto de salida (`Notificador`), implementado por cuatro adaptadores (simulado, WhatsApp Cloud, SMS y respaldo).

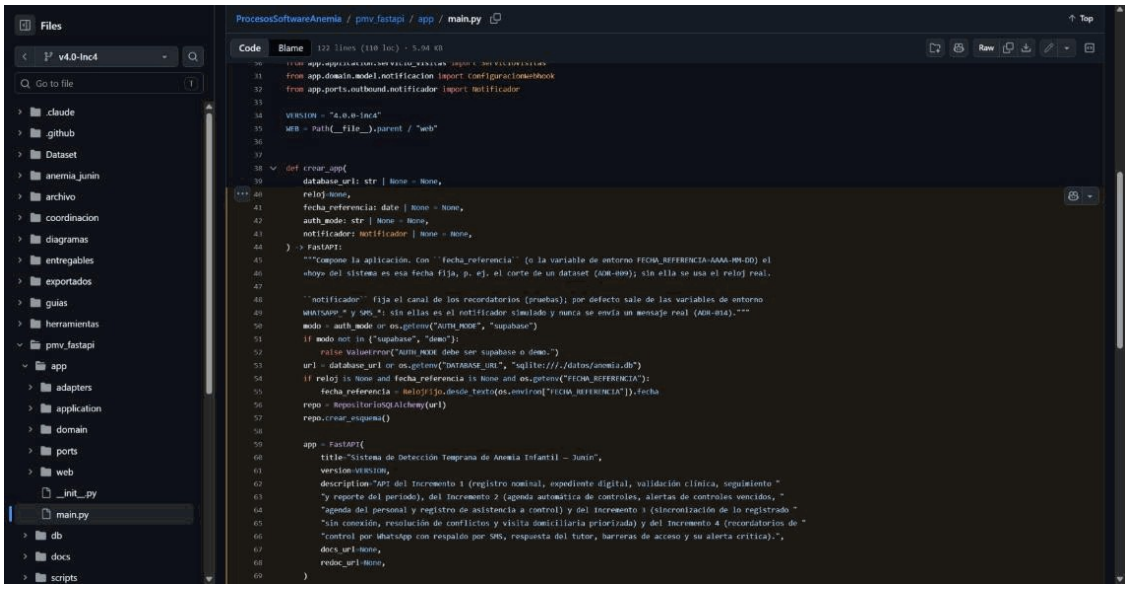


main.py como raíz de composición en GitHub.

Figura 81. `main.py` como única raíz de composición (GitHub, `v4.0-Inc4`).

Tabla 28. Matriz de dependencias entre capas (conteo de importaciones; S10, Tabla 18). Ninguna importación prohibida.

Capa (origen)	stdlib	terceros	dominio	puertos	application	adaptadores
`domain` (model y service)	63	**0**	67	0	0	0

Capa (origen)	stdlib	terceros	dominio	puertos	application	adaptadores
`ports` (inbound y outbound)	32	**0**	20	0	0	0
`application`	14	**0**	63	48	0	0
`adapters.inbound`	7	8 (`fastapi`, `pydantic`)	12	13	0	1
`adapters.outbound`	14	7 (`httpx`, `sqlalchemy`)	24	15	0	4

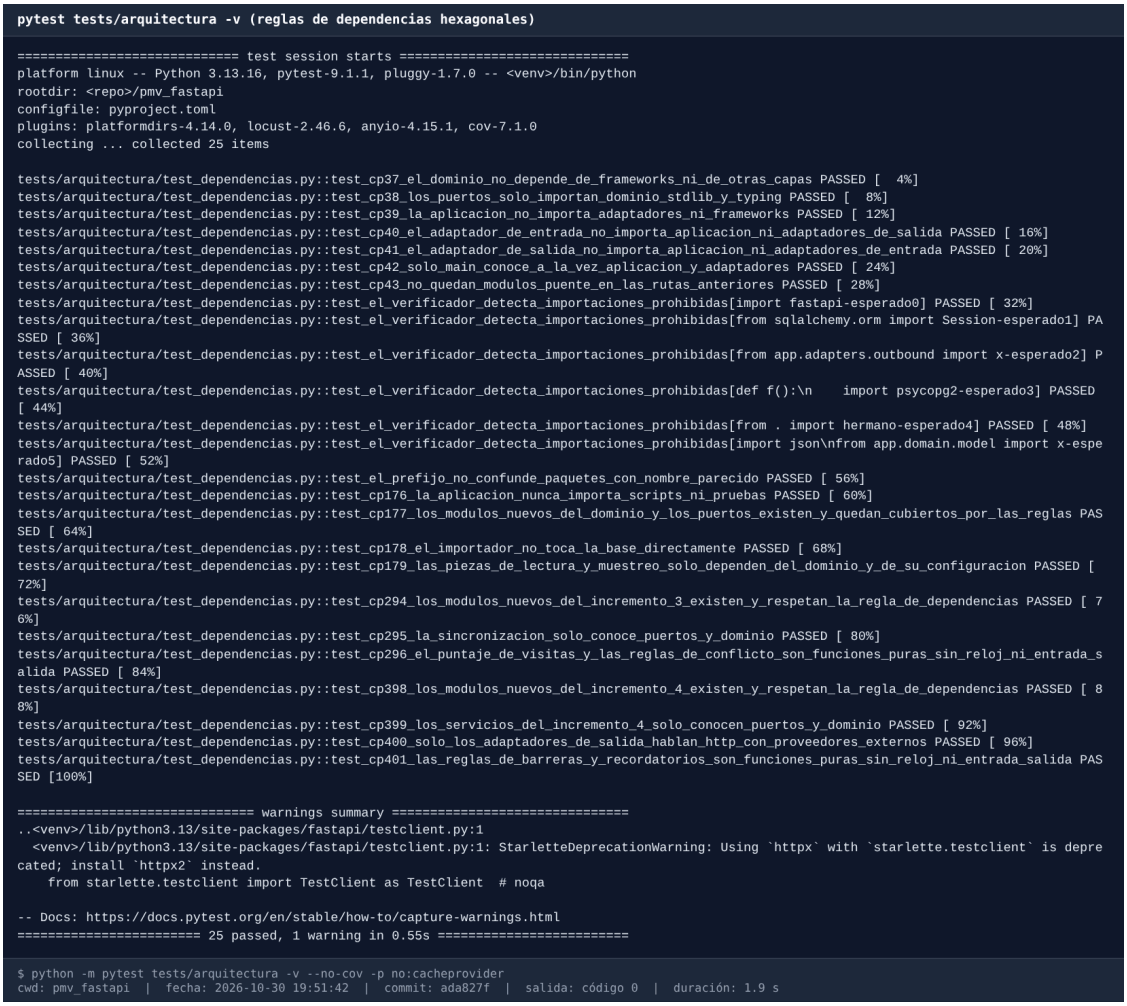

25 pruebas de arquitectura aprobadas.

Figura 82. Las 25 pruebas de arquitectura (`tests/arquitectura`) validan la regla de dependencia en cada ejecución del CI: todas aprobadas.

Tres hallazgos honestos de la auditoría: (1) la conformidad **ultra estricta** de M1.2 es 80 % porque `application/servicio_sesion.py` implementa el puerto `ProveedorIdentidad` dentro de la capa de aplicación (adenda S9, sección 7); (2) `autenticacion.py` (94 %) y `supabase_auth.py` (97 %) explican por qué la cobertura bajó de 100 % a 99,79 %; (3) el diagrama C4 de componentes del repositorio describe solo el Incremento 1 y no se actualizó.


3.7 EJE 7: Evaluación FURPS+, Psicología de Colores, WCAG 2.1 y OWASP 2025

3.7.1 Índice de calidad FURPS+

El índice pondera F 30 %, U 15 %, R 15 %, P 15 %, S 10 % y + 15 %. Se calculó con 30 de 35 criterios, medidos por scripts (`entregables/semana-10/metricas/`); cinco no se pudieron medir (lector de pantalla, staging, 500 usuarios, Docker en ejecución y política de contraseñas de Supabase). El índice primario excluye lo no medido y el conservador lo cuenta como 0 %.

Tabla 29. Índice FURPS+ por factor (S10, Tabla 5).

Factor	Peso	Criterios medidos	% solo medidos	% conservador	Brecha principal
F Funcionalidad	30 %	3 de 3	100,0 %	100,0 %	Ninguna; datos sintéticos, sin usuarios reales
U Usabilidad	15 %	7 de 8	82,7 %	72,4 %	Contraste de componentes (3 de 8), etiquetas ARIA, foco en modales
R Confiabilidad	15 %	6 de 7	84,0 %	72,0 %	La caída de la base de datos responde 500 en vez de 503
P Rendimiento	15 %	4 de 5	85,0 %	68,0 %	p95 de 2 000 ms con 100 usuarios
S Soportabilidad	10 %	6 de 6	99,0 %	99,0 %	23 de 669 bloques con complejidad mayor que 10
+ Seguridad y restricciones	15 %	4 de 6	66,8 %	44,5 %	41 de 61 comprobaciones OWASP; 1 hallazgo de severidad alta
IC_P	**100 %**		**87,67 %**	**78,43 %**	Por debajo de «Excelente (≥ 90 %)»

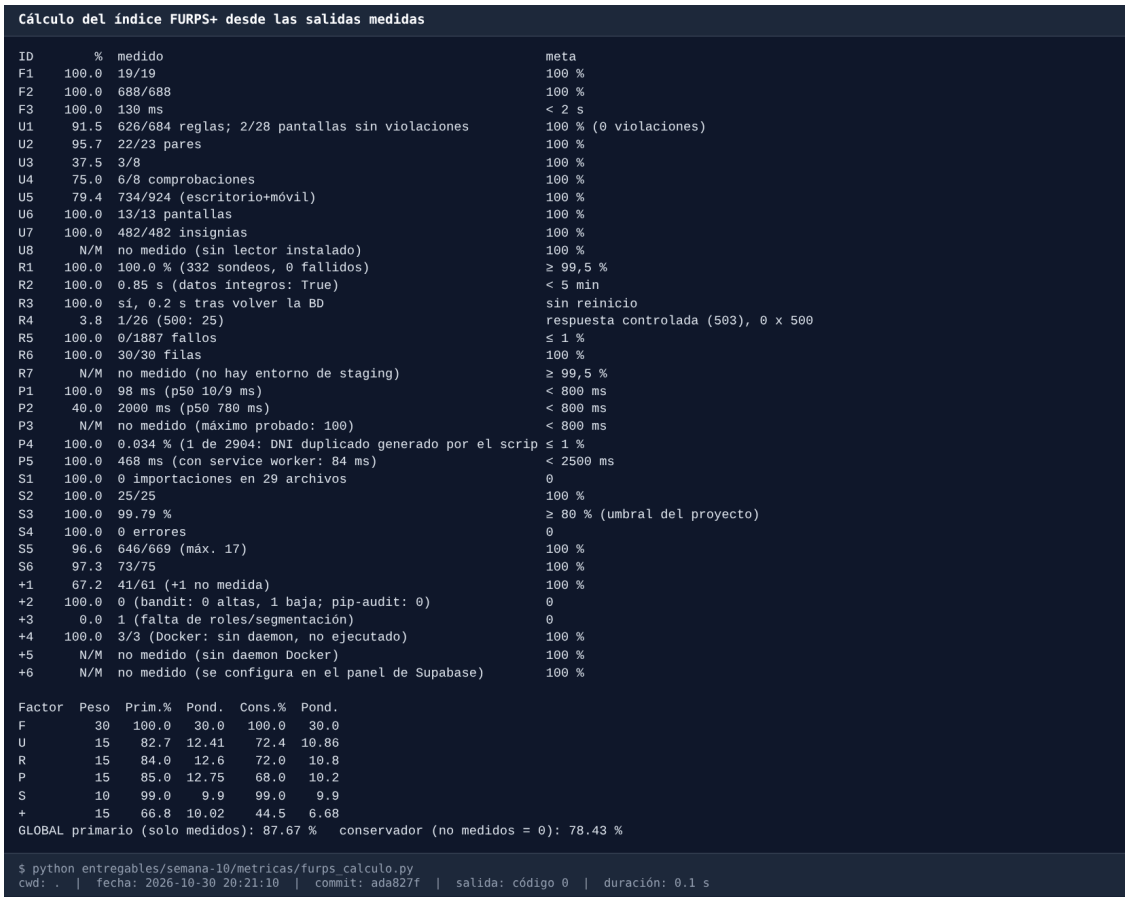

Salida del cálculo del índice FURPS+.

Figura 83. Salida de `furps_calculo.py` con el índice primario y el conservador (pie con comando, fecha y commit).

La diferencia de 9,24 puntos entre ambos índices cuantifica cuánto de la calidad declarada depende de mediciones que faltan.

3.7.2 Factor U: psicología de colores y accesibilidad WCAG 2.1 AA


Los criterios evaluados son los de las pautas WCAG 2.1, nivel AA [17].

Tabla 30. Paleta real de la interfaz (`pmv_fastapi/app/web/estilos.css`), significado en salud infantil y contraste medido (S10, Tabla 9).

Rol	Hexadecimal	Significado	Contraste
Primario	`#1F4E79` (azul)	Confianza y calma clínica con datos de salud	8,66:1 sobre blanco
Éxito, sin anemia	`#1F7A3D` (verde)	Control cumplido, estado seguro	5,37:1 sobre blanco
Precaución, leve	`#8A6200` (ámbar)	Atención sin urgencia	5,49:1 sobre blanco
Advertencia, moderada	`#B4530B` (naranja)	Riesgo creciente, pendiente de sincronizar	5,02:1 sobre blanco; **4,23:1 sobre su fondo suave (no cumple 4,5:1)**
Alerta, severa	`#B0222B` (rojo)	Acción inmediata: control	6,75:1 sobre blanco

Rol	Hexadecimal	Significado	Contraste
		vencido, prioridad alta, conflicto	

De 54 pares texto y fondo medidos (23 combinaciones únicas), solo el naranja sobre su fondo suave incumple 1.4.3. El semáforo se codifica además con texto en las 482 insignias de estado evaluadas, de modo que el color no es el único canal (1.4.1).

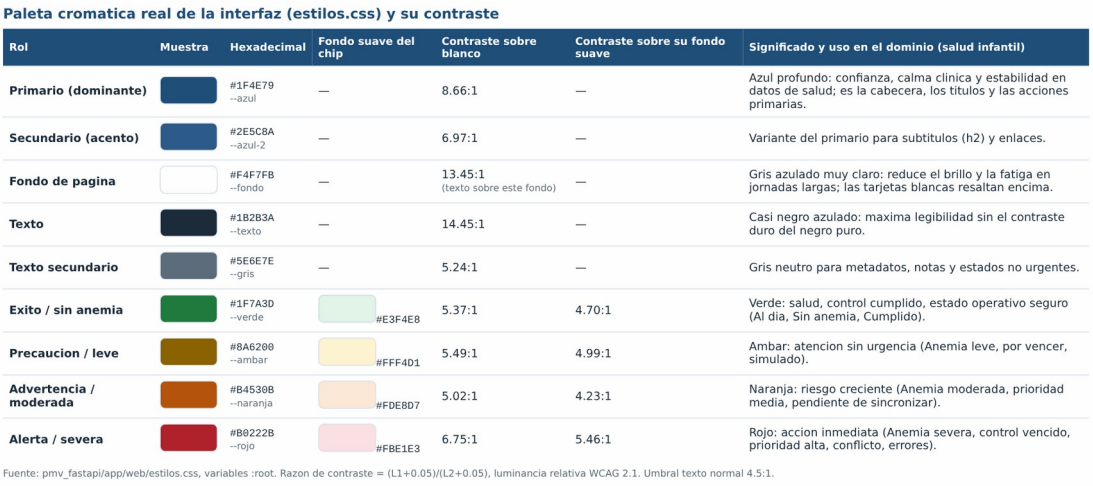


Paleta cromatica real de la interfaz (estilos.css) y su contraste

Rol	Muestra	Hexadecimal	Fondo suave del chip	Contraste sobre blanco	Contraste sobre su fondo suave	Significado y uso en el dominio (salud infantil)
Primario (dominante)		#1F4E79 --azul	—	8.66:1	—	Azul profundo: confianza, calma clinica y estabilidad en datos de salud; es la cabecera, los titulos y las acciones primarias.
Secundario (acento)		#2E5C8A --azul-2	—	6.97:1	—	Variante del primario para subtitulos (h2) y enlaces.
Fondo de pagina		#F4F7FB --fondo	—	13.45:1 (texto sobre este fondo)	—	Gris azulado muy claro: reduce el brillo y la fatiga en jornadas largas; las tarjetas blancas resaltan encima.
Texto		#1B2B3A --texto	—	14.45:1	—	Casi negro azulado: maxima legibilidad sin el contraste duro del negro puro.
Texto secundario		#5E6E7E --gris	—	5.24:1	—	Gris neutro para metadatos, notas y estados no urgentes.
Exito / sin anemia		#1F7A3D --verde	#E3F4E8	5.37:1	4.70:1	Verde: salud, control cumplido, estado operativo seguro (Al dia, Sin anemia, Cumplido).
Precaucion / leve		#8A6200 --ambar	#FFF4D1	5.49:1	4.99:1	Ambar: atencion sin urgencia (Anemia leve, por vencer, simulado).
Advertencia / moderada		#B4530B --naranja	#FDE8D7	5.02:1	4.23:1	Naranja: riesgo creciente (Anemia moderada, prioridad media, pendiente de sincronizar).
Alerta / severa		#B0222B --rojo	#FBE1E3	6.75:1	5.46:1	Rojo: accion inmediata (Anemia severa, control vencido, prioridad alta, conflicto, errores).

Fuente: pmv_fastapi/app/web/estilos.css, variables :root. Razon de contraste = (L1+0.05)/(L2+0.05), luminancia relativa WCAG 2.1. Umbral texto normal 4.5:1.

Paleta real de la interfaz.

Figura 84. Paleta real con muestras, hexadecimales, contraste y significado.

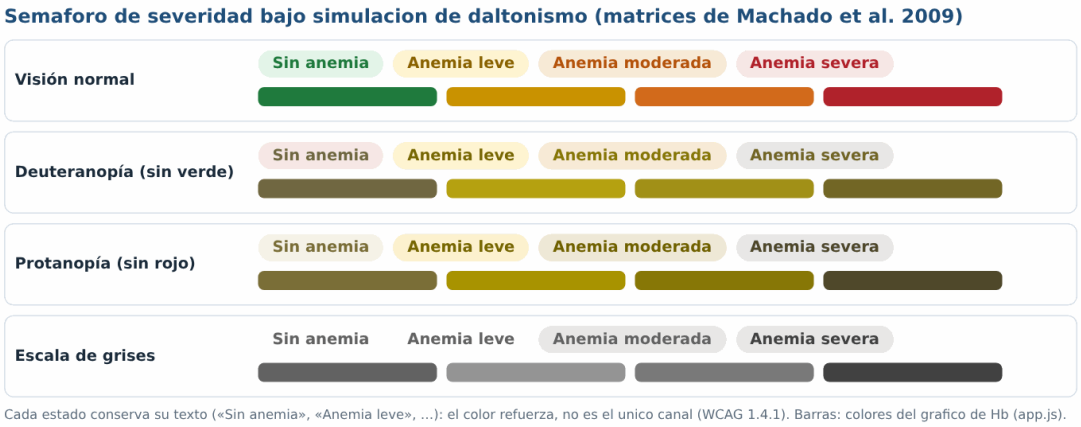

Semáforo de severidad con simulación de daltonismo.

Figura 85. Semáforo de severidad bajo simulación de deuteranopía, protanopía y escala de grises: los tonos moderada y severa se acercan, por eso el texto de cada estado acompaña siempre al color.

Tabla 31. Criterios WCAG evaluados con axe-core 4.14.0, Playwright y cálculo propio (S10, Tabla 11).

Criterio	Resultado medido	Estado
1.4.3 Contraste de texto (≥ 4,5:1)	22 de 23 pares únicos cumplen (mínimo 4,23:1)	Parcial

Criterio	Resultado medido	Estado
1.4.11 Contraste no textual (≥ 3:1)	3 de 8 componentes: borde de campo 1,33:1, foco 1,84:1, barras «leve» 2,46:1 y «no aplica» 2,58:1 incumplen	No cumple
1.4.1 Uso del color	482 de 482 insignias con texto	Cumple
1.4.10 Reflujo a 320 px	13 de 13 pantallas sin desplazamiento horizontal	Cumple
1.3.1 y 4.1.2 Estructura, nombre y rol	`nav role="tablist"` con botones sin `role="tab"` en 13 de 14 pantallas; selects y fechas sin etiqueta	No cumple
2.1.1 Teclado	Tab recorre 29 elementos; el modal abre con Enter y cierra con Esc; 3 regiones con desplazamiento no alcanzables por teclado en móvil	Parcial
2.4.3 y 2.4.7 Foco	Todos los elementos muestran foco, pero el modal no lo retiene (Tab escapa 10 de 14 veces)	Parcial
2.5.8 Tamaño del objetivo (WCAG 2.2, 24 px)	734 de 924 objetivos cumplen	Parcial
4.1.2 Lectores de pantalla (NVDA, TalkBack)	**No medido**: no había lector en el entorno	No medido

axe-core halló 22 reglas violadas (52 nodos) en escritorio y 36 (68 nodos) en móvil; solo la pantalla de inicio de sesión no tiene violaciones. Los hallazgos U-1 a U-8 de S10 (`role="tab"`, etiquetas de filtros, naranja `#B4530B` a `#A34A09`, bordes y foco, retención de foco del modal, regiones con desplazamiento, objetivos de 24 px y `role="status"` en avisos) están calculados pero **no aplicados** en el código (acción 18 del plan de mejora). El contraste de 7,1:1 y la compatibilidad total con lectores de pantalla que ejemplifica la plantilla no se afirman: el primario mide 8,66:1, pero la accesibilidad completa no se cumple.

axe-core por pantalla: violaciones WCAG 2.1 A/AA

Pantalla	Escritorio 1366x768	Movil 390x844	Reglas violadas (axe-core 4.14.0, wcag2a/2aa/21a/21aa)
Registrar niño	1 reglas / 1 nodos	2 reglas / 2 nodos	aria-required-children, select-name
Seguimiento	3 reglas / 7 nodos	4 reglas / 9 nodos	aria-required-children, color-contrast, scrollable-region-focusable, select-name
Expediente	2 reglas / 5 nodos	3 reglas / 6 nodos	aria-required-children, label, select-name
Agenda	2 reglas / 12 nodos	3 reglas / 13 nodos	aria-required-children, color-contrast, select-name
Visitas	2 reglas / 5 nodos	3 reglas / 6 nodos	aria-required-children, color-contrast, select-name
Recordatorios	1 reglas / 1 nodos	2 reglas / 2 nodos	aria-required-children, select-name
Alertas	2 reglas / 3 nodos	4 reglas / 6 nodos	aria-required-children, color-contrast, scrollable-region-focusable, select-name
Sincronización	1 reglas / 1 nodos	2 reglas / 2 nodos	aria-required-children, select-name
Reporte	1 reglas / 1 nodos	2 reglas / 2 nodos	aria-required-children, select-name
Modal asistencia	2 reglas / 5 nodos	3 reglas / 6 nodos	aria-required-children, label, select-name
Modal visita	2 reglas / 5 nodos	3 reglas / 6 nodos	aria-required-children, color-contrast, select-name
Modal respuesta del tutor	1 reglas / 1 nodos	2 reglas / 2 nodos	aria-required-children, select-name
Modal barrera	2 reglas / 5 nodos	3 reglas / 6 nodos	aria-required-children, label, select-name
Inicio de sesión	0 reglas / 0 nodos	0 reglas / 0 nodos	-

Generado con metricas/accesibilidad.py y metricas/graficos.py | fecha: 2026-10-30 20:19:52 | commit: ada827f

Resumen de axe-core por pantalla y vista.

Figura 86. Resumen de axe-core por pantalla y vista (14 pantallas, 4 modales y el inicio de sesión).



Foco visible al recorrer las pestañas con Tab.


Figura 87. Foco visible al recorrer las pestañas con Tab.

3.7.3 Factores R y P: confiabilidad y rendimiento

Las mediciones son de una máquina virtual con un proceso uvicorn y datos sintéticos; sirven para detectar brechas, no como capacidad de producción.

Tabla 32. Confiabilidad y rendimiento medidos (S10, Tablas 14 y 15; adenda S9, nota 4).

Atributo	Meta	Valor medido	Estado
Disponibilidad durante la carga	≥ 99,5 %	100 % (332 sondeos, 0 fallidos)	Cumple
MTTR tras `kill -9`	< 5 min	0,85 s (reinicio manual)	Cumple
Reconexión a la base tras caer (`pool_pre_ping`)	Sin reiniciar la aplicación	Respondió 200 a los 0,2 s	Cumple
Respuesta durante la caída de la base	Controlada (503)	25 de 26 peticiones respondieron 500	**No cumple**
Lecturas sin servidor (service worker)	100 %	30 de 30 filas desde el caché	Cumple
p95 con 20 usuarios (Inc. 1 y 2; Inc. 3 y 4)	< 800 ms	29 ms; 98 ms	Cumple
p95 con 100 usuarios (Inc. 1 y 2)	< 800 ms	2 000 ms (p50 780 ms)	**No cumple**
p95 con 50 usuarios, `v4.0-Inc4` (adenda S9)	< 800 ms	1 100 ms (una corrida, sin control)	**No cumple**
p95 con 500 usuarios	< 800 ms	No medido (máximo probado: 100)	No medido
LCP de la PWA en móvil lento	< 2 500 ms	468 ms (84 ms con service worker)	Cumple
Disponibilidad en staging (Render)	≥ 99,5 %	No medido en S10: no existía un entorno de staging	No medido

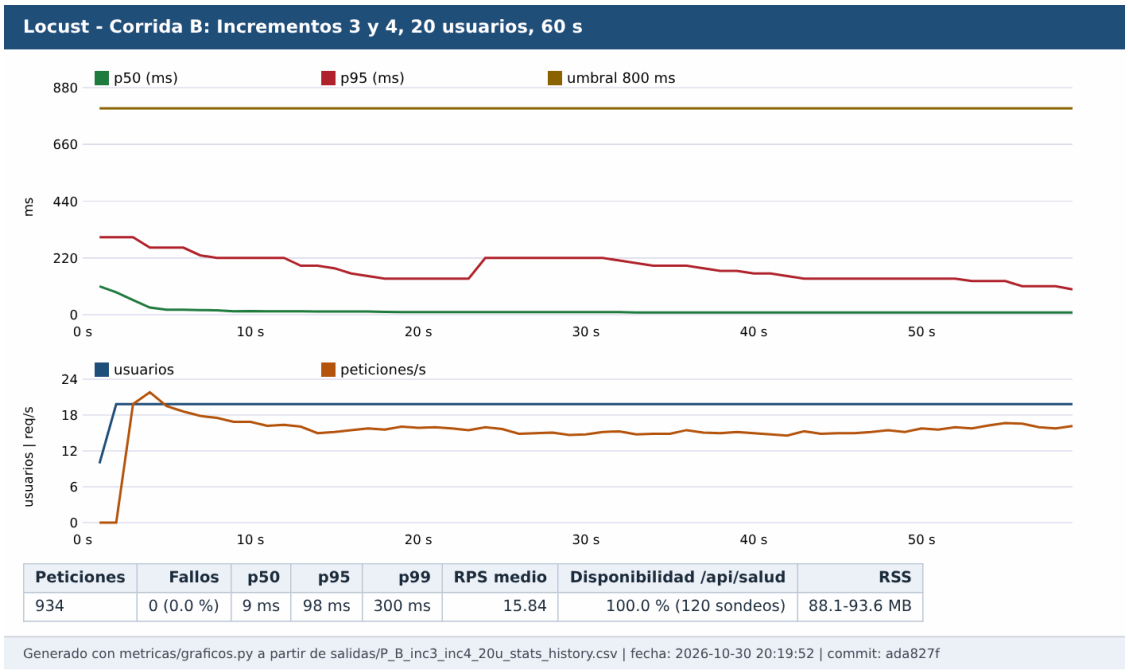


Peticiones	Fallos	p50	p95	p99	RPS medio	Disponibilidad /api/salud	RSS
934	0 (0.0 %)	9 ms	98 ms	300 ms	15.84	100.0 % (120 sondeos)	88.1-93.6 MB

Generado con metricas/graficos.py a partir de salidas/P_B_inc3_inc4_20u_stats_history.csv | fecha: 2026-10-30 20:19:52 | commit: ada827f

Locust con 20 usuarios, Inc. 3 y 4.

Figura 88. Locust, 20 usuarios, 60 s, incrementos 3 y 4 (sincronización, visitas y recordatorios): p95 de 98 ms.

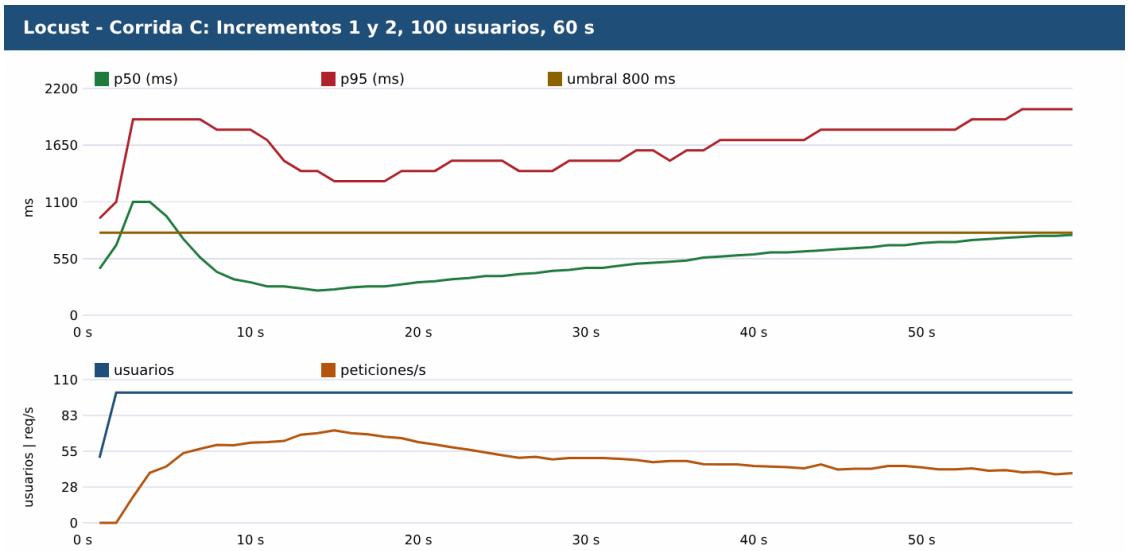

Peticiones	Fallos	p50	p95	p99	RPS medio	Disponibilidad /api/salud	RSS
2904	1 (0.034 %)	780 ms	2000 ms	2600 ms	49.29	100.0 % (91 sondeos)	93.6-117.8 MB

Generado con metricas/graficos.py a partir de salidas/P_C_inc1_inc2_100u_stats_history.csv | fecha: 2026-10-30 20:19:52 | commit: ada827f

Locust con 100 usuarios, Inc. 1 y 2.

Figura 89. Locust, 100 usuarios, 60 s, incrementos 1 y 2: p95 de 2 000 ms, por encima del umbral de 800 ms.



Prueba de caos con PostgreSQL.

Figura 90. Caos con PostgreSQL 16 temporal: 25 de 26 peticiones respondieron 500 durante la caída y la aplicación se recuperó a los 0,2 s.

La causa probable del aumento del p95 con la carga es un único proceso con una base compartida; no se perfiló el código. La adenda de S9 no pudo repetir `v1.0` en la misma sesión como control, de modo que no se sabe si el aumento de 815 a 1 100 ms viene del código nuevo, de la autenticación o de la máquina. **El p95 es el riesgo de rendimiento abierto del producto** (acción 16 del plan de mejora).

3.7.4 Factor +: auditoría de seguridad OWASP Top 10:2025

La auditoría combinó 30 comprobaciones estáticas (16 cumplen, 13 hallazgos, 1 no medida), 32 pruebas dinámicas contra un servidor local con Supabase simulado (25 cumplen, 7 hallazgos), una prueba de XSS con cuatro cargas en seis pantallas y SAST y SCA con bandit, pip-audit y semgrep. No se ejecutó OWASP ZAP ni se probó un proyecto de Supabase real. La edición 2025 reordenó la lista de la plantilla (SSRF pasó a A01 y apareció A10); se evalúa la lista 2025 [18].

Tabla 33. Estado por categoría OWASP Top 10:2025 en `v4.0-Inc4` (S10, Tabla 21).

Código	Categoría	Estado	Mecanismo implementado	Hallazgo abierto
A01	Broken Access Control	**Parcial**	Sesión obligatoria en toda ruta `/api` salvo las públicas (27 de 27 operaciones no públicas responden 401 sin sesión); CSRF con `X-CSRF-Protection` y comprobación de `Origin`	H-1: sin roles ni segmentación por establecimiento
A02	Security Misconfiguration	**No mitigado**	`Cache-Control: no-store`, `.env` ignorado por Git, imagen con usuario no root	H-2: 0 de 6 cabeceras de seguridad; H-8; H-9
A03	Software Supply Chain	**Parcial**	5 de 5 dependencias de	H-7: el CI no ejecuta


Código	Categoría	Estado	Mecanismo implementado	Hallazgo abierto
	Failures		producción con versión exacta; pip-audit sin vulnerabilidades	SAST ni auditoría de dependencias
A04	Cryptographic Failures	**Mitigado** (en código)	No se guardan contraseñas (Supabase Auth); HMAC-SHA256 con comparación en tiempo constante; cookies `Secure`	TLS y cifrado en reposo del proveedor no medidos
A05	Injection	**Parcial**	SQLAlchemy con parámetros (0 SQL concatenado); `esc()` en el cliente; XSS dinámico sin ejecución en 6 de 6 pantallas	H-3: inyección de fórmulas en el CSV; H-10
A06	Insecure Design	**Parcial**	Arquitectura hexagonal con 25 pruebas; 14 ADR; cerrojos de concurrencia; webhook que falla cerrado	H-4: sin limitación de tasa; H-11: sin modelo de amenazas
A07	Authentication Failures	**Parcial**	Mensaje de login genérico; cookie `HttpOnly`, `SameSite=Strict`, `Secure`; cierre de sesión borra cookies	H-4 (15 intentos fallidos sin bloqueo propio); H-12: política de contraseñas y MFA no medidas
A08	Software or Data Integrity Failures	**Parcial**	Webhook de WhatsApp con firma HMAC-SHA256 siempre exigida (403 sin firma o inválida; 503 sin secreto)	H-7: la imagen no se firma ni tiene atestaciones
A09	Security Logging and Alerting Failures	**No mitigado**	Cada registro guarda su autor verificado	H-5: 0 usos de logging; sin registro de logins fallidos ni alertas
A10	Mishandling of Exceptional Conditions	**Parcial**	11 manejadores de errores de dominio (409, 422, 403, 503, 404); JSON malformado devuelve 422 sin traza	H-6: sin manejador global; caída de la base responde 500

Controles de la plantilla que el proyecto no tiene. La plantilla ejemplifica RBAC con tokens JWT validados en cada petición, cifrado AES-256 en reposo y hash Argon2id. El proyecto valida la sesión de Supabase en cada petición, pero no distingue roles (H-1); no cifra datos en el código (el cifrado en reposo es el del proveedor y no se midió); y no guarda contraseñas, de modo que no usa Argon2id: la autenticación se delega a Supabase Auth. Los controles de inyección (consultas con parámetros), diseño (arquitectura hexagonal) y configuración (secretos fuera del código) sí existen y figuran en la tabla.

Resumen: 1 categoría mitigada, 7 parciales y 2 no mitigadas. Las protecciones de sesión y CSRF solo operan con `AUTH_MODE=supabase` (valor por defecto); con `demo` la API es pública, modo que existe solo para pruebas y capturas.


Tabla 34. Análisis estático y de dependencias (S10, Tablas 22 y 23).

Herramienta	Resultado	Lectura
bandit	Alta 0, Media 0, Baja 1 (6 723 líneas)	La baja (B107, parámetro con valor vacío por defecto) es un falso positivo
pip-audit	Sin vulnerabilidades conocidas en 5 dependencias de producción	Al 30/10/2026
semgrep (reglas locales; el registro estaba bloqueado)	151 hallazgos en 97 archivos	125 corresponden al patrón `innerHTML` mitigado con `esc()`; 13 son falsos positivos de decoradores; 12 son calidad; 1 verdadero positivo (CSV, coincide con H-3)

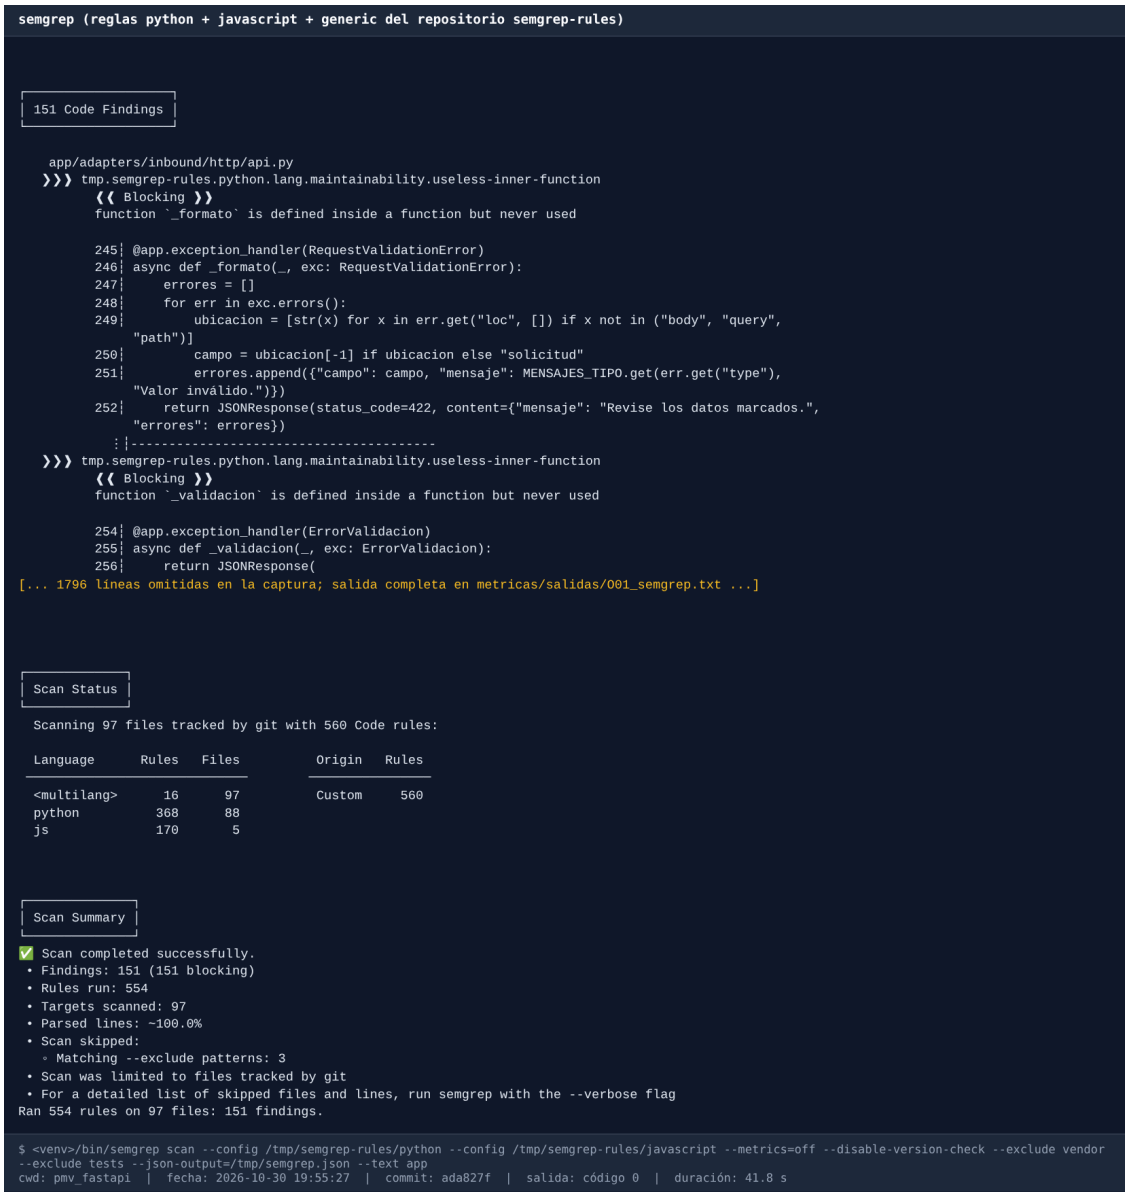

semgrep: 554 reglas sobre 97 archivos.

Figura 91. semgrep: 554 reglas sobre 97 archivos, 151 hallazgos clasificados manualmente.

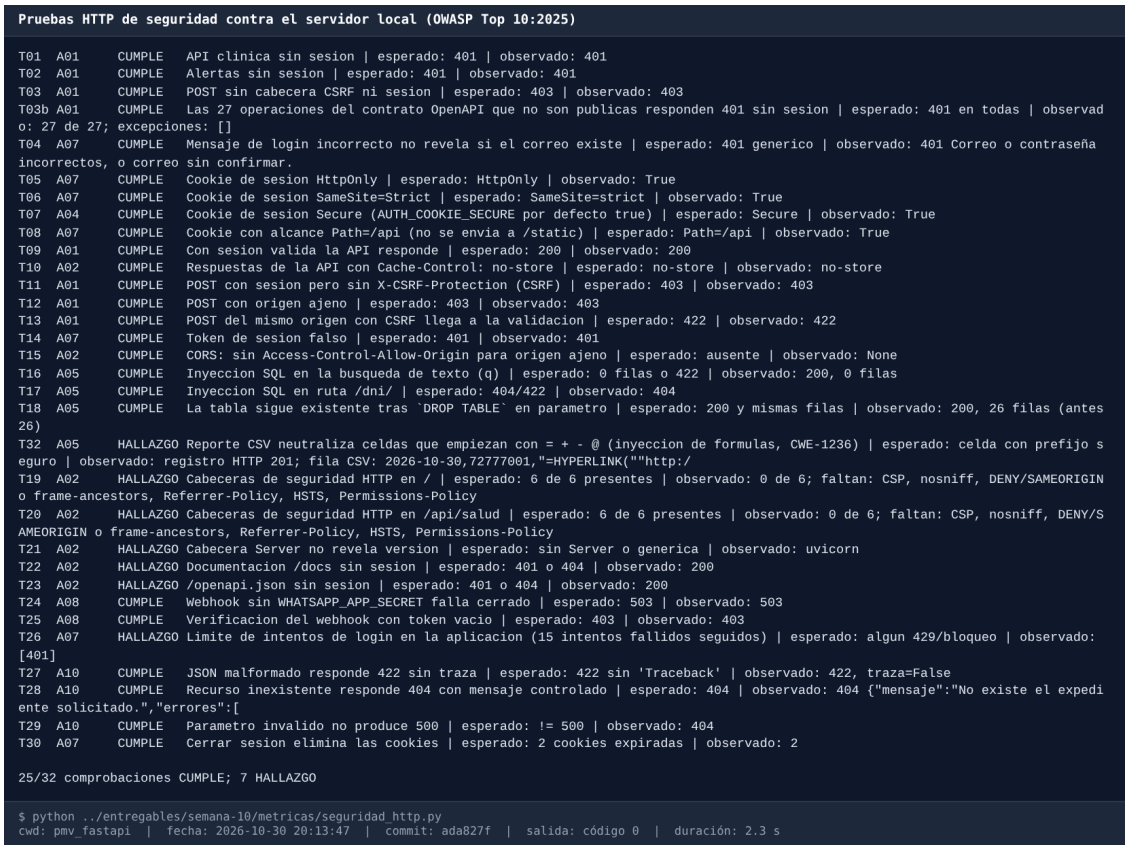

```
Pruebas HTTP de seguridad contra el servidor local (OWASP Top 10:2025)


T01  A01     CUMPLE   API clinica sin sesion | esperado: 401 | observado: 401
T02  A01     CUMPLE   Alertas sin sesion | esperado: 401 | observado: 401
T03  A01     CUMPLE   POST sin cabecera CSRF ni sesion | esperado: 403 | observado: 403
T03b A01     CUMPLE   Las 27 operaciones del contrato OpenAPI que no son publicas responden 401 sin sesion | esperado: 401 en todas | observad
o: 27 de 27; excepciones: []
T04  A07     CUMPLE   Mensaje de login incorrecto no revela si el correo existe | esperado: 401 generico | observado: 401 Correo o contraseña
incorrectos, o correo sin confirmar.
T05  A07     CUMPLE   Cookie de sesion HttpOnly | esperado: HttpOnly | observado: True
T06  A07     CUMPLE   Cookie de sesion SameSite=Strict | esperado: SameSite=strict | observado: True
T07  A04     CUMPLE   Cookie de sesion Secure (AUTH_COOKIE_SECURE por defecto true) | esperado: Secure | observado: True
T08  A07     CUMPLE   Cookie con alcance Path=/api (no se envia a /static) | esperado: Path=/api | observado: True
T09  A01     CUMPLE   Con sesion valida la API responde | esperado: 200 | observado: 200
T10  A02     CUMPLE   Respuestas de la API con Cache-Control: no-store | esperado: no-store | observado: no-store
T11  A01     CUMPLE   POST con sesion pero sin X-CSRF-Protection (CSRF) | esperado: 403 | observado: 403
T12  A01     CUMPLE   POST con origen ajeno | esperado: 403 | observado: 403
T13  A01     CUMPLE   POST del mismo origen con CSRF llega a la validacion | esperado: 422 | observado: 422
T14  A07     CUMPLE   Token de sesion falso | esperado: 401 | observado: 401
T15  A02     CUMPLE   CORS: sin Access-Control-Allow-Origin para origen ajeno | esperado: ausente | observado: None
T16  A05     CUMPLE   Inyeccion SQL en la busqueda de texto (q) | esperado: 0 filas o 422 | observado: 200, 0 filas
T17  A05     CUMPLE   Inyeccion SQL en ruta /dni/ | esperado: 404/422 | observado: 404
T18  A05     CUMPLE   La tabla sigue existente tras `DROP TABLE` en parametro | esperado: 200 y mismas filas | observado: 200, 26 filas (antes
26)
T32  A05     HALLAZGO Reporte CSV neutraliza celdas que empiezan con = + - @ (inyeccion de formulas, CWE-1236) | esperado: celda con prefijo s
eguro | observado: registro HTTP 201; fila CSV: 2026-10-30,72777001,"=HYPERLINK(""http:/
T19  A02     HALLAZGO Cabeceras de seguridad HTTP en / | esperado: 6 de 6 presentes | observado: 0 de 6; faltan: CSP, nosniff, DENY/SAMEORIGIN
o frame-ancestors, Referrer-Policy, HSTS, Permissions-Policy
T20  A02     HALLAZGO Cabeceras de seguridad HTTP en /api/salud | esperado: 6 de 6 presentes | observado: 0 de 6; faltan: CSP, nosniff, DENY/S
AMEORIGIN o frame-ancestors, Referrer-Policy, HSTS, Permissions-Policy
T21  A02     HALLAZGO Cabecera Server no revela version | esperado: sin Server o generica | observado: uvicorn
T22  A02     HALLAZGO Documentacion /docs sin sesion | esperado: 401 o 404 | observado: 200
T23  A02     HALLAZGO /openapi.json sin sesion | esperado: 401 o 404 | observado: 200
T24  A08     CUMPLE   Webhook sin WHATSAPP_APP_SECRET falla cerrado | esperado: 503 | observado: 503
T25  A08     CUMPLE   Verificacion del webhook con token vacio | esperado: 403 | observado: 403
T26  A07     HALLAZGO Limite de intentos de login en la aplicacion (15 intentos fallidos seguidos) | esperado: algun 429/bloqueo | observado:
[401]
T27  A10     CUMPLE   JSON malformado responde 422 sin traza | esperado: 422 sin 'Traceback' | observado: 422, traza=False
T28  A10     CUMPLE   Recurso inexistente responde 404 con mensaje controlado | esperado: 404 | observado: 404 {"mensaje":"No existe el expedi
ente solicitado.","errores":[
T29  A10     CUMPLE   Parametro invalido no produce 500 | esperado: != 500 | observado: 404
T30  A07     CUMPLE   Cerrar sesion elimina las cookies | esperado: 2 cookies expiradas | observado: 2

25/32 comprobaciones CUMPLE; 7 HALLAZGO

$ python ../entregables/semana-10/metricas/seguridad_http.py
cwd: pmv_fastapi  |  fecha: 2026-10-30 20:13:47  |  commit: ada827f  |  salida: código 0  |  duración: 2.3 s
```


Pruebas dinámicas de seguridad T01 a T32.

Figura 92. Pruebas dinámicas T01 a T32 contra el servidor local (sesión, CSRF, cookies, cabeceras, inyección, webhook y errores).

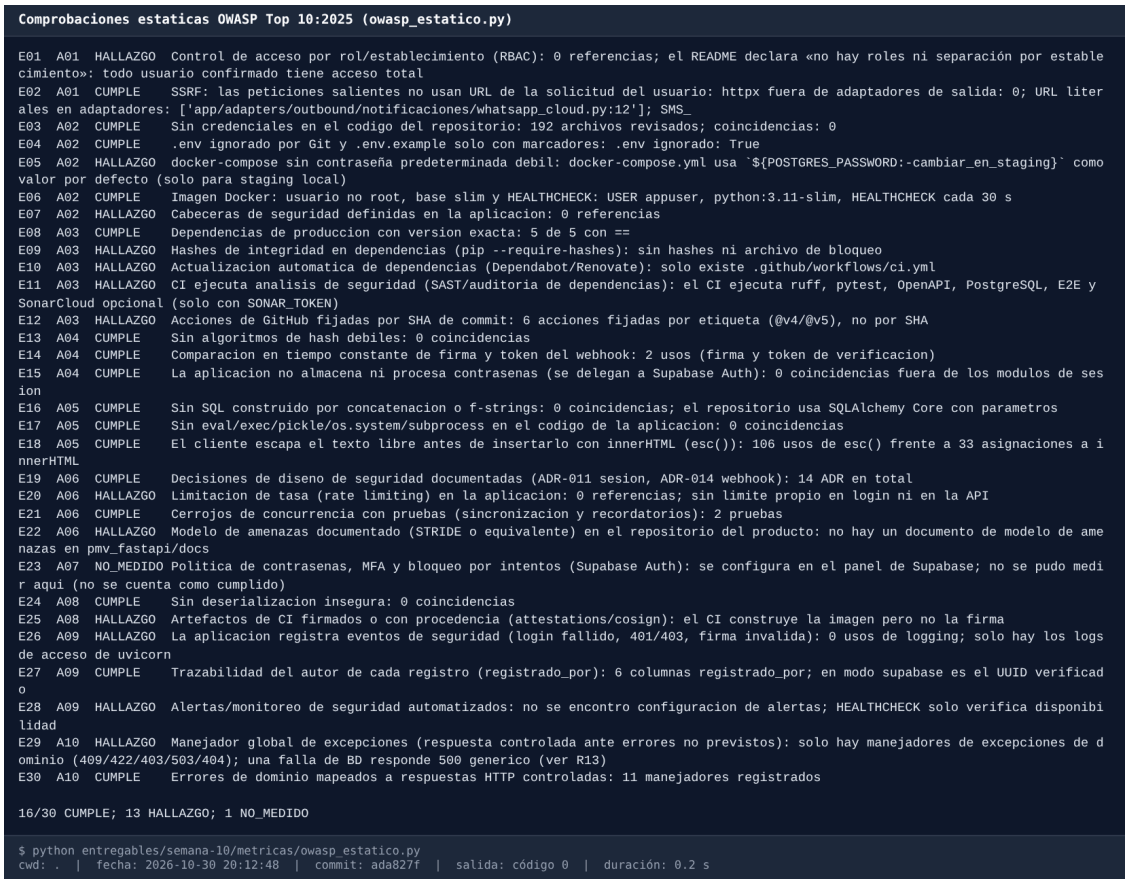


Comprobaciones estáticas E01 a E30.

Figura 93. Comprobaciones estáticas E01 a E30 con su estado (CUMPLE, HALLAZGO, NO MEDIDO).

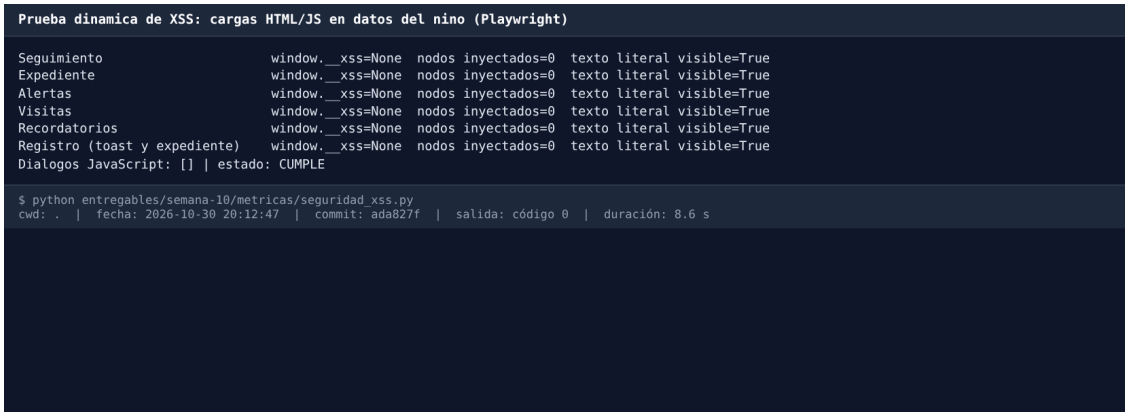


Prueba dinámica de XSS en seis pantallas.

Figura 94. XSS dinámico: cargas inyectadas en cuatro campos y revisadas en seis pantallas (0 ejecuciones).

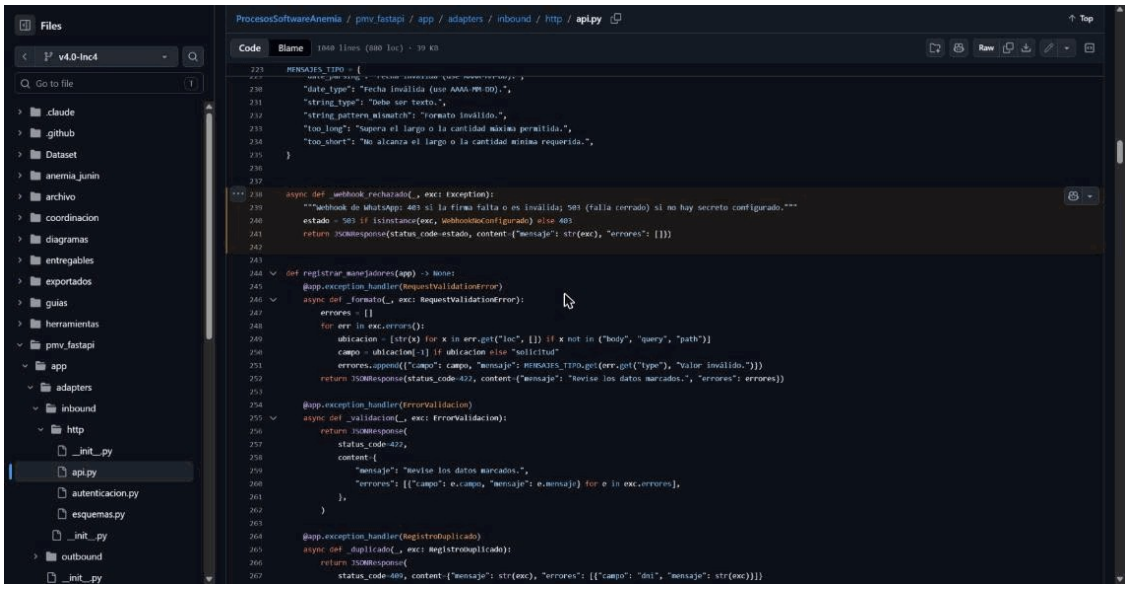


Webhook de WhatsApp que falla cerrado.

Figura 95. Manejador del webhook que responde 503 sin secreto y 403 con firma ausente o inválida, corregido en la revisión independiente (GitHub, `v4.0-Inc4`).

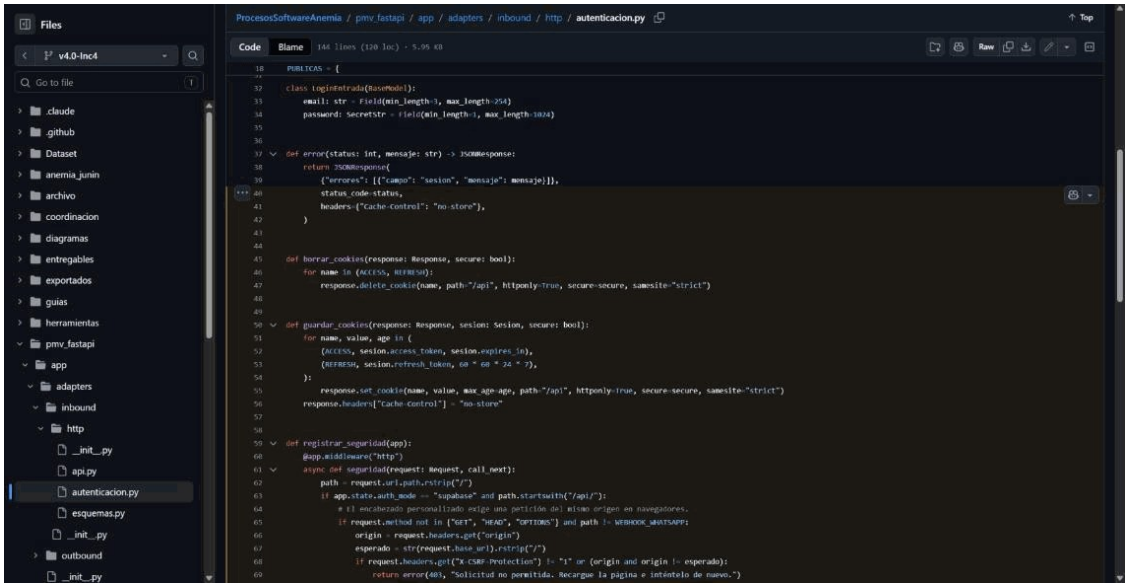

Sesión en cookies con CSRF en GitHub.

Figura 96. Sesión en cookies `HttpOnly` con protección CSRF (GitHub, `v4.0-Inc4`).

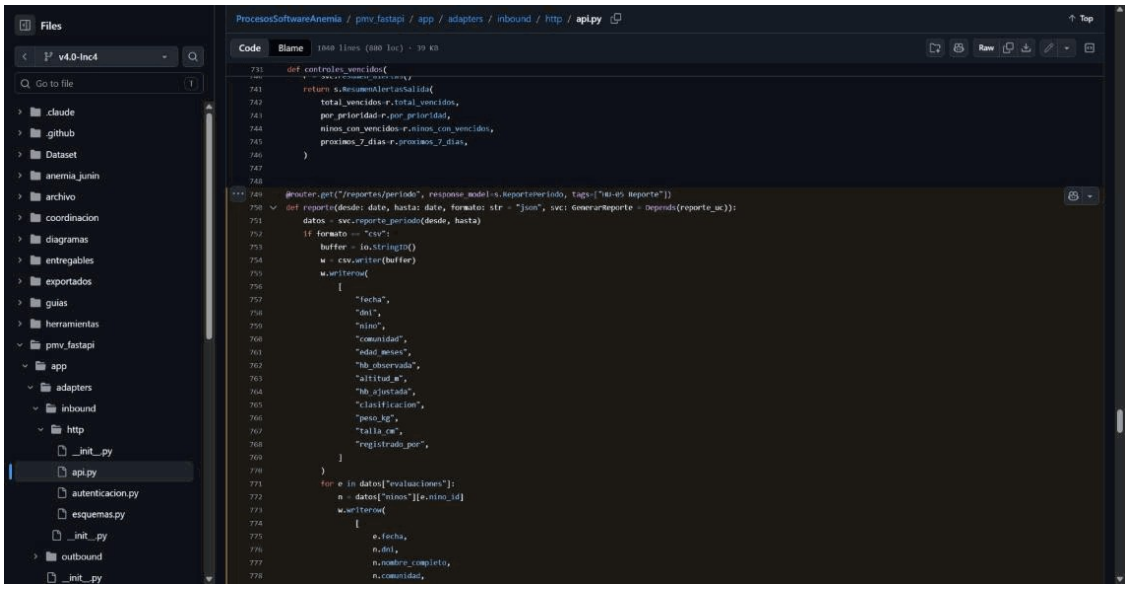

Código afectado por el hallazgo H-3 (CSV).

Figura 97. Código afectado por el hallazgo H-3: el CSV del reporte no neutraliza celdas que empiezan con `=`, `+`, `-` o `@` (GitHub, `v4.0-Inc4`).

Conteo de vulnerabilidades. Las herramientas SAST y SCA no confirman ninguna vulnerabilidad alta o crítica, pero la revisión manual y dinámica sí: 1 hallazgo de severidad alta (H-1) y seis de severidad media. **No se afirma ausencia de vulnerabilidades**; el criterio «0 vulnerabilidades críticas o altas» de la plantilla no se cumple.

Tabla 35. Hallazgos de seguridad H-1 a H-12 con su acción propuesta (S10, Tabla 24). Ninguna acción está aplicada en el código; las acciones 12 a 18 del plan de mejora CMMI (sección 3.8) las programan.

N.°	OWASP	Hallazgo	Severidad	Acción propuesta
H-1	A01	Sin roles ni segmentación por establecimiento: todo usuario autenticado ve y modifica todo	**Alta**	Roles en el JWT y políticas RLS por establecimiento
H-2	A02	Ninguna de las 6 cabeceras de seguridad HTTP	Media	Middleware con CSP, `nosniff`, anti-frame, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy` y HSTS
H-3	A05	El CSV no neutraliza fórmulas (CWE-1236)	Media	Anteponer `'` a celdas que empiezan con `=`, `+`, `-` o `@`
H-4	A06, A07	Sin limitación de tasa en el login ni en la API	Media	Limitar intentos por IP y correo; confirmar el bloqueo de Supabase
H-5	A09	Sin registro ni alertas de eventos de seguridad	Media	Registrar logins fallidos, 401, 403 y firmas inválidas sin datos personales
H-6	A10	Sin manejador global: la base caída produce 500	Media	`OperationalError` a 503 y manejador genérico con identificador de correlación

N.°	OWASP	Hallazgo	Severidad	Acción propuesta
H-7	A03, A08	CI sin SAST ni auditoría de dependencias; acciones fijadas por etiqueta; imagen sin firma	Media	`bandit` y `pip-audit` en el CI, Dependabot y acciones por SHA
H-8	A02	`/docs` y `/openapi.json` públicos; cabecera `Server` visible	Baja	Proteger la documentación y ocultar `Server`
H-9	A02	Contraseña por defecto en `docker-compose.yml`	Baja	Exigir `POSTGRES_PASSWORD` sin valor por defecto
H-10	A05	`esc()` ausente en `dni`, `sexo` y `celular` al construir HTML	Baja	Aplicar `esc()` o `textContent` (parcialmente abierto en `main`)
H-11	A06	Sin modelo de amenazas documentado	Baja	Documentar STRIDE de sesión, sincronización y webhook
H-12	A07	Política de contraseñas, MFA y bloqueo de Supabase sin verificar	No medido	Revisar el panel de Supabase Auth y dejar captura

Restricciones técnicas. El diseño hexagonal (25 de 25 pruebas), Python 3.11 con Ruff (0 errores; 142 archivos formateados) y el contrato OpenAPI al día cumplen. La contenerización con Docker se revisó en el código y el trabajo `imagen` del CI construye la imagen, pero no se ejecutó con `docker compose` en el entorno de medición.

3.8 EJE 8: Evaluación de Capacidad del Proceso según CMMI-DEV y Mejora Continua


La evaluación usa la representación continua con niveles de capacidad 0 a 3 por área de práctica [19] y una regla estricta: **el nivel de un área es el de su práctica más débil**. Nivel 1 (Ejecutado) significa que la práctica se realiza y deja producto, pero sin registro sistemático ni contraste con lo planificado; Nivel 2 (Gestionado), que además está planificada, tiene responsables, se contrasta con lo real y sus productos se revisan con evidencia verificable; Nivel 3 (Definido), que existe un estándar documentado y automatizado que se aplica en todos los incrementos (S11, Tabla 4). La autoevaluación la hizo el propio equipo, sin evaluador externo.

Diagnóstico de nivel de capacidad CMMI (0 a 3)

Tabla 36. Nivel de capacidad por área de práctica al 30/10/2026 (S11, Tabla 6).

Área	Nivel S11	Nivel 30/10	Evidencia que sostiene el nivel	Qué impide el nivel siguiente
ESTIM	1	**1 (Ejecutado)**	133 SP estimados con Planning Poker; 76 entregados	Sin horas reales en ningún incremento (113 h estimadas solo para INC-1); VIS-3.5 sin estimar
PLAN	2	**2 (Gestionado)**	WBS, cronograma, hitos H0 a H7 y desviaciones medidas (+2, +5, +4, −10 días); seguimiento en `TABLERO.md`	Sin tablero de GitHub Projects; hitos H3 y H4 sin aceptación; replanificación propuesta en S9 no adoptada
PQA	1	**1 (Ejecutado)**	DoD por actividad e historia, puertas automáticas del CI e informe de revisión independiente	PR #8 integrada sin revisión «Approved»; PR #6 y #7 con verificaciones en rojo; plantilla de PR incorporada el 06/11/2026, aún sin uso sostenido; protección de `main` no verificable
CM	2	**2 (Gestionado)**	5 etiquetas (`v1.0-PMV` a `v4.0-Inc4`) con su *release*, ramas `feature/*`, PR integradas, CI en la rama antes de la PR	Convención escrita (`CONTRIBUTING.md`) y rama `develop` desde el 06/11/2026, aún no aplicadas en un incremento completo; la PR #8 entró como un solo commit *squash* que las etiquetas no contienen
VER	2	**2 (Gestionado)**	660 pruebas, 28 E2E, 99,79 % de cobertura, 25 pruebas de arquitectura, Ruff 0, contrato OpenAPI	SonarCloud analizado el 05/11/2026 pero fuera del CI; *hook* de pre-commit sin activar; 5 defectos escaparon a las pruebas
VAL	1	**1 (Ejecutado)**	19 de 19 escenarios con captura y ficha	Sin SUS, sin acta de aceptación ni piloto; validaciones con la microred, Meta y dispositivo real pendientes
CAR	no evaluada	**1 (Ejecutado)**	9 hallazgos con causa raíz; cinco porqués para	1 de 19 acciones cumplida y ninguna con efecto medido


Área	Nivel S11	Nivel 30/10	Evidencia que sostiene el nivel	Qué impide el nivel siguiente
			6 de ellos; plan de 19 acciones	

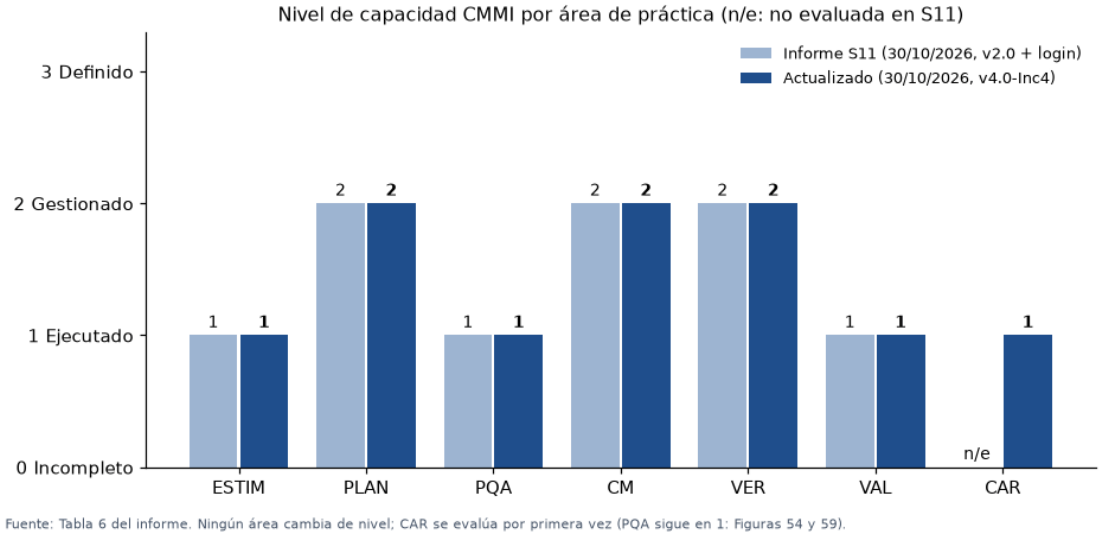

Nivel de capacidad CMMI por área, S11 frente a 30/10/2026.


Figura 98. Nivel de capacidad CMMI por área, informe S11 frente al 30/10/2026: ninguna área cambia de nivel; CAR se evalúa por primera vez.

El perfil es de tres áreas en Nivel 2 (PLAN, CM y VER) y cuatro en Nivel 1 (ESTIM, PQA, VAL y CAR). No se adoptaron los niveles del ejemplo de la plantilla (CM en Nivel 3, ESTIM y CAR en Nivel 2) porque la evidencia no los sostiene: no hay un estándar de configuración documentado y exigible, no hay horas reales para contrastar la estimación y ninguna mejora tiene aún el efecto medido. La ingeniería (VER y CM) está respaldada por automatización y etiquetas; la gestión, la aceptación del usuario y el aseguramiento de calidad siguen dependiendo del criterio individual.

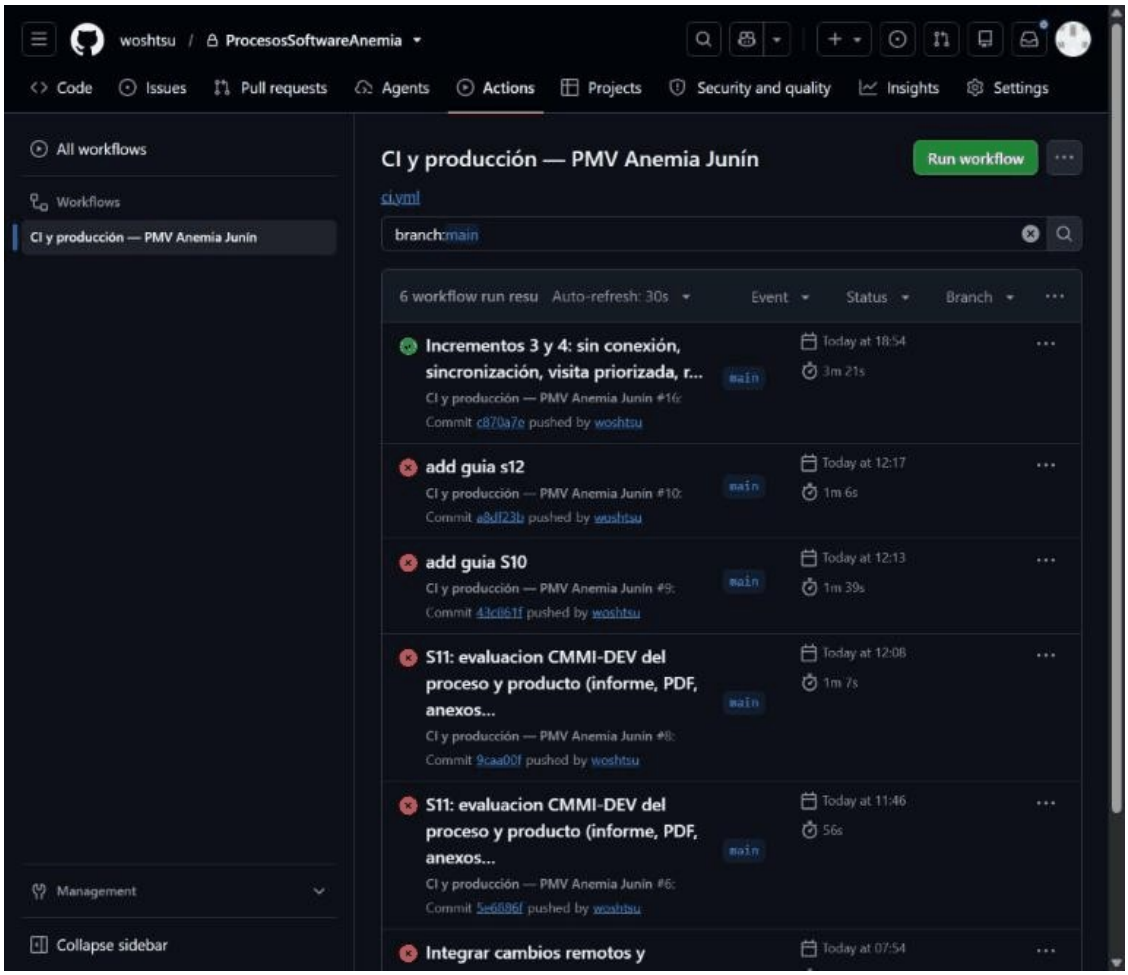


Ejecuciones del CI en main: la #16 en verde y las anteriores en rojo.

Figura 99. Ejecuciones del flujo «CI y producción» en `main`: la #16 (`c870a7e`, PR #8) en verde y las #6, #8, #9 y #10 en rojo (GitHub, 30/10/2026).

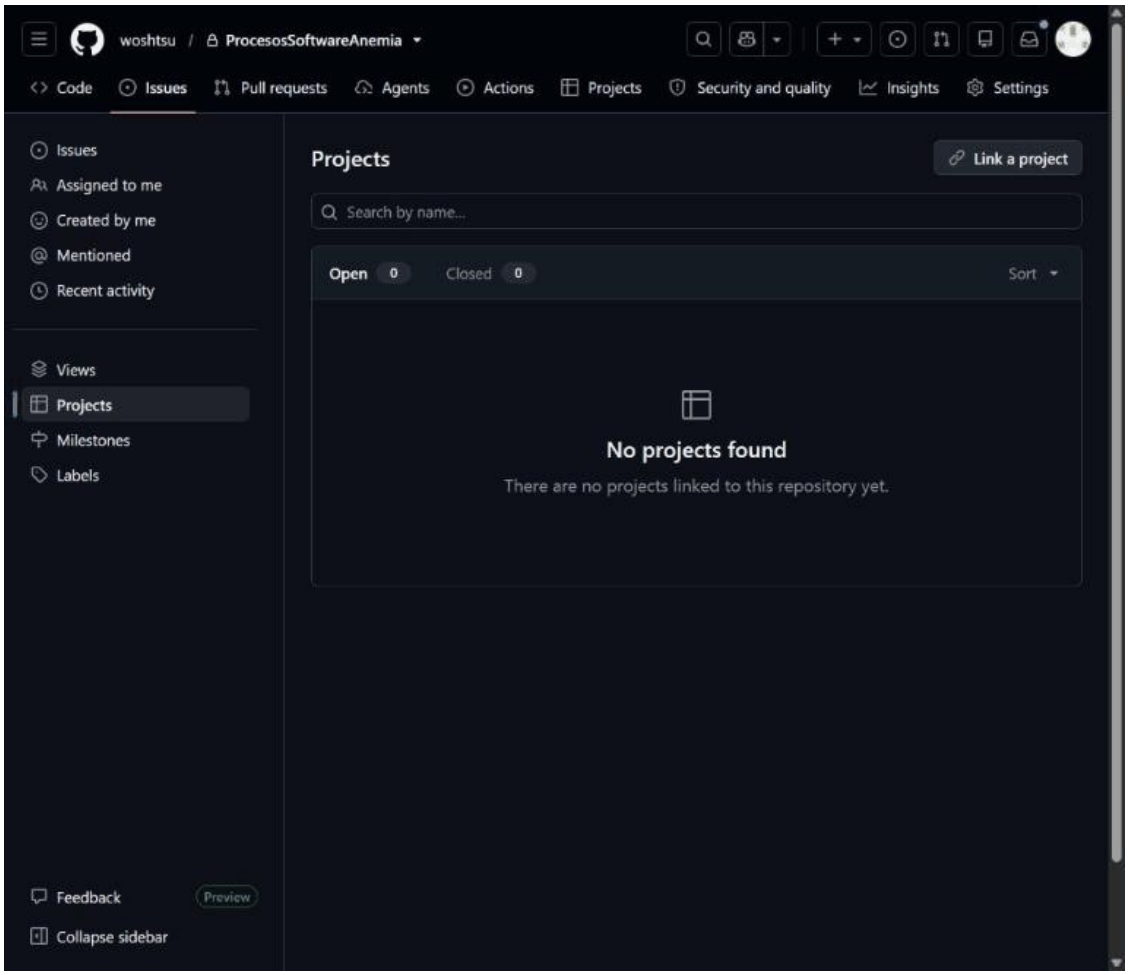

El repositorio no tiene tableros de GitHub Projects.

Figura 100. Pestaña Projects: «No projects found»; el seguimiento de PLAN se apoya solo en `coordinacion/TABLERO.md` (GitHub, 30/10/2026).

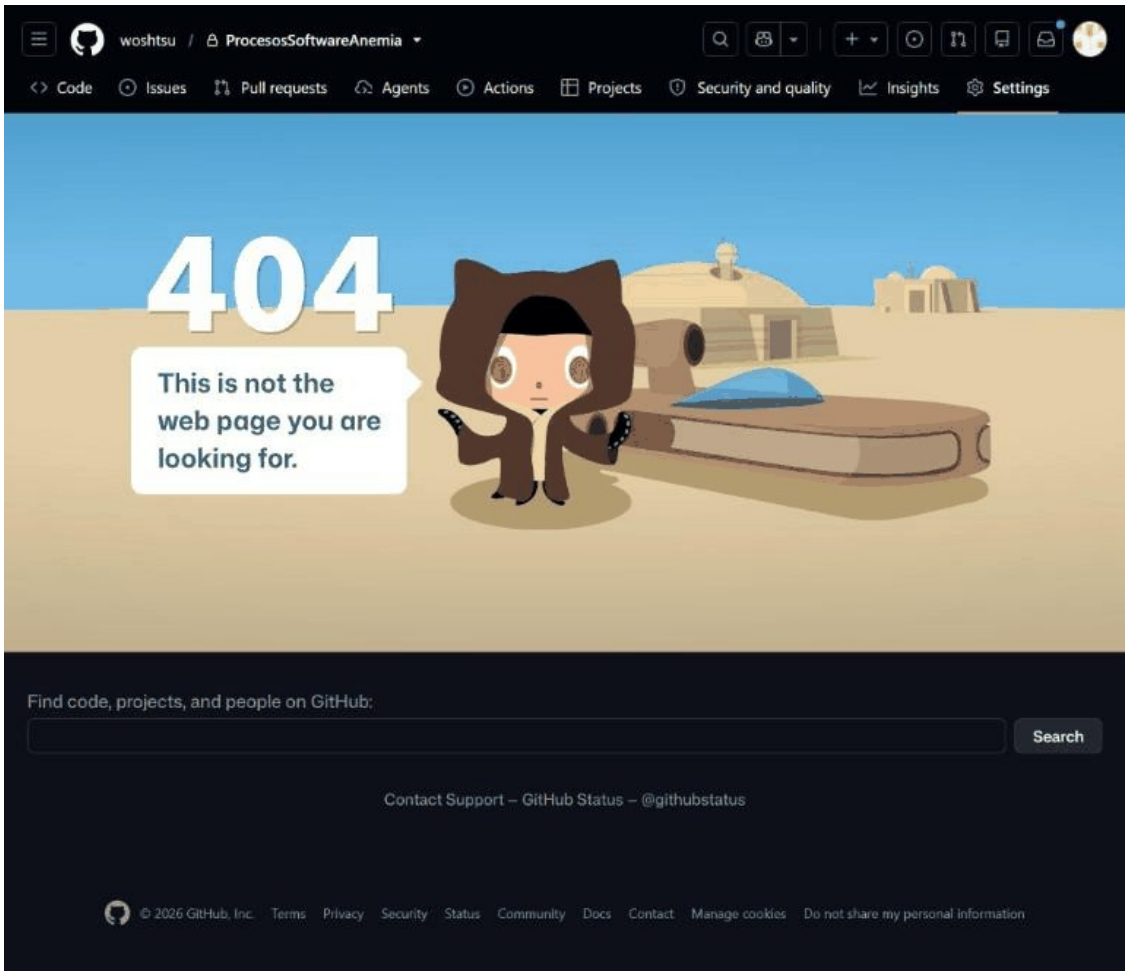

La protección de main no es verificable.

Figura 101. `settings/branches` devuelve 404 para la cuenta que tomó la captura: la protección de `main` no es verificable (GitHub, 30/10/2026).



Artefactos de proceso presentes y ausentes en el repositorio.

Figura 102. Artefactos de proceso en el repositorio: la plantilla de PR, el *hook* de pre-commit, la convención de commits, `CODEOWNERS` y Dependabot no existen; SonarCloud sin organización.

Estado al 06/11/2026: SonarCloud tiene organización y un primer análisis (05/11), y el repositorio ya tiene la plantilla de PR, la de solicitud de cambio y la convención de commits, ramas y etiquetas (`CONTRIBUTING.md`). El *hook* de pre-commit, `CODEOWNERS` y Dependabot siguen pendientes.

Evidencias de los productos de trabajo por área de práctica

El nivel de cada área de la Tabla 36 se sostiene en productos de trabajo del proyecto. La Tabla 37 asocia cada área con sus artefactos (cronograma, estimación, diseño, pruebas, configuración y revisión) y las figuras que siguen los muestran.

El diseño no es un área evaluada en la Tabla 36. Se presenta como **Solución técnica (TS)**, evidencia complementaria de que el diseño se documentó antes de construir. Sus artefactos sostienen a PLAN y VER.

Tabla 37. Artefactos del proceso que sostienen el nivel de cada área de práctica.

Área	Nivel	Artefacto (producto de trabajo)	Evidencia
ESTIM	1	Backlog estimado en puntos de historia (133 SP, *Planning Poker*) y estimación en horas del INC-1 (113 h-persona)	Figuras 103 y 104
PLAN	2	Cronograma de sprints e hitos H0 a H7; seguimiento del plan frente a lo real	Figuras 105 y 106
TS (complementaria)	—	14 decisiones de arquitectura (ADR-001 a ADR-014); diagrama de componentes y modelo de datos obtenidos del código por ingeniería inversa	Figuras 107 a 109 y Tabla 38
VER	2	660 pruebas automatizadas con 99,79 % de cobertura, 28 pruebas E2E, análisis estático Ruff y SonarCloud	Figuras 110 a 112
VAL	1	20 fichas de prueba funcional con capturas (3.6.3) y ejecución en producción	Figuras 113 y 114
CM	2	Etiquetas y *releases* por incremento, ramas `feature/*`, *pull requests* y convención escrita	Figuras 115, 116 y 117
PQA	1	Verificaciones automáticas de la PR y revisión independiente con su regresión	Figuras 118 y 119
CAR	1	Hallazgos con causa raíz (Tablas 39 y 40) y nuevo análisis de SonarCloud	Figura 112 y Tabla 39

FICHA DE EVIDENCIA CMMI POR ÁREA DE PRÁCTICA (ESTIM — ESTIMACIÓN)

- **PRÁCTICA EVALUADA:** estimar el tamaño y el esfuerzo del trabajo con un método explícito.
- **PRODUCTO DE TRABAJO:** Tabla 19 del entregable S3-4 (puntos de historia del backlog completo) y estimación de duraciones por actividad del INC-1.
- **NIVEL:** 1 (Ejecutado). La estimación existe, pero no se registran horas reales para contrastarla (H1).

[CAPTURA 1: ARTEFACTO]

- **Descripción: Figura 103.** Estimación del backlog en puntos de historia: 21 SP del INC-1 y 133 SP en total, con complejidad e incertidumbre por elemento. Fuente: entregable S3-4, sección 10.2.

`entregables/semana-03-04/Entregable_Semana3y4_Anemia_Junin.md · sección 10.2`

Tabla 19. Estimación del Product Backlog en puntos de historia


Elemento	Estimación	Unidad	Complejidad	Nivel de incertidumbre
EP-1.T Habilitadores técnicos (arquitectura, persistencia, API, entorno de calidad)	5	Puntos de historia	Media	Medio
HIST-1.1 Registrar niño	5	Puntos de historia	Media	Bajo
HIST-1.2 Expediente y dosajes	3	Puntos de historia	Media	Bajo
HIST-1.3 Validar datos y clasificar hemoglobina	3	Puntos de historia	Media	Medio (fuente normativa)
HIST-1.4 Listado en seguimiento	2	Puntos de historia	Baja	Bajo
HIST-1.5 Reporte del periodo	3	Puntos de historia	Media	Bajo
INC-1 total	**21**	Puntos de historia		
INC-2 (HIST-2.1 a 2.4)	18	Puntos de historia	Media-alta	Bajo
INC-3 (HIST-3.1 a 3.4)	21	Puntos de historia	Alta	Alto
INC-4 (HIST-4.1 a 4.4)	16	Puntos de historia	Media	Medio
INC-5 (HIST-5.1 a 5.4)	34	Puntos de historia	Muy alta	Muy alto
INC-6 (HIST-6.1 a 6.4)	15	Puntos de historia	Media	Bajo
Backlog técnico BT-01 a BT-03, BT-08, BT-09	8	Puntos de historia	Media	Medio
Total del proyecto	**133**	Puntos de historia		

Estimación del backlog en puntos de historia.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-12/correcciones/img/C01_estimacion_sp.png`

[CAPTURA 2: ARTEFACTO]

- **Descripción: Figura 104.** Diagrama de Gantt del Incremento 1: actividades A01 a A21 con su duración estimada, responsable y dependencias (28 días, igual a la ruta crítica).

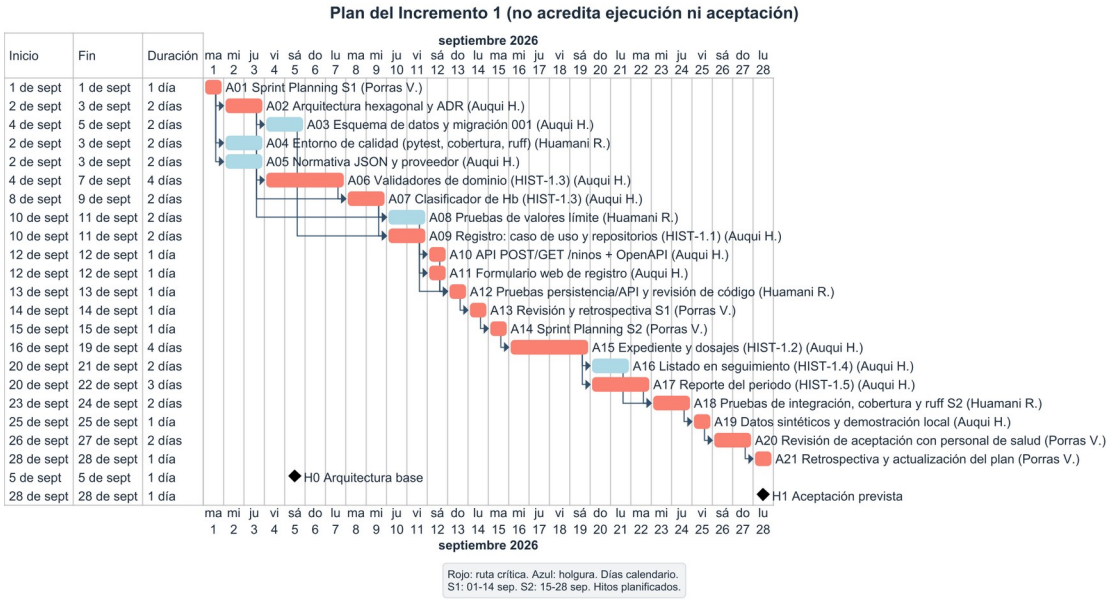

Gantt del Incremento 1.


- **Archivo de imagen:** `diagramas/png/32_s34_gantt_incremento1.png`

FICHA DE EVIDENCIA CMMI POR ÁREA DE PRÁCTICA (PLAN — PLANIFICACIÓN)

- **PRÁCTICA EVALUADA:** planificar el trabajo en un cronograma con hitos y dar seguimiento a las desviaciones.
- **PRODUCTO DE TRABAJO:** cronograma de sprints e hitos (S3-4) y comparación del plan con las fechas reales (S11).
- **NIVEL:** 2 (Gestionado). Hay plan, hitos y desviaciones medidas: +5, +4 y −10 días.

[CAPTURA 1: ARTEFACTO]

- **Descripción: Figura 105.** Cronograma de los sprints 1 a 8 y de los hitos H0 a H7, del 01/09 al 21/12/2026.

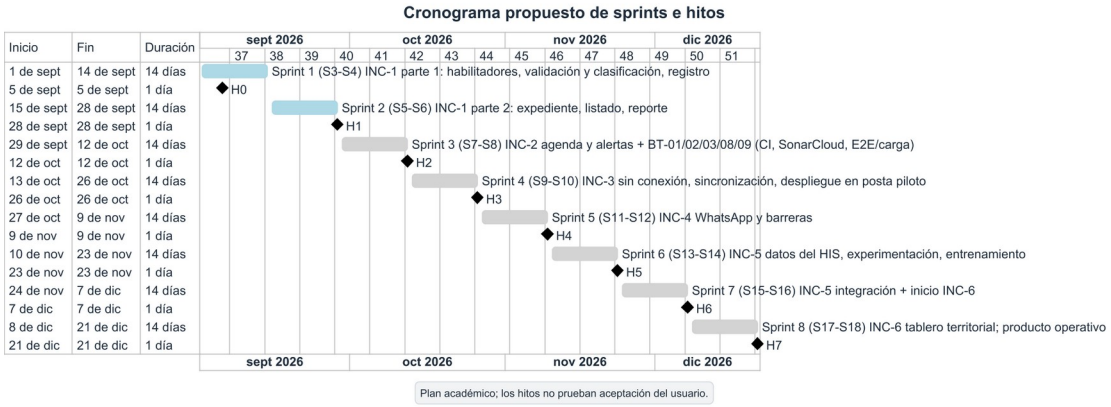


Cronograma de sprints e hitos.

- **Archivo de imagen:** `diagramas/png/33_s34_cronograma_sprints_hitos.png`

[CAPTURA 2: SEGUIMIENTO]

- **Descripción: Figura 106.** Hitos del plan frente a la fecha real del commit: H2 (+5 días), H3 (+4 días) y H4 (−10 días, se adelantó la entrega para recuperar el plan original).

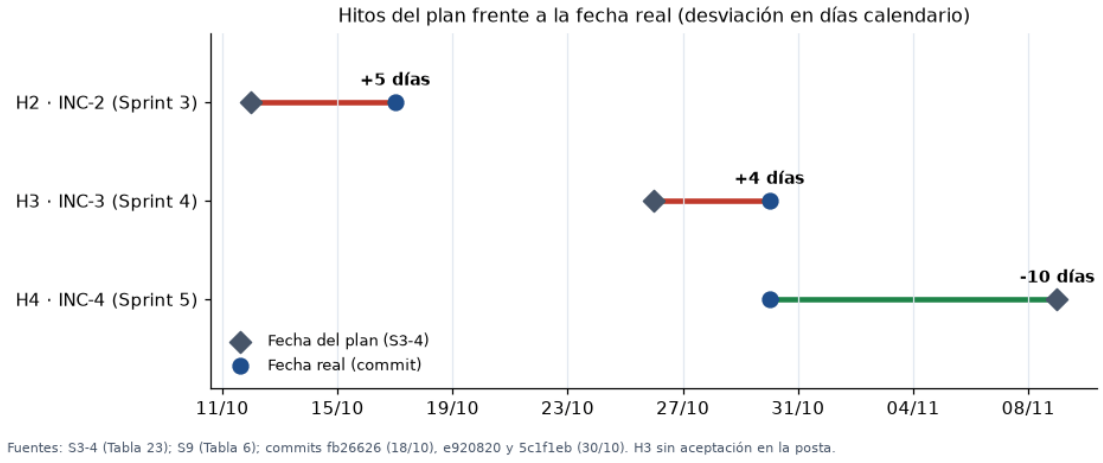

Hitos planificados frente a reales.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-11/evidencias/CMMI02_hitos_plan_vs_real.png`

FICHA DE EVIDENCIA CMMI POR ÁREA DE PRÁCTICA (TS — SOLUCIÓN TÉCNICA / DISEÑO, COMPLEMENTARIA)

- **PRÁCTICA EVALUADA:** diseñar la solución y documentar las decisiones antes de construir.
- **PRODUCTO DE TRABAJO:** registro de decisiones de arquitectura (ADR), diagrama de componentes y modelo de datos de `v4.0-Inc4`.
- **VALORACIÓN:** las decisiones de cada incremento están registradas, por ejemplo ADR-011 a ADR-014 para los incrementos 3 y 4. Los diagramas C4 y el modelo de datos del repositorio eran del PMV (01/10/2026) y no mostraban los incrementos 2 a 4 (hallazgo H10).
- **ACCIÓN (06/11/2026):** los dos diagramas se regeneraron por ingeniería inversa con `entregables/semana-13/ingenieria_inversa/generar_diagramas.py`. El modelo de datos se lee de los modelos SQLAlchemy y los componentes, de las importaciones del código fuente, por lo que el diagrama coincide con el código de la etiqueta. La Tabla 38 compara los diagramas del PMV con el código actual.

[CAPTURA 1: ARTEFACTO]

- **Descripción: Figura 107.** Índice de los 14 ADR con su fecha de creación: cada incremento agregó las decisiones que lo justifican, por ejemplo la sincronización sin conexión (ADR-012), la visita priorizada (ADR-013) y los recordatorios y barreras (ADR-014).

Registro de decisiones de arquitectura (ADR-001 a ADR-014)

archivo	creado	título
ADR-001-arquitectura-hexagonal.md	2026-10-01	ADR-001 — Arquitectura hexagonal en un monolito modular
ADR-002-pwa-web.md	2026-10-01	ADR-002 — Cliente PWA web adaptable
ADR-003-postgresql.md	2026-10-01	ADR-003 — PostgreSQL como base central
ADR-004-reglas-clinicas-parametrizadas.md	2026-10-01	ADR-004 — Reglas clínicas parametrizadas en el dominio
ADR-005-api-rest-openapi.md	2026-10-01	ADR-005 — API REST JSON con contrato OpenAPI
ADR-006-consultas-por-lotes.md	2026-10-01	ADR-006 — Consultas por lotes en reportes (corrección DEF-01)
ADR-007-agenda-calculada-en-dominio.md	2026-10-17	ADR-007 — Agenda de controles calculada en el dominio, sin tabla propia
ADR-008-puertos-de-entrada-y-estructura-hexagonal.md	2026-10-17	ADR-008 — Puertos de entrada y estructura hexagonal explícita
ADR-009-origen-de-datos-y-dataset-diresa.md	2026-10-18	ADR-009 — Origen de los datos, registros del dataset DIRESA Junín y reloj de referencia
ADR-010-asistencia-a-control-persistida.md	2026-10-18	ADR-010 — Asistencia a un control: evento persistido que complementa la agenda calculada
ADR-011-supabase-auth.md	2026-10-23	ADR-011: Supabase Auth y sesiones en el servidor
ADR-012-sincronizacion-sin-conexion.md	2026-10-30	ADR-012 — Sincronización sin conexión: cola en el dispositivo, idempotencia por `id_operacion`
ADR-013-visita-domiciliaria-priorizada.md	2026-10-30	ADR-013 — Visita domiciliaria priorizada: puntaje explicable propuesto por el equipo
ADR-014-notificador-y-canales.md	2026-10-30	ADR-014 — Recordatorios por mensajería, respuesta del tutor y barreras de acceso


$ ls pmv_fastapi/docs/adr/ADR-*.md (fecha de creación según git log)
cwd: raíz del repositorio | fecha: 2026-11-06 12:40 | código de app/: idéntico a la etiqueta v4.0-Inc4 | un ADR por decisión de diseño; ADR-011 a ADR-014 cubren los incrementos 3 y 4

Índice de decisiones de arquitectura.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-12/correcciones/img/C05_adr_indice.png`


[CAPTURA 2: ARTEFACTO POR INGENIERÍA INVERSA]

- **Descripción: Figura 108.** Componentes de `pmv_fastapi/app` en `v4.0-Inc4`, obtenidos de las importaciones del código. El hexágono (dominio, puertos y casos de uso) no importa ningún adaptador: los adaptadores dependen de los puertos y del modelo, y `main.py` es la única raíz de composición. Cada número indica las importaciones entre dos paquetes.

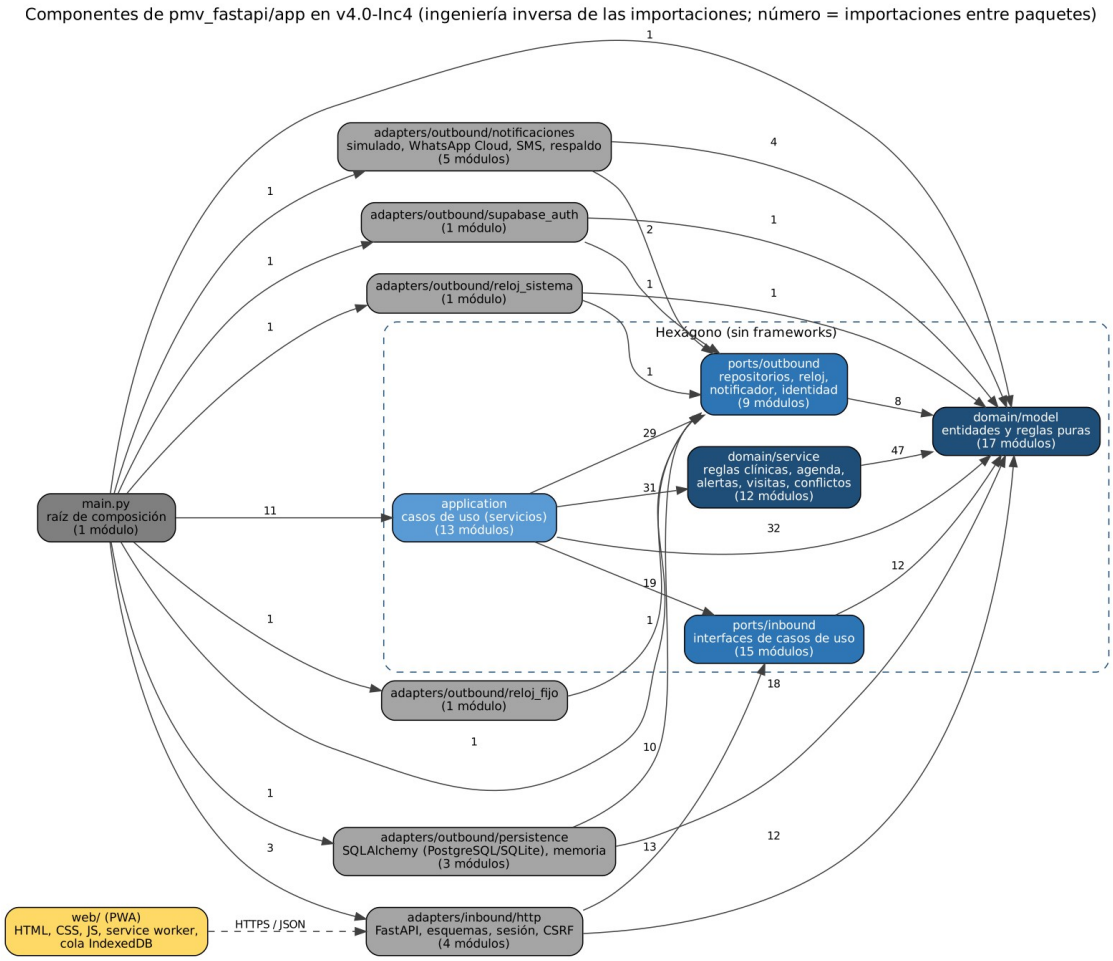

Componentes de v4.0-Inc4 por ingeniería inversa.

- **Descripción: Figura 109.** Modelo de datos de `v4.0-Inc4` leído de los modelos SQLAlchemy: 8 tablas con sus claves primarias, claves foráneas y restricciones de unicidad.

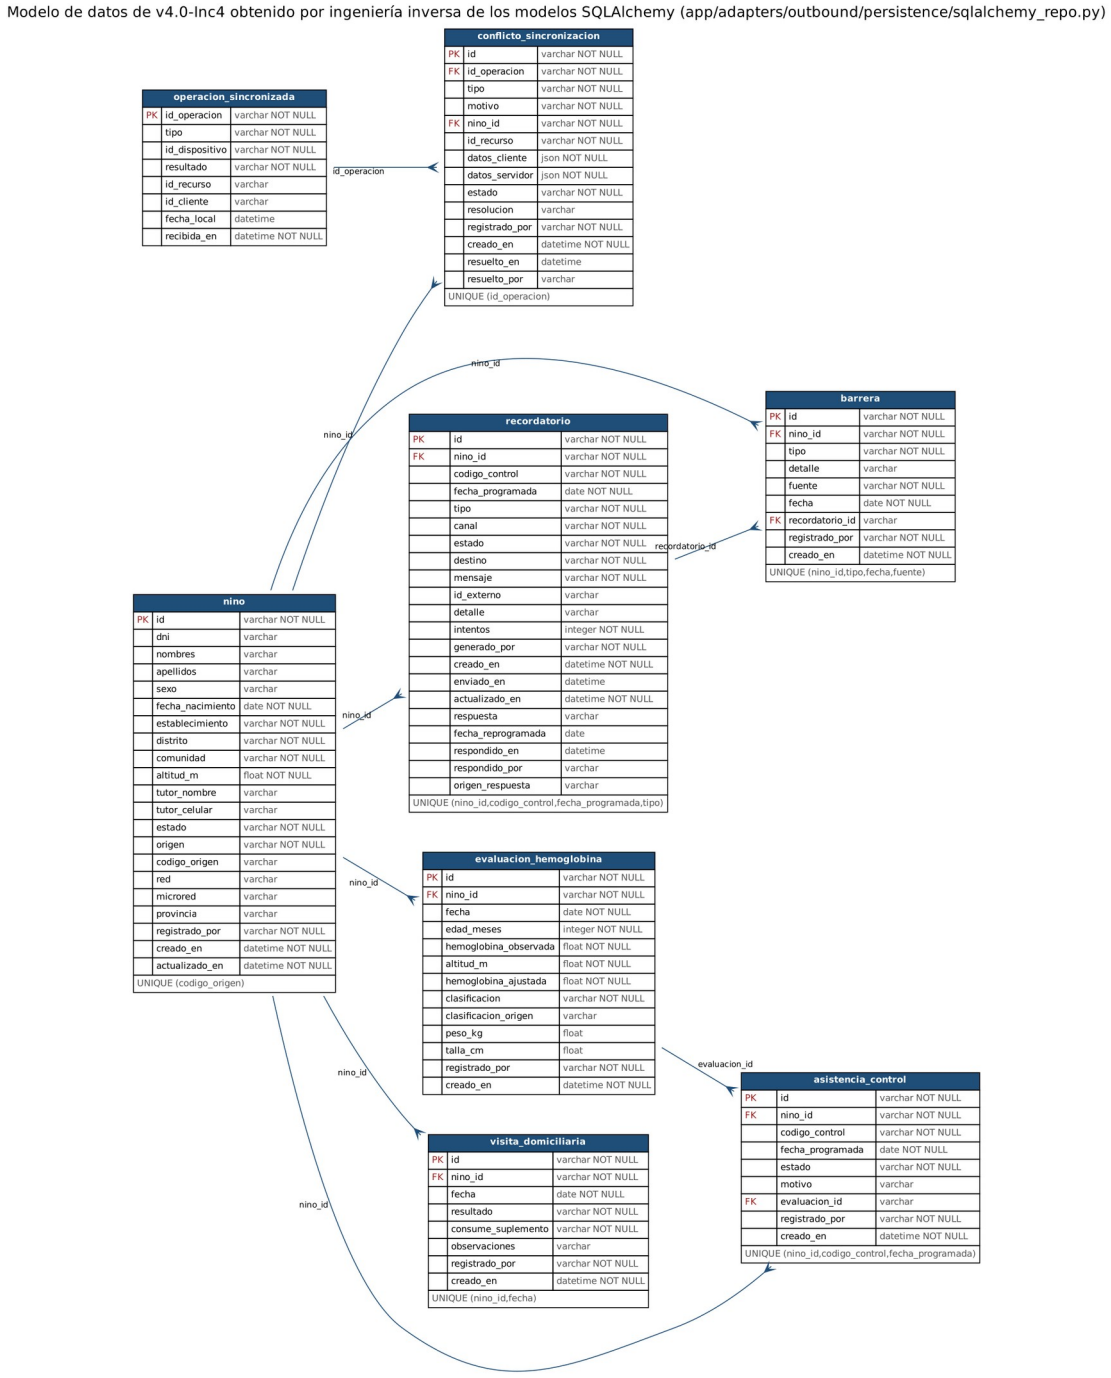

Modelo de datos de v4.0-Inc4 por ingeniería inversa.

- **Archivos de imagen:** `entregables/semana-13/img/D02_componentes_v4.png`, `entregables/semana-13/img/D01_modelo_datos_v4.png` (fuentes `.dot` en la misma carpeta)

Tabla 38. Diagramas del PMV frente al código de `v4.0-Inc4` obtenido por ingeniería inversa.

Elemento	Diagrama del PMV (01/10/2026)	Código de `v4.0-Inc4`	Origen del cambio
Tablas	2: `nino` y `evaluacion_hemoglobina`	8: las dos anteriores más `asistencia_control`, `visita_domiciliaria`, `operacion_sincronizada`,	Inc. 2 (ADR-010), Inc. 3 (ADR-012 y ADR-013) e

Elemento	Diagrama del PMV (01/10/2026)	Código de `v4.0-Inc4`	Origen del cambio
		`conflicto_sincronizacion`, `recordatorio` y `barrera`	Inc. 4 (ADR-014)
Casos de uso	1 servicio (`ServicioExpediente`)	12 servicios en `application/` y 14 interfaces en `ports/inbound/`	Incrementos 2 a 4
Puertos de salida	1 (`RepositorioNinos`)	8: repositorios, reloj, notificador y proveedor de identidad	Incrementos 2 a 4; ADR-011
Adaptadores de salida	SQLAlchemy	SQLAlchemy y memoria; notificaciones (simulado, WhatsApp Cloud, SMS y respaldo); Supabase Auth; reloj fijo y del sistema	ADR-009, ADR-011 y ADR-014
Regla de dependencia	El dominio no depende de la infraestructura	Se mantiene: ninguna importación del hexágono hacia los adaptadores (Figura 108)	Sin cambio

FICHA DE EVIDENCIA CMMI POR ÁREA DE PRÁCTICA (VER — VERIFICACIÓN / PRUEBAS)

- **PRÁCTICA EVALUADA:** verificar el producto con pruebas y revisiones definidas, en cada cambio.
- **PRODUCTO DE TRABAJO:** suites de pruebas unitarias, de integración, de arquitectura y E2E; análisis estático; CI de GitHub Actions.
- **NIVEL:** 2 (Gestionado). Todas las suites se volvieron a ejecutar el 06/11/2026 con el mismo resultado del 30/10.

[CAPTURA 1: EJECUCIÓN]

- **Descripción: Figura 110.** 660 pruebas unitarias, de integración y de arquitectura aprobadas en 33 s, con 99,79 % de cobertura de líneas y ramas. Solo dos archivos de autenticación quedan por debajo del 100 %.

Pruebas unitarias, de integración y de arquitectura con cobertura

```
.......................................................................... [ 10%]
.......................................................................... [ 21%]
.......................................................................... [ 32%]
.......................................................................... [ 43%]
.......................................................................... [ 54%]
.......................................................................... [ 65%]
.......................................................................... [ 76%]
.......................................................................... [ 87%]
.......................................................................... [ 98%]
...........                                                              [100%]
============================== tests coverage ==============================
_________________ coverage: platform linux, python 3.13.16-final-0 _________________

Name                                                 Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
------------------------------------------------------------------------------------------------
[... 86 archivos con 100 % omitidos en la captura ...]
app/adapters/inbound/http/autenticacion.py             100      4     26      4    94%   96, 110, 120, 136->143, 140
app/adapters/outbound/supabase_auth.py                  54      1     14      1    97%   64
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                 4030      5    680      5    99%
Required test coverage of 80.0% reached. Total coverage: 99.79%
660 passed, 1 warning in 33.34s
```

```
$ python -m pytest tests/unitarias tests/integracion tests/arquitectura --cov=app -q
cwd: pmv_fastapi  |  fecha: 2026-11-06 12:05  |  código de app/: idéntico a la etiqueta v4.0-Inc4  |  salida: código 0
```

Pruebas con cobertura.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-12/correcciones/img/T01_pytest_cobertura.png`

[CAPTURA 2: EJECUCIÓN]

- **Descripción: Figura 111.** Análisis estático con Ruff: «All checks passed!» y 142 archivos con el formato correcto.

Análisis estático con Ruff

```
All checks passed!
142 files already formatted
```

```
$ ruff check . && ruff format --check .
cwd: pmv_fastapi  |  fecha: 2026-11-06 12:16  |  código de app/: idéntico a la etiqueta v4.0-Inc4  |  salida: código 0
```

Ruff.

La ejecución #16 del CI en `main`, en verde, es la Figura 99 de esta sección.

- **Descripción: Figura 112.** Primer análisis de SonarCloud del repositorio, del 05/11/2026: Quality Gate aprobado sobre el código nuevo y 129 hallazgos sobre el código completo.
  - El backend desplegado tiene 0 hallazgos.
  - Las 63 vulnerabilidades están en herramientas, scripts y el prototipo anterior.
  - Detalle en `entregables/sonarcloud/2026-11-05/ANALISIS_SONARCLOUD.md`.



Resumen de SonarCloud.


- **Archivos de imagen:** `entregables/semana-12/correcciones/img/T03_ruff.png`, `entregables/semana-11/evidencias/github/GH_actions_run16_main.png`, `entregables/semana-12/correcciones/img/C10_sonar_resumen.png`
- Las pruebas E2E (28 aprobadas) están en la Figura 15.

FICHA DE EVIDENCIA CMMI POR ÁREA DE PRÁCTICA (VAL — VALIDACIÓN)

- **PRÁCTICA EVALUADA:** validar que el producto sirve en su entorno de uso.
- **PRODUCTO DE TRABAJO:** 20 fichas de prueba funcional con capturas (3.6.3), producto desplegado en producción y video demostrativo.
- **NIVEL:** 1 (Ejecutado). Falta la aceptación del usuario final: no hay acta, ni SUS, ni piloto en una posta (H3).

[CAPTURA 1: EJECUCIÓN EN PRODUCCIÓN]

- **Descripción: Figura 113.** Producción: inicio de sesión del personal en `softwareanemia.onrender.com`.

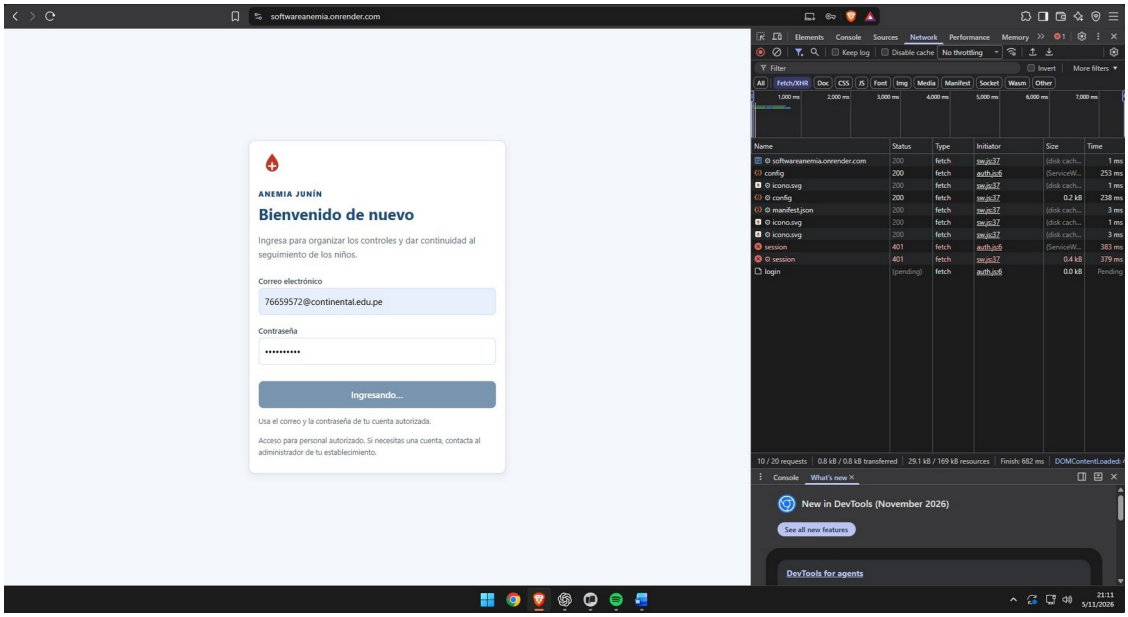


Inicio de sesión en producción.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-12/evidencias/produccion/PROD_05_auth_inicio_sesion.jpg`

[CAPTURA 2: ENTORNO DE PRODUCCIÓN]

- **Descripción: Figura 114.** Panel de Render: el servicio `SoftwareAnemia` está en estado «Live» con el commit `9b71b6e` de `main`. El historial muestra los despliegues disparados por el CI («Deploy Hook») tras cada PR integrada.

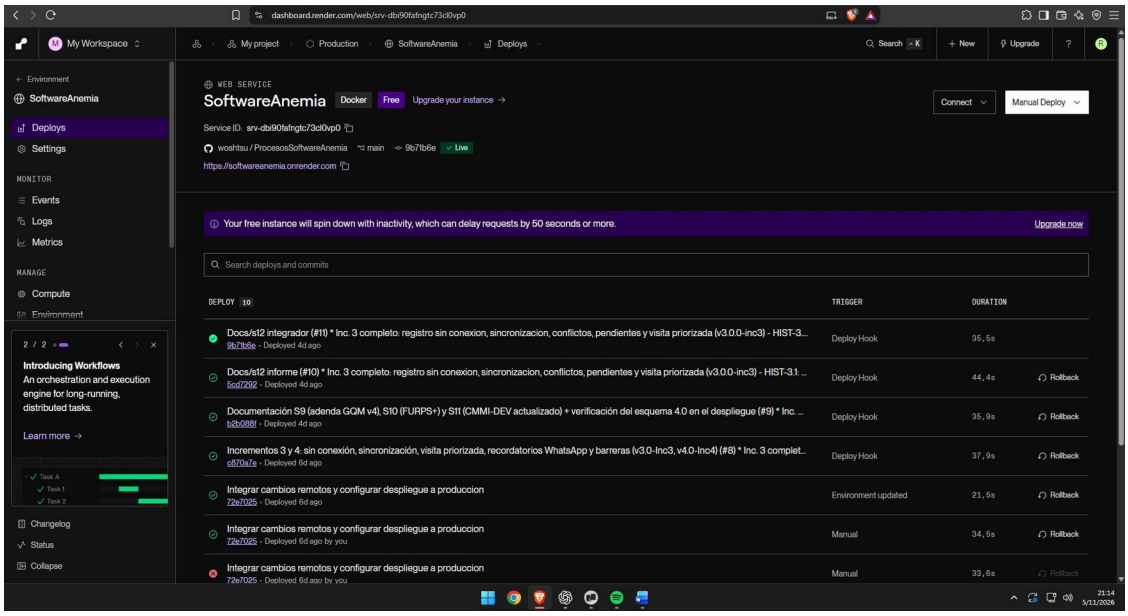

Render en estado Live.


- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-12/evidencias/produccion/PROD_07_render_panel_live.jpg`

FICHA DE EVIDENCIA CMMI POR ÁREA DE PRÁCTICA (CM — GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN)

- **PRÁCTICA EVALUADA:** identificar versiones y controlar los cambios.
- **PRODUCTO DE TRABAJO:** etiquetas y *releases* por incremento, ramas, integración por *pull request* y convención escrita (`CONTRIBUTING.md`).
- **NIVEL:** 2 (Gestionado). La convención y las plantillas son del 06/11/2026; el Nivel 3 exige aplicarlas en un incremento completo.

[CAPTURA 1: ARTEFACTO]

- **Descripción: Figura 115.** Etiquetas del repositorio: `v1.0-PMV`, `v1.5.0-inc2-avance`, `v2.0-Inc2`, `v3.0-Inc3` y `v4.0-Inc4`.

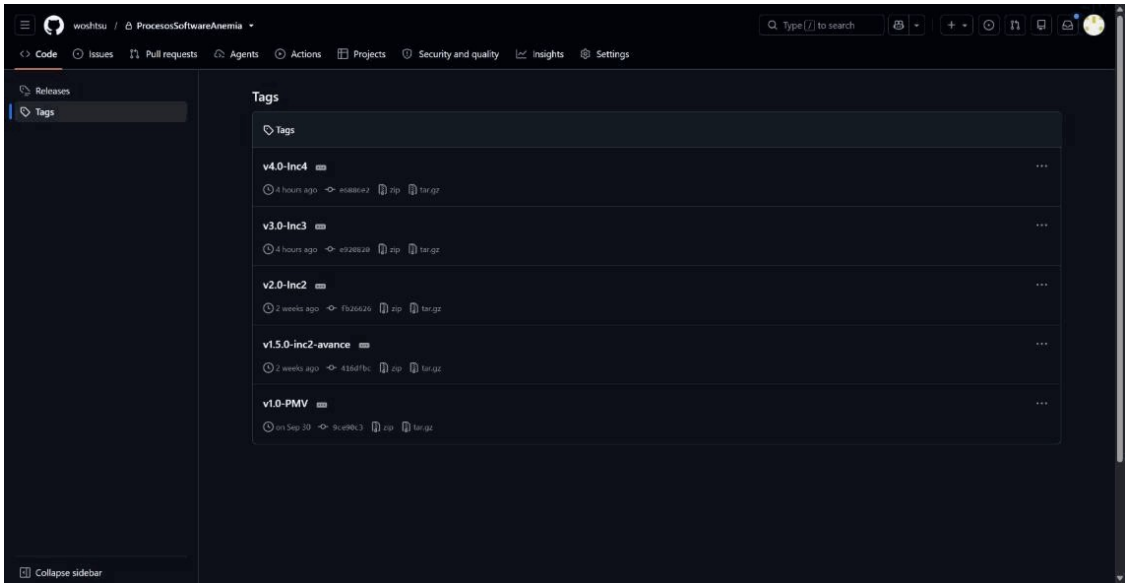


Etiquetas del repositorio.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-10/evidencias/github/GH_etiquetas.png`

[CAPTURA 2: CONTROL DE CAMBIOS]

- **Descripción: Figura 116.** *Pull requests* cerradas: cada incremento y cada entregable entró a `main` por una PR desde su rama.

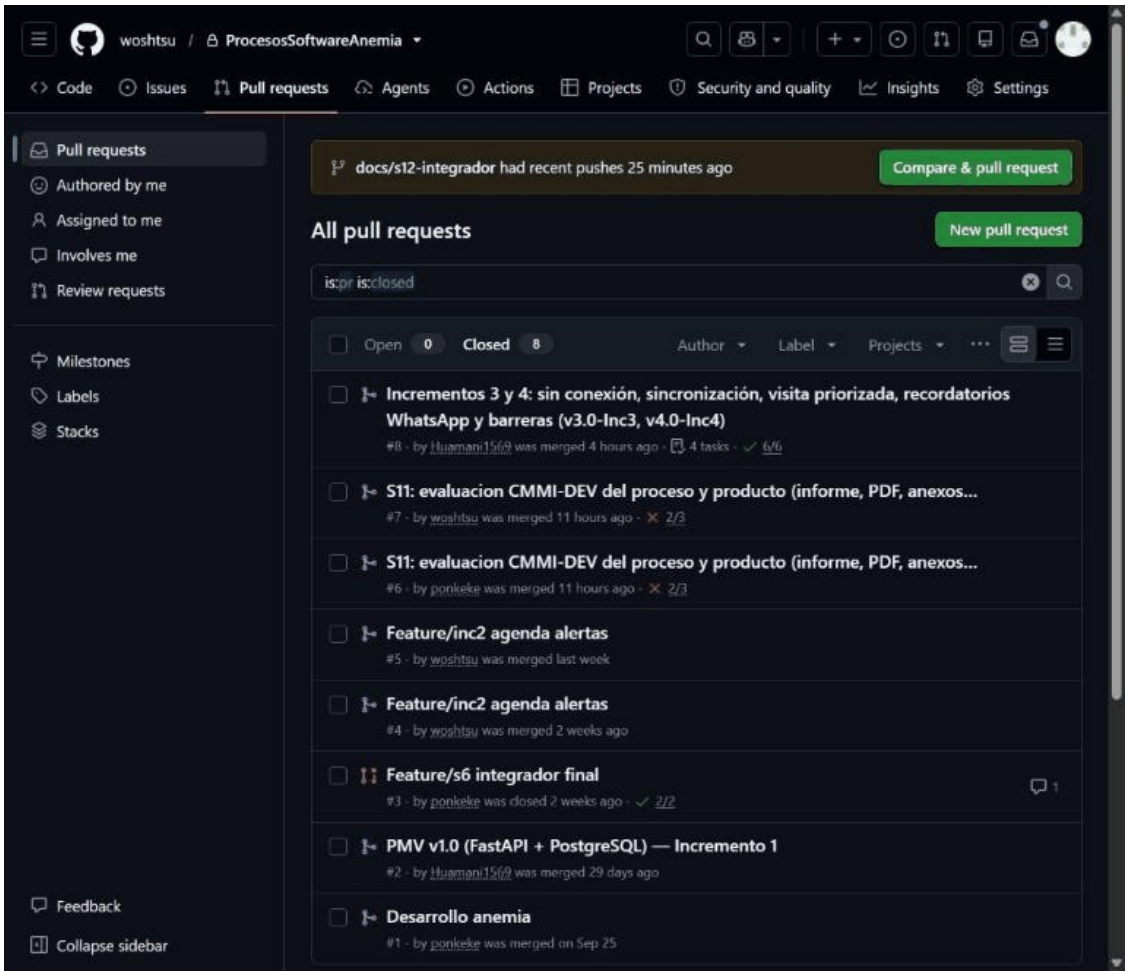


Pull requests cerradas.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-11/evidencias/github/GH_prs_cerradas.png`

[CAPTURA 3: PUBLICACIÓN DE VERSIONES]

- **Descripción: Figura 117.** Página de *Releases* del repositorio (06/11/2026). Las cinco etiquetas tienen su *release* con notas de versión en tres bloques: novedades, calidad y limitaciones. `v4.0-Inc4` es la última versión y `v1.5.0-inc2-avance` está marcada como *pre-release*.

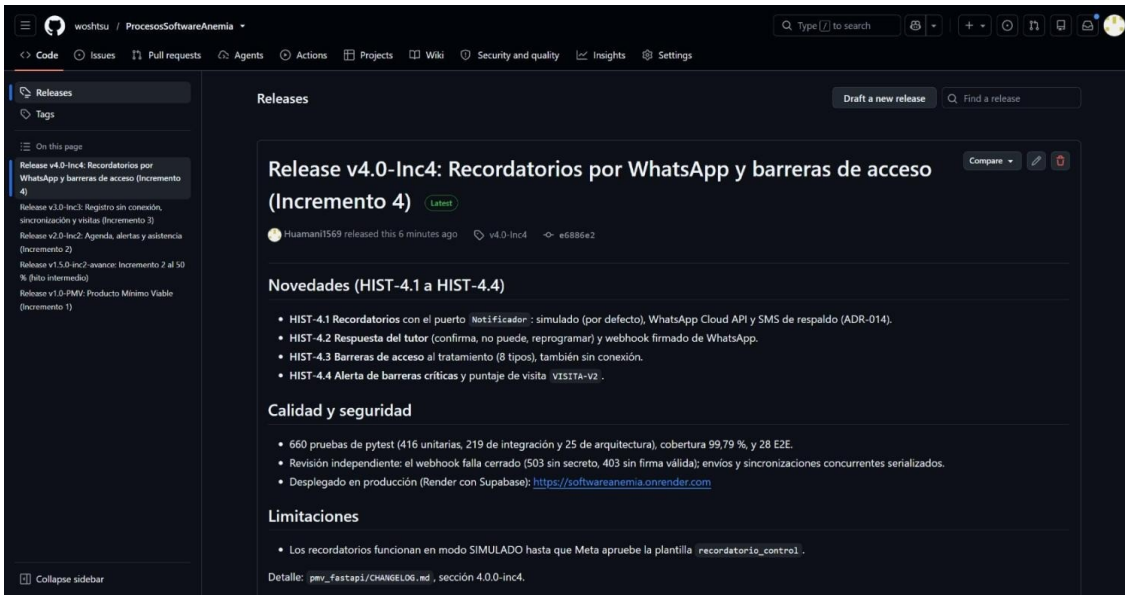

Releases del repositorio.


- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-13/img/C11_releases.jpg`
- Las solicitudes de cambio se registran con la plantilla `.github/ISSUE_TEMPLATE/change_request.md` y las PR con `.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md`, que incluye la lista de la DoD. Las ramas siguen GitFlow (`main`, `develop`, `feature/*`, `release/*`, `hotfix/*`) y los commits el formato `tipo(ámbito): descripción` (`CONTRIBUTING.md`).

FICHA DE EVIDENCIA CMMI POR ÁREA DE PRÁCTICA (PQA — ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD)

- **PRÁCTICA EVALUADA:** revisar objetivamente los procesos y productos y dar seguimiento a las no conformidades.
- **PRODUCTO DE TRABAJO:** verificaciones automáticas de cada PR, informe de revisión independiente y pruebas de regresión de sus hallazgos.
- **NIVEL:** 1 (Ejecutado). No hay aprobación formal («Approved») registrada en las PR ni plantilla de PR (H2).

[CAPTURA 1: ARTEFACTO]

- **Descripción: Figura 118.** PR #8 (incrementos 3 y 4) con sus verificaciones del CI en verde antes de integrarse.

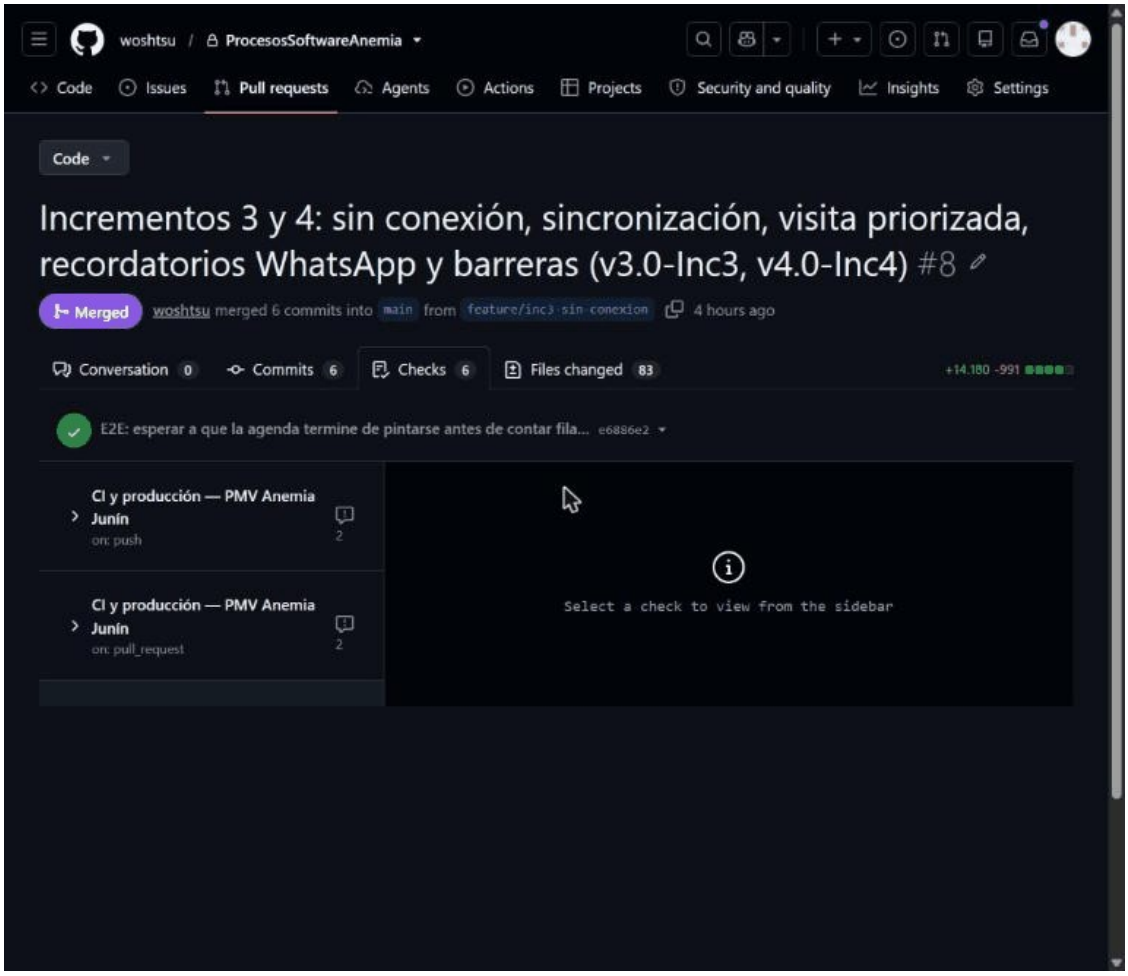


Verificaciones de la PR #8.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-11/evidencias/github/GH_pr8_checks.png`

[CAPTURA 2: SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES]

- **Descripción: Figura 119.** La revisión independiente encontró cinco defectos. Las pruebas de regresión de los corregidos están aprobadas (seis casos).

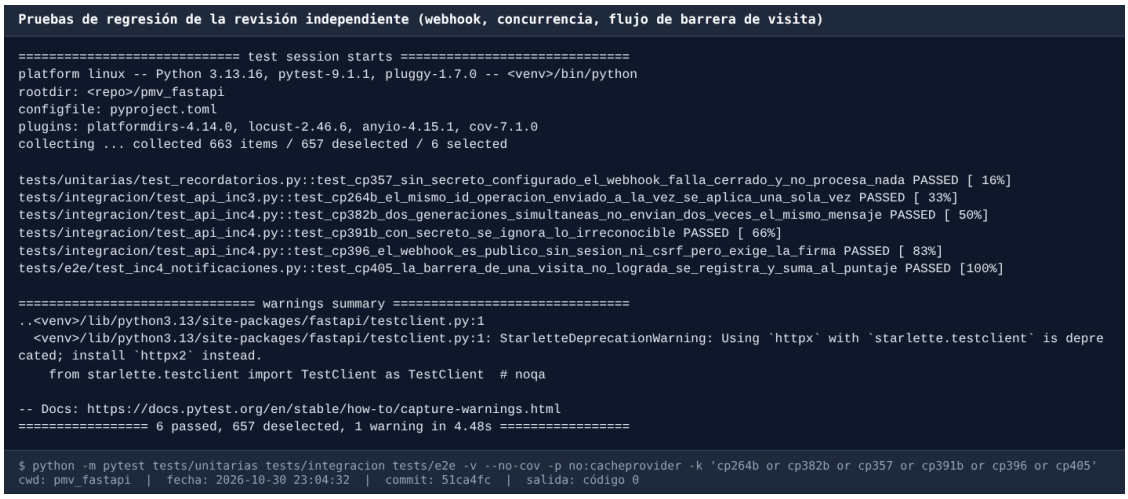

Regresión de la revisión independiente.

- **Archivo de imagen:** `entregables/semana-11/evidencias/CMMI04_regresion_revision_independiente.png`

Con estas evidencias, ninguna área cambia de nivel respecto de la Tabla 36. Las de Nivel 1 (ESTIM, PQA, VAL y CAR) tienen productos de trabajo, pero les falta el registro sistemático que exige el Nivel 2: horas reales, aprobación registrada de las PR, aceptación del usuario y efecto medido de las mejoras.

La novedad del 05/11/2026 es el primer análisis de SonarCloud. Avanza la acción 3 del plan de mejora, pero aún no se integra al CI.

Análisis de causa raíz y plan de mejora continua

Tabla 39. Hallazgos de la evaluación con su causa raíz de proceso y estado al 06/11/2026 (S11, Tabla 10).

ID	Área	Hallazgo	Causa raíz	Estado
H1	ESTIM	No se registra el esfuerzo real; la estimación no se contrasta (INC-2 +5 d, INC-3 +4 d, INC-4 −10 d)	El tablero no tiene campo de horas reales y el Sprint 3 compartió capacidad sin holgura	Abierto
H2	PQA	Revisiones de código sin evidencia consistente	La DoD vive en un documento, no en la herramienta de integración	Abierto, mejora parcial
H3	VAL	Sin aceptación del usuario ni medición de satisfacción	La aceptación no figura como criterio de cierre del incremento	Abierto, ampliado
H4	VER	El análisis estático efectivo es solo Ruff; la autenticación quedó fuera de las fichas	La autenticación se incorporó fuera de un incremento planificado	Parcialmente mitigado
H5	CM	Historial y versiones poco trazables	No hay convención escrita de commits, ramas y etiquetas	Mitigado el 06/11/2026: convención en `CONTRIBUTING.md` y *releases* publicadas; falta aplicarla en un

ID	Área	Hallazgo	Causa raíz	Estado
				incremento
H6	VER	Defectos escapados con cobertura cercana a 100 % (reincide en Inc. 3 e Inc. 4)	La DoD mide cuánto código se ejecuta y no la variedad de entradas	Abierto, reincidente
H7	CM, VER	El CI de `main` estuvo en rojo desde el 30/10 (3 causas independientes)	Flujo fusionado sin ejecutarse antes en una rama; versiones sin fijar	Mitigado
H8	PQA, VER	Seguridad, accesibilidad y rendimiento fuera de la DoD	El CI no tiene una puerta no funcional	Abierto
H9	CM, VER	El despliegue a producción no verifica el esquema completo ni el estado «Live»	El job `produccion` se escribió con el esquema 2.0	Abierto
H10	TS, PLAN	Los diagramas C4 y el modelo de datos son del PMV (01/10/2026). Las decisiones de los incrementos 2 a 4 están en los ADR, pero no en los diagramas.	La DoD exige un ADR por decisión, pero no actualizar los diagramas	Mitigado el 06/11/2026: diagramas regenerados del código por ingeniería inversa (ficha TS)

La causa raíz se atribuye siempre al último eslabón de los cinco porqués, una condición del proceso y no a las personas. Dos ejemplos:

Tabla 40. Cinco porqués de H2 y H6 (S11, Tabla 11).

Hallazgo	Porqué 1	Porqué 2	Porqué 3	Porqué 4	Porqué 5 (causa raíz)
H2: revisiones sin evidencia	No se puede comprobar quién revisó cada cambio	La DoD pide un revisor, pero nada obliga a registrarlo	No hay lista de chequeo en el *pull request*	No existe plantilla de *pull request*	La DoD vive en un documento y no en la herramienta de integración
H6: defectos escapados con alta cobertura	Las pruebas no incluían entradas hostiles ni concurrencia	Se verificaron los casos válidos y los límites esperados	La cobertura de líneas se tomó como indicador suficiente	La DoD no exigía pruebas exploratorias ni revisión independiente	La DoD mide cuánto código se ejecuta y no la variedad de entradas

Las pruebas de regresión de los defectos corregidos tras la revisión independiente están en la Figura 119 (ficha PQA).

Tabla 41. Plan de mejora continua: acciones con mayor efecto esperado y estado al 30/10/2026 (S11, Tabla 12; 19 acciones en total).

N.°	Área	Acción de mejora	Métrica de verificación	Responsable	Fecha objetivo	Estado
1	ESTIM	Campo «horas reales» por tarea; tareas de máximo 6 h; recalibrar la velocidad de 20 SP	100 % de tareas con horas; desviación ≤ ±20 % por historia	Porras V.	03/11 (recalibración 09/11)	Pendiente

N.°	Área	Acción de mejora	Métrica de verificación	Responsable	Fecha objetivo	Estado
2	PQA	Plantilla de PR con la DoD y protección de `main` con revisor obligatorio	100 % de PR con lista de chequeo y aprobación	Huamani R.	06/11	Parcial: plantillas de PR y de solicitud de cambio el 06/11; falta proteger `main`
3	VER	Activar SonarCloud, pruebas de entradas límite en la DoD y *hook* de pre-commit	Reporte de SonarCloud sin incidencias críticas	Huamani R.	06/11	Parcial: primer análisis de SonarCloud el 05/11 (129 hallazgos, 0 en el backend desplegado); falta el análisis desde el CI y corregir los críticos del frontend
5	VAL	Sesión de aceptación con el personal de salud: acta firmada y SUS con al menos cinco respondientes	SUS ≥ 68; acta por RF	Porras V.	13/11	Pendiente
8	CM, VER	Corregir los 3 fallos del CI y añadir Python 3.13 a la matriz	CI de `main` en verde	Huamani R.	30/10 (matriz 13/11)	Cumplida (corrección)
10	PQA	Criterios no funcionales en la DoD: cabeceras 6 de 6, 0 vulnerabilidades altas, axe sin críticas, p95 < 800 ms	IC_P ≥ 90 % en la siguiente medición	Huamani R.	13/11	Pendiente
12	VER	Roles en el JWT y políticas RLS por establecimiento (H-1)	Usuario sin rol recibe 403	Auqui H.	20/11	Pendiente
13 a 15	VER	Cabeceras de seguridad, CSV sin fórmulas, limitación de tasa, registro de eventos y 503 con la base caída (H-2 a H-6, H-8)	`seguridad_http.py`: 6 de 6 cabeceras; 0 respuestas 500 con la base caída	Auqui H.	06/11 a 13/11	Pendiente

N.°	Área	Acción de mejora	Métrica de verificación	Responsable	Fecha objetivo	Estado
16	VER	Paginar alertas y listados, probar PostgreSQL con varios *workers* y repetir la carga con control	p95 < 800 ms	Auqui H. y Huamani R.	20/11	Pendiente
19	VAL	Validación de pesos y reglas con la microred, prueba en dispositivo real y envío real con Meta	Acta de la microred; prueba sin pérdida de datos en campo	Porras V.	20/11 (depende de terceros)	Pendiente

Estado del plan al 30/10/2026: 19 acciones (7 de S11 y 12 nuevas), 1 cumplida, 4 parciales y 14 pendientes; ninguna vencida, porque la primera fecha era el 03/11/2026, y ninguna con el efecto medido. Las fechas y responsables de las acciones nuevas son una propuesta del equipo. La próxima reevaluación está prevista al cierre de los sprints 5 (09/11) y 6 (23/11/2026). El CAR se califica en Nivel 1 porque las causas están identificadas y las acciones definidas, pero el efecto aún no se midió.

Seguimiento al 06/11/2026 (ciclo PHVA). El plan de la Tabla 41 es la fase «planificar» y las acciones ejecutadas son la fase «hacer». La verificación del 06/11/2026 da este resultado:

- **Acción 2 (PQA):** pasa a parcial. Hay plantilla de PR con la DoD, plantilla de solicitud de cambio y convención escrita. Falta proteger `main` con revisor obligatorio, configuración que solo puede hacer el propietario del repositorio.
- **Acción 3 (VER):** sigue parcial. SonarCloud se analizó el 05/11, pero aún no se ejecuta desde el CI.
- **Acción 1 (ESTIM):** vencida el 03/11 sin cumplirse. La recalibración de la velocidad prevista para el 09/11 depende de ella.
- **Hallazgos fuera del plan:** H5 y H10 quedan mitigados (Tabla 39).

Estado del plan al 06/11/2026: **1 cumplida, 5 parciales y 13 pendientes**, de las cuales 1 está vencida (acción 1). En la fase «actuar», la plantilla de PR y la convención pasan a ser el estándar del repositorio; su efecto se medirá con la métrica de la acción 2 en las PR del Incremento 5.

4. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

4.1 Conclusiones Técnicas del Proceso y Producto

1. **La alineación entre el TO-BE y el software se verifica por brecha, no en general.** Cuatro de las seis brechas del AS-IS (B1 a B4: registro nominal único, agenda y recordatorios, barreras y visita priorizada) tienen mecanismo operativo y probado, lo que da M3.1 = 75,0 % (4,5 de 6); B6 es parcial (0,5) y B5, el riesgo de abandono, no se implementó. La línea base real (53,7 % de niños sin dosaje a los 6 meses en 12 486 diagnósticos de la DIRESA Junín) no se movió: el sistema se probó con datos sintéticos y con el dataset importado, no en una posta. Si se exigiera un envío real y un dispositivo real, M3.1 bajaría a 50,0 %.
2. **La arquitectura hexagonal mantuvo el dominio libre de frameworks y permitió probar la lógica clínica sin infraestructura.** El dominio importa 0 bibliotecas de terceros en 86 clases, las 25 pruebas de arquitectura detectan 0 violaciones de la regla de dependencia y las 660 pruebas unitarias, de integración y de arquitectura se ejecutan en 43 s. La estructura no fue correcta desde el inicio: el PMV tenía una conformidad de 40,0 % y una violación de dependencia que se corrigió en el Incremento 2; la lectura ultra estricta de `v4.0-Inc4` sigue en 80 % por `servicio_sesion.py`.
3. **GQM, FURPS+, OWASP y CMMI cuantifican el estado del producto y del proceso, pero no certifican su estabilidad.** Los 660 + 28 pruebas y el 99,79 % de cobertura son evidencia sólida de verificación, y aun así el índice FURPS+ queda en 87,7 % (78,4 % conservador), por debajo del 90 % de excelencia; la auditoría OWASP 2025 deja 12 hallazgos (1 alto, 6 medios, 4 bajos y 1 no medido) y la autoevaluación CMMI ubica cuatro de siete áreas en Nivel 1. El p95 de 1 100 ms frente a la meta de 800 ms es el principal riesgo de rendimiento.
4. **El modelo híbrido entregó cuatro incrementos con retrasos acotados, pero se midió la entrega y no la aceptación.** Se entregaron 76 de 133 SP (57,1 %), con desvíos de +2, +5, +4 y −10 días, sin horas reales registradas, sin actas de revisión con el personal de salud y con INC-5 e INC-6 sin construir; los hitos H3 y H4 exigían prueba de campo y envío real que no se hicieron.
5. **Los resultados tienen límites explícitos.** Los datos son sintéticos o seudonimizados; el envío de recordatorios solo se probó en modo simulado; el inicio de sesión se probó con Supabase simulado; los pesos de visita y las reglas de barreras no se validaron con la microred; y no hubo piloto, SUS ni medición de impacto clínico.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Adaptación del Ciclo de Vida

1. **El *tailoring* se sustenta en factores, y se confirma midiendo.** La combinación iterativo-incremental, Scrum y DevOps obtuvo 4,75 de 5 por los factores de incertidumbre, riesgo tecnológico y necesidad de retroalimentación. Sin embargo, no hay actas que acrediten que la revisión de cada incremento con el personal de salud se ejecutó, y esa es la diferencia entre un modelo adoptado y uno aplicado.
2. **La DoD debe medir variedad de entradas y calidad no funcional, no solo cobertura.** Con 99,79 % de cobertura escaparon cinco defectos en los incrementos 3 y 4 (uno de seguridad) y seis de siete en el primero. La DoD de este proyecto exigía cobertura ≥ 80 % y 0 errores de Ruff; las acciones 3 y 10 agregan pruebas de entradas hostiles, revisión independiente y puertas de seguridad, accesibilidad y rendimiento.
3. **El CI protege solo si se ejecuta antes de integrar.** El CI de `main` estuvo en rojo el 30/10 por tres causas independientes (versión de Python, runner y una prueba E2E inestable) porque el flujo se fusionó sin ejecutarse en una rama. Fijar versiones, exigir el CI en verde antes de la PR y proteger `main` (acciones 2 y 8) evitan repetirlo.
4. **Se mide lo que se afirma.** Reportar «0 vulnerabilidades» o una cobertura funcional completa habría sido más cómodo que informar 12 hallazgos, un M3.1 sensible a la definición de «probado» y cinco criterios no medidos; el valor del informe está en que cada cifra tiene su fuente y su límite.
5. **Sin esfuerzo real no hay estimación que mejorar.** El proyecto estimó 133 SP y 113 horas del PMV y no registró horas reales; el Sprint 3 compartió capacidad con otro entregable sin holgura. La acción 1 (campo de horas) y la acción 7 (reserva del 20 % de capacidad) son las más baratas con mayor retorno para el siguiente ciclo.

6. **La aceptación del usuario es un criterio de cierre.** Los incrementos 3 y 4 se entregaron el mismo día con pendientes que dependen de terceros (la microred, Meta, las familias y una posta). Programar la aceptación en el cronograma (acción 5) y gestionar esas dependencias desde el inicio es lo que separa un software probado de un software adoptado.
7. **Las observaciones se cierran con el mismo ciclo que los hallazgos.** Las tres observaciones de la semana 12 se trataron como un ciclo PHVA [21]: se planificó la corrección de cada una, se ejecutó, se verificó contra la observación original (Tabla 2) y se estandarizó, por ejemplo con las fichas de evidencia por métrica y por área y con las plantillas del repositorio. La revisión de un entregable cumple la función que Blanco-Llano y Rodríguez-Hernández asignan a la revisión técnica: comprobar que el artefacto está completo y conforme antes de pasar a la etapa siguiente [20].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lista numerada en el orden de la primera cita en el texto, según la norma ISO 690:2021 (método numérico). Las cinco referencias de la plantilla del curso son [5], [7], [8], [18] y [19].

[1] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. *ENDES 2025: indicadores de resultados de los programas presupuestales* [en línea]. Lima: INEI, 2026 [consulta: 6 noviembre 2026]. Disponible en: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2025/ppr/Informe_Indicadores_de_Resultados_de_los_Programas_Presupuestales_ENDES_2025.pdf

[2] MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ. *Resolución Ministerial N.° 251-2024/MINSA: aprueba la NTS N.° 213-MINSA/DGIESP-2024, Norma técnica de salud para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia* (modificada por la Resolución Ministerial N.° 429-2024/MINSA) [en línea]. Lima: MINSA, 2024 [consulta: 6 noviembre 2026]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5440166-251-2024-minsa

[3] DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN. *Niños menores de 36 meses con diagnóstico de anemia en la Región Junín* [conjunto de datos]. Extracto del HIS, 12 486 diagnósticos del 14/01/2022 al 21/06/2024, anonimizado en origen. Huancayo: DIRESA Junín, 2024.

[4] UNIVERSIDAD CONTINENTAL. *Guías de trabajo de las semanas 1, 2, 3-4, 9, 10, 11, 12 y 13. Procesos de Software (ASUC01702)* [material del curso]. Huancayo: Universidad Continental, 2026.

[5] SOMMERVILLE, Ian. *Software engineering*. 10.ª ed. Boston: Pearson, 2016.

[6] IEEE COMPUTER SOCIETY. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*. Versión 3.0. BOURQUE, Pierre y FAIRLEY, Richard E. (eds.). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2014.

[7] PRESSMAN, Roger S. y MAXIM, Bruce R. *Ingeniería de software: un enfoque práctico*. 9.ª ed. Ciudad de México: McGraw-Hill, 2021.

[8] O'REGAN, Gerard. *Concise guide to software engineering: from fundamentals to application methods*. Cham: Springer, 2017. DOI 10.1007/978-3-319-57750-0.

[9] SCHWABER, Ken y SUTHERLAND, Jeff. *The Scrum guide* [en línea]. Scrum.org, 2020 [consulta: 6 noviembre 2026]. Disponible en: https://scrumguides.org/scrum-guide.html

[10] KIM, Gene, HUMBLE, Jez, DEBOIS, Patrick y WILLIS, John. *The DevOps handbook: how to create world-class agility, reliability, and security in technology organizations*. Portland, OR: IT Revolution Press, 2016.

[11] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Systems and software engineering: software life cycle processes*. Ginebra: ISO, 2017.

[12] UNIVERSIDAD CONTINENTAL. *Roles claves del equipo de proyecto. Procesos de Software (ASUC01702)* [material complementario del curso]. Huancayo: Universidad Continental, 2026.

[13] COCKBURN, Alistair. *Hexagonal architecture* [en línea]. 2005 [consulta: 6 noviembre 2026]. Disponible en: https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/

[14] BASILI, Victor R., CALDIERA, Gianluigi y ROMBACH, H. Dieter. The goal question metric approach. En: MARCINIAK, John J. (ed.). *Encyclopedia of software engineering*. Nueva York: John Wiley & Sons, 1994, pp. 528-532.

[15] GRADY, Robert B. y CASWELL, Deborah L. *Software metrics: establishing a company-wide program*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1987.

[16] LARMAN, Craig. *UML y patrones: una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado*. 2.ª ed. Madrid: Prentice Hall, 2003.

[17] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1* [en línea]. W3C, 2018 [consulta: 6 noviembre 2026]. Disponible en: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

[18] OWASP FOUNDATION. *OWASP Top 10:2025: the ten most critical web application security risks* [en línea]. 2025 [consulta: 6 noviembre 2026]. Disponible en: https://owasp.org/Top10/2025/

[19] CMMI INSTITUTE. *CMMI for Development, Version 2.0*. Pittsburgh, PA: CMMI Institute, 2018.

[20] BLANCO-LLANO, Javier y RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ, Aida. Revisión, verificación y validación en un proceso de desarrollo de software. *Ingeniería Industrial* [en línea]. 2011, vol. 32, n.° 1, pp. 28-36 [consulta: 6 noviembre 2026]. ISSN 1815-5936. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360433575005

[21] TORRES SAUMETH, Katherine, RUIZ AFANADOR, Tatiana, SOLÍS OSPINO, Lesfty y MARTÍNEZ BARRAZA, Fanny. Una mirada hacia los modelos de gestión de calidad. *Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas*. 2013, vol. 4, n.° 1, pp. 216-233. ISSN 2216-1473.

ANEXOS

ANEXO A: Enlace del Video Demostrativo del Software

- **URL del video demostrativo (Drive):** https://drive.google.com/file/d/1E-ITz7WtqtMzhKQJql7Ssardvqw446mf/view?usp=sharing
- **Contenido:** el video no muestra este informe; va directo al software y rotula en pantalla cada parte («PMV · Incremento 1», «Incremento 2», «Incremento 3», «Incremento 4»), con una portada de 15 s y un cierre de calidad y arquitectura (Anexo C). Duración: 5 min 00 s.
- **Guion ejecutable:** `entregables/semana-12/video/GUION_DEMO.md` (pestaña, datos sintéticos, acción y resultado esperado por escena).
- **Versión regrabada sobre producción (09/11/2026):** https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia/blob/main/entregables/semana-12/video/demo_anemia_junin_v4.mp4 (5 min 59 s, 1920 × 1080). Recorre los mismos cuatro bloques en el servicio de producción, con datos sintéticos «DEMO» que se borran después de la grabación. El guion de locución está en `entregables/semana-12/video/GUION_LOCUCION.md`.

ANEXO B: Enlace del Repositorio de Código en GitHub

- **URL del repositorio:** https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia
- **Código del producto en la etiqueta evaluada:** https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia/tree/v4.0-Inc4/pmv_fastapi/app
- **Producción (Render con Supabase):** https://softwareanemia-virginia.onrender.com/ desde el 09/11/2026. El servicio se recreó en la región Virginia, la misma de la base de Supabase, para reducir la latencia; la verificación del 12/11/2026 dio `GET /api/salud` con estado `ok` y `/openapi.json` con la versión `4.0.0-inc4` y 29 rutas. El servicio anterior (https://softwareanemia.onrender.com/), en el que se tomaron las capturas de producción de este informe, se verificó el 31/10/2026: `GET /api/salud` responde `{"estado":"ok","fecha_hoy":"2024-06-30","fecha_referencia":"2024-06-30"}` (reloj fijo del dataset: la aplicación desplegada calcula agendas y vencimientos al 30/06/2024) y `GET /openapi.json` declara la versión `4.0.0-inc4` con 29 rutas, la misma del contrato de `v4.0-Inc4`.
- **Integración:** la PR #8 (incrementos 3 y 4) está fusionada en `main` con el CI #16 en verde; las PR de documentación #9, #10 y #11 se fusionaron el 01/11/2026 y la #12 (análisis de SonarCloud), el 06/11/2026.
- **Releases:** https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia/releases (5 *releases* con notas de versión, publicadas el 06/11/2026; Figura 117).
- **Gestión de cambios:** plantillas `.github/ISSUE_TEMPLATE/change_request.md` y `.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md`, y convención de ramas, commits y etiquetas en `CONTRIBUTING.md`.

La respuesta de `/api/salud` y el contrato `/openapi.json` en producción están en la Figura 32, y el servicio en estado «Live» en Render, en la Figura 114.


Tabla 42. Etiquetas de versión del repositorio y su *release* (S11, Anexo C y Figura 50).

Etiqueta	Commit	Fecha	Incremento	Contenido	Enlaces
`v1.0-PMV`	`9ce90c3`	30/09/2026	Inc. 1	HU-01 a HU-05 (RF-01 a RF-05)	árbol release
`v1.5.0-inc2-avance`	`416dfbc`	17/10/2026	Inc. 2 (hito al 50 %)	Estructura de puertos y adaptadores (ADR-008)	árbol release
`v2.0-Inc2`	`fb26626`	18/10/2026	Inc. 2	HIST-2.1 a HIST-2.4 (RF-06 a RF-09)	árbol release

Etiqueta	Commit	Fecha	Incremento	Contenido	Enlaces
`v3.0-Inc3`	`e920820`	30/10/2026	Inc. 3	HIST-3.1 a HIST-3.4, VIS-3.5	árbol release
`v4.0-Inc4`	`e6886e2`	30/10/2026	Inc. 4	HIST-4.1 a HIST-4.4; versión `4.0.0-inc4`	árbol release

`v1.0-PMV` apunta a un commit ajeno al historial de `main`; `v3.0-Inc3` y `v4.0-Inc4` apuntan a commits de la rama de los incrementos, que no están en el historial de `main` porque la PR #8 entró como un solo commit *squash* (`c870a7e`).

Las etiquetas del repositorio en GitHub se muestran en la Figura 115 (ficha CM de la sección 3.8).

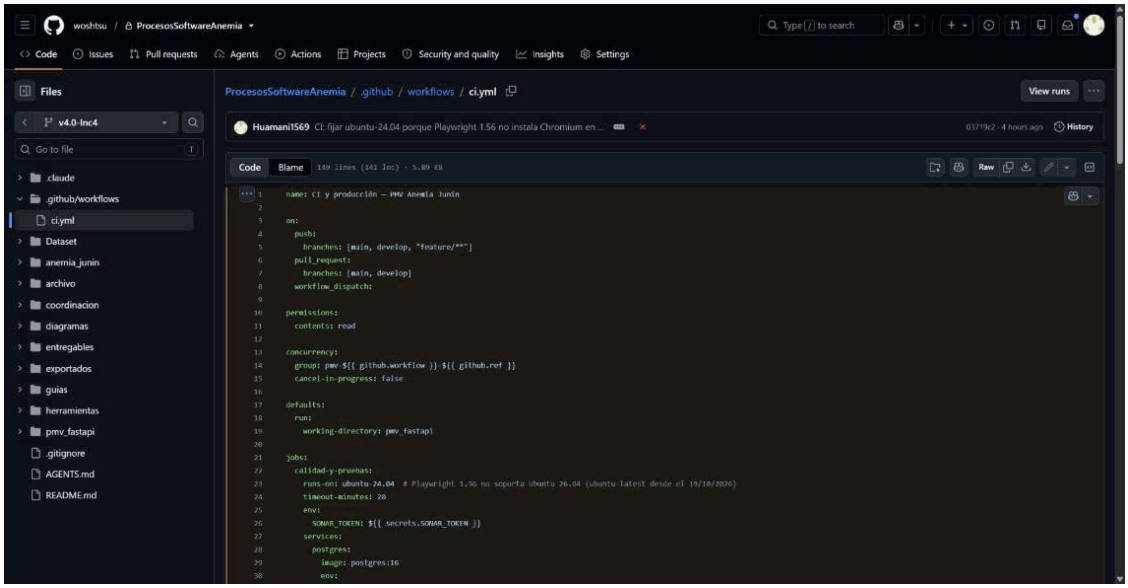

Flujo de CI/CD en la etiqueta v4.0-Inc4.

Figura 120. Flujo de CI/CD (`.github/workflows/ci.yml`) en `v4.0-Inc4`: tres trabajos (`calidad-y-pruebas`, `imagen`, `produccion`) sobre `ubuntu-24.04` y Python 3.11.

ANEXO C: GUIÓN TÉCNICO Y NARRATIVO DEL VIDEO DE DEMOSTRACIÓN DEL SOFTWARE

Duración total: 05 minutos 00 segundos. **Formato:** grabación de pantalla con voz en off del equipo, directamente sobre el software y sin mostrar este informe; un rótulo superpuesto indica qué parte se demuestra (PMV · Incremento 1, Incremento 2, Incremento 3 o Incremento 4). Aplicación local en `v4.0-Inc4` con datos sintéticos, proveedor de identidad simulado (modo demo) y recordatorios simulados; la producción no se usa para grabar, para no escribir datos en ella (sus capturas están en las fichas GQM del apartado 3.6.1 y en la ficha VAL de la sección 3.8). Pasos ejecutables: `entregables/semana-12/video/GUION_DEMO.md`.

Tabla 43. Guion técnico minuto a minuto, por incremento.

Tiempo	Pantalla mostrada	Locución / explicación técnica	Criterio / RF verificado
00:00 - 00:15	**Portada del video**: tarjeta con el nombre, la versión `v4.0-Inc4` y los cuatro rótulos (PMV, Incremento 2, 3 y 4) sobre la aplicación	«Presentamos Anemia Junín, un sistema web progresivo que apoya a las postas de Junín en el seguimiento de la anemia infantil. Vamos directo al software: veremos el PMV y los incrementos 2, 3 y 4, cada uno rotulado en pantalla. Los datos son sintéticos.»	Alcance: `v1.0-PMV` a `v4.0-Inc4`
00:15 - 01:15	**Rótulo «PMV · Incremento 1»** 00:15: «Registrar niño» (DNI 72000001, Hb 11,6 g/dL, 3 720 m), vista previa, guardar; intento con DNI «123» y Hb 25 00:40: «Expediente» del DNI 71000001 y nuevo control 00:55: «Seguimiento» filtrado por «Moderada» 01:05: «Reporte» del periodo	«Al digitar la hemoglobina, el servidor la ajusta por altitud y la clasifica: 9,1 g/dL ajustada, anemia moderada; el sistema clasifica, no diagnostica ni prescribe. Un DNI inválido o una Hb de 25 se rechazan por campo y un DNI repetido responde 409. Al agregar un control, el historial pasa de 2 a 3 evaluaciones. El listado filtra por clasificación y el reporte del periodo se genera en pantalla y en CSV.»	RF-01 (130 ms; 409), RF-03 (Hb ajustada 9,1 g/dL; 422), RF-02 (2 a 3 evaluaciones), RF-04 (27 niños; 6 «Moderada»), RF-05 (indicadores y CSV en menos de 2 s)
01:15 - 02:10	**Rótulo «Incremento 2»** 01:15: expediente 71000022 con su agenda normativa 01:30: «Alertas» con prioridad ALTA 01:45: «Agenda» del personal a 30 días 02:00: «No asistió» con motivo en un control vencido	«El expediente muestra la agenda normativa de 13 controles con su estado: cumplido, pendiente o vencido. «Alertas» lista los 9 controles vencidos por prioridad, 7 de ellos altos. La agenda del personal muestra los controles por día: 17 en 30 días. Al registrar una inasistencia con su motivo, queda la marca y sube la prioridad.»	RF-06 (13 controles), RF-07 (9 vencidos; 7 ALTA), RF-08 (17 controles de 14 niños), RF-09 (inasistencia registrada)
02:10 - 03:20	**Rótulo «Incremento 3»** 02:10: sin conexión, registro de un niño y un control 02:30: pestaña «Sincronización» con los pendientes y su antigüedad 02:40: reconexión y sincronización 02:55: conflicto y «Conservar servidor» 03:05: «Visitas» priorizadas con desglose; registro de una visita	«Sin conexión, los registros quedan en una cola del dispositivo; la cabecera cuenta los pendientes y la pestaña «Sincronización» indica desde cuándo. Al volver la red, cada operación se aplica una sola vez y reenviarla se marca DUPLICADA. Si el servidor tiene un dato distinto, se crea un conflicto	HIST-3.1 (2 pendientes), HIST-3.4, HIST-3.2 (idempotente), HIST-3.3 (conflicto resuelto), VIS-3.5 (18 visitas, 49,5 a 25,0)

Tiempo	Pantalla mostrada	Locución / explicación técnica	Criterio / RF verificado
		y el personal decide. Para el agente comunitario, «Visitas» ordena por un puntaje explicable con su desglose; los pesos son una propuesta del equipo, sin validar con la microred.»	
03:20 - 04:30	**Rótulo «Incremento 4»** 03:20: «Recordatorios», generar 03:40: respuesta del tutor «No puede asistir» 03:55: barrera de acceso, también sin conexión 04:10: «Alertas» de barreras críticas y «Visitas» con BARRERA_CRITICA	«Generamos 24 recordatorios; todos salen rotulados SIMULADO porque el envío real por WhatsApp no se ha probado. Registramos la respuesta del tutor desde la interfaz: el webhook exige firma y, en modo simulado, no registra respuestas. Una barrera grave se guarda, incluso sin conexión, y dispara una alerta alta que suma 40 puntos a la visita priorizada.»	HIST-4.1 (24 SIMULADO), HIST-4.2 (respuesta; webhook 403 sin firma), HIST-4.3 (barrera sincronizada), HIST-4.4 (alerta ALTA; BARRERA_CRITICA 40,0)
04:30 - 05:00	**Calidad y arquitectura** 04:30: GitHub, `pmv_fastapi/app` en `v4.0-Inc4` (`domain`, `ports`, `adapters`, `application`, `main.py`) 04:42: pestaña Actions con el CI en verde 04:52: página de etiquetas	«La arquitectura es hexagonal: el dominio importa 0 bibliotecas de terceros en 86 clases y 25 pruebas lo verifican. El CI ejecuta 660 pruebas y 28 E2E con 99,79 % de cobertura y está en verde. Cada incremento tiene su etiqueta: `v1.0-PMV`, `v2.0-Inc2`, `v3.0-Inc3` y `v4.0-Inc4`. Falta validar con una posta real; quedan 12 hallazgos de seguridad abiertos y un p95 de 1 100 ms por vigilar. Gracias.»	Arquitectura hexagonal y SCM (etiquetas), CI/CD, OWASP 2025 (H-1 a H-12)

ANEXO D: Cotejo de referencias

Cada número de la lista de referencias figura en el texto al menos una vez y cada cita del texto figura en la lista. La columna «Origen» distingue las cinco referencias de la plantilla del curso, las dos lecturas de la semana 13 y las agregadas por el proyecto.

Tabla 44. Cotejo de referencias: número, fuente y secciones donde se cita.

N.°	Fuente	Origen	Secciones donde se cita
[1]	INEI (2026)	Proyecto	1.1
[2]	MINSA (2024)	Proyecto	1.1
[3]	DIRESA Junín (2024)	Proyecto	1.2

N.°	Fuente	Origen	Secciones donde se cita
[4]	Universidad Continental (2026), guías	Proyecto	2.1, 2.2
[5]	Sommerville (2016)	Plantilla	2.1, 2.2
[6]	IEEE Computer Society (2014)	Proyecto	2.2
[7]	Pressman y Maxim (2021)	Plantilla	2.2
[8]	O’Regan (2017)	Plantilla	2.2, 2.5
[9]	Schwaber y Sutherland (2020)	Proyecto	2.2
[10]	Kim et al. (2016)	Proyecto	2.2
[11]	ISO/IEC/IEEE 12207 (2017)	Proyecto	2.3, 3.3
[12]	Universidad Continental (2026), roles	Proyecto	2.3
[13]	Cockburn (2005)	Proyecto	2.4
[14]	Basili, Caldiera y Rombach (1994)	Proyecto	2.5, 3.6.1
[15]	Grady y Caswell (1987)	Proyecto	2.5
[16]	Larman (2003)	Proyecto	2.5
[17]	W3C (2018)	Proyecto	2.5, 3.7.2
[18]	OWASP Foundation (2025)	Plantilla	2.5, 3.7.4
[19]	CMMI Institute (2018)	Plantilla	2.5, 3.8
[20]	Blanco-Llano y Rodríguez-Hernández (2011)	Lectura S13	2.5, 4.2
[21]	Torres Saumeth et al. (2013)	Lectura S13	2.5, 4.2

RÚBRICA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA POR NIVELES DE DESEMPEÑO (SOBRE 20 PUNTOS)

Asignatura: Procesos de Software (ASUC01702). **Objeto de evaluación:** proceso de software, producto en GitHub (arquitectura hexagonal) y video demostrativo. **Escala:** 0 a 20 puntos. El puntaje lo asigna el docente; la tabla siguiente es la autoevaluación del equipo.

Tabla 45. Autoevaluación frente a los cuatro criterios de la rúbrica.

Criterio (puntaje máximo)	Evidencia en el informe	Nivel esperado	Riesgo
1. Evaluación del proceso de software: *tailoring*, WBS, RAE, DoD y CMMI (5,0)	Secciones 3.1 a 3.4 y 3.8: factores y matriz ponderada (4,75 de 5), WBS con 133 SP, matriz RAE, DoD verificada, desviaciones medidas, CMMI en 7 áreas y plan de 19 acciones	Excelente en rigor; Bueno si el docente pondera los niveles de capacidad	CMMI queda en Nivel 1 en 4 de 7 áreas; sin horas reales, sin GitHub Projects y sin actas de revisión
2. Producto en GitHub y arquitectura hexagonal (6,0)	Sección 3.6.4 y Anexo B: estructura `domain`, `ports`, `adapters` con enlaces a `v4.0-Inc4`, 0 importaciones de terceros en 86 clases, 25 pruebas de arquitectura, 5 etiquetas con su *release* y plantillas de cambio	Excelente	La ruta es `pmv_fastapi/app/` y no `/src/`; el PMV nació con 40 % de conformidad; `v1.0-PMV` está fuera del historial de `main`; conformidad ultra estricta de 80 %
3. Pruebas, FURPS+ y seguridad OWASP 2025 (4,0)	Secciones 3.6.2, 3.6.3 y 3.7: 19 de 19 fichas con capturas, FURPS+ 87,7 % (78,4 % conservador), WCAG con 22 de 23 pares de texto, OWASP con 12 hallazgos	Bueno	La rúbrica premia «0 vulnerabilidades» y el informe reporta 1 hallazgo alto y 6 medios; accesibilidad sin lector de pantalla; SonarCloud no ejecutado
4. Video demostrativo y guion técnico (5,0)	Anexo C y `video/GUION_DEMO.md`: guion de 5:00 minuto a minuto con criterio verificado por escena; Anexo A	Bueno	Video publicado en Drive (Anexo A); la grabación usa datos sintéticos, proveedor de identidad simulado y envío simulado; la producción corre con reloj fijo (30/06/2024) y sus capturas están en las fichas GQM y en la ficha VAL

Tabla 46. Resumen de evaluación en el formato de la plantilla (los puntajes los asigna el docente).

Criterio evaluado	Puntaje máximo	Puntaje obtenido	Observaciones
1. Evaluación del proceso de software (*tailoring*, WBS, RAE, CMMI)	5,0	_____	_____
2. Producto de software en GitHub y arquitectura hexagonal	6,0	_____	_____
3. Estrategia de pruebas, FURPS+ y seguridad OWASP 2025	4,0	_____	_____
4. Video demostrativo y guion técnico del	5,0	_____	_____

Criterio evaluado	Puntaje máximo	Puntaje obtenido	Observaciones
software			
NOTA FINAL CONSOLIDADA	**20,0**	_____	_____
