UNIVERSIDAD CONTINENTAL
Facultad de Ingeniería · Ingeniería de Sistemas e Informática

INFORME TÉCNICO DE LABORATORIO 13
GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE (UNIDAD IV)

Administración del cambio y gestión de versiones y entregas con la Suite de GitHub aplicadas al proyecto «Anemia Junín»

Asignatura	Procesos de Software (ASUC01702) · 2026-20
Docente	Guevara Jimenez, Jorge Alfredo
Proyecto	Sistema para la detección temprana y el seguimiento de la anemia infantil en zonas rurales de Junín (versión `v4.0-Inc4`)
Integrantes	Porras Veli, Ricardo (76659572) — Leader / Software Architect Auqui Huincho, Tania Tifani (75280128) — Backend, Data, Frontend & Mobile Huamani Rodriguez, Jean Piero (72156889) — Process Analyst & QA Lead
Repositorio	https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia
Fecha de corte	06/11/2026

1. Carátula e integrantes

Ver la página anterior. Roles en la gestión de la configuración: el **Leader / Software Architect** (Porras V.) evalúa y aprueba las solicitudes de cambio y es el propietario del repositorio; la **desarrolladora** (Auqui H.) implementa los cambios en ramas propias; el **QA Lead** (Huamani R.) registra las solicitudes, revisa las *pull requests* y publica las versiones.

2. Resumen del proyecto y objetivos de la gestión de configuración

«Anemia Junín» es una aplicación web progresiva con API FastAPI y arquitectura hexagonal que ayuda al personal de salud a registrar a los niños con anemia, programar sus controles, recibir alertas, trabajar sin conexión y registrar las barreras al tratamiento. Se construyó en cuatro incrementos (`v1.0-PMV` a `v4.0-Inc4`, 76 de 133 puntos de historia) y está desplegada en Render con Supabase. Según el plan, la semana 13 abre el Sprint 6, dedicado al Incremento 5 (modelo predictivo).

Objetivos de la gestión de configuración (SCM):

- Que todo cambio entre por una solicitud registrada (RFC en GitHub Issues), con su impacto y su evaluación.
- Que ningún cambio llegue a la línea base sin *pull request*, lista de la DoD, integración continua en verde y revisión de un par.
- Separar la línea base estable (`main`) de la integración (`develop`) y del trabajo diario (`feature/*`), siguiendo GitFlow.
- Identificar cada incremento con una etiqueta semántica y publicarlo como *release* con sus notas.
- Mantener la trazabilidad Cambio → Issue → Rama → PR → Etiqueta → Release → Despliegue.

El informe separa lo que ya existía en el repositorio de lo configurado el 06/11/2026 para este laboratorio, y señala lo que queda pendiente.

3. Eje temático 1: administración del cambio en GitHub

3.1 Configuración de plantillas

Se crearon las dos plantillas de la guía, con el texto normalizado. En la plantilla de PR, la DoD se adaptó a las herramientas del proyecto (Ruff, `pytest --cov`, pruebas de arquitectura y SonarCloud). También se crearon las etiquetas del flujo: `change-request`, `pendiente-evaluacion`, `aprobado`, `rechazado` e `implementado`.

Archivo	Contenido	Estado
`.github/ISSUE_TEMPLATE/change_request.md`	Solicitud de Cambio (RFC): módulo afectado, tipo de cambio, justificación, impacto en alcance, esfuerzo y riesgo, y criterios de aceptación Dado-Cuando-Entonces. Etiquetas automáticas: `change-request` y `pendiente-evaluacion`.	En `main` desde el 06/11/2026 (PR #13); activas para todo el equipo.
`.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md`	Resumen, `Closes #` y la DoD: compila sin advertencias (Ruff), cobertura ≥ 80 %, arquitectura hexagonal, evidencias funcionales y análisis estático (Ruff y SonarCloud).	
`CONTRIBUTING.md`	Flujo del cambio, GitFlow, formato de commits `tipo(ámbito): descripción`, etiquetas, *releases* y protección de ramas.	

3.2 Matriz de registro y control de solicitudes de cambio (Issues / RFC)

Las solicitudes se registraron el 06/11/2026 con la plantilla. Provienen de hallazgos reales: las observaciones del docente a S12, la autoevaluación CMMI (H2, H5 y H10), la auditoría OWASP Top 10:2025 (H-1 a H-3) y el plan del Sprint 6. Antes de esa fecha el proyecto no registraba los cambios en GitHub Issues: los gestionaba en `coordinacion/TABLERO.md` y en el plan de mejora.

Matriz 1.2. Registro controlado de cambios en GitHub Issues (06/11/2026).

ID Issue	Título de la solicitud (RFC)	Origen / causa	Impacto estimado	Estado en GitHub	Aprobador / responsable
#14	Corregir el informe integrador según las observaciones del docente a S12	Observaciones del docente (ISO 690, GQM, CMMI)	5 SP / Bajo	Cerrado por la PR #13 (integrada el 06/11); etiqueta aún *pendiente-evaluacion*	Porras V. (aprobador) · Huamani R.
#15	Adoptar GitFlow, convención de commits y plantillas de cambio y de PR	CMMI H2 y H5; guía S13	3 SP / Bajo	Cerrado por la PR #13 (integrada el 06/11); etiqueta aún *pendiente-evaluacion*	Porras V. · Huamani R.
#16	(duplicado de #15)	Registro duplicado por error	—	Cerrado como duplicado	Huamani R.
#17	Regenerar los diagramas de arquitectura y de datos por ingeniería inversa (H10)	CMMI H10	2 SP / Bajo	Cerrado por la PR #13 (integrada el 06/11); etiqueta aún *pendiente-evaluacion*	Porras V. · Huamani R.
#18	Roles en el JWT y políticas RLS por establecimiento	OWASP H-1 (A01, alta)	5 SP / Alto	Abierto · *pendiente-evaluacion*	Porras V. · Auqui H. (20/11)
#19	Cabeceras de seguridad HTTP y CSV sin fórmulas	OWASP H-2 y H-3 (media)	3 SP / Medio	Abierto · *pendiente-evaluacion*	Porras V. · Auqui H. (13/11)
#20	Preparar el dataset versionado del HIS para el Incremento 5 en el Sprint 6	Desvío del plan: la preparación de datos del Sprint 5 no se hizo	3 SP / Medio	Abierto · *pendiente-evaluacion*	Porras V. (decide trasladar o postergar INC-5)

Las seis siguen con la etiqueta *pendiente-evaluacion*: el flujo exige que el Leader / Software Architect cambie la etiqueta a `aprobado` o `rechazado`, y eso no se registró. Las RFC #14, #15 y #17 se cerraron automáticamente al integrarse la PR #13 sin haber pasado por `aprobado`, lo que muestra que el control de la evaluación todavía depende de la disciplina del equipo. Ninguna se ha rechazado.

3.3 Auditoría de revisiones de código y reglas de protección de ramas

Auditoría de las 13 *pull requests* del repositorio, con datos de la API de GitHub al 06/11/2026: rama de origen, revisión registrada, resultado del CI en el último commit y quién integró.

Matriz 2.2. Auditoría de *pull requests* y revisiones de código.

PR	Rama origen → destino	Contenido	Issue vinculado	Revisor (estado)	DoD / CI	Resultado
#1	desarrollo-anemia → main	Estructura del repositorio y coordinación	—	Sin revisión registrada	CI aún no existía	Merged (woshtsu)
#2	entrega-s5-s7 → main	PMV v1.0 (Incremento 1)	—	Sin revisión registrada	Pruebas locales: 77 pruebas, 99 %	Merged (woshtsu)
#3	feature/s6-integrador-final → main	Informe integrador S6	—	—	—	Cerrada sin integrar

PR	Rama origen → destino	Contenido	Issue vinculado	Revisor (estado)	DoD / CI	Resultado
#4	feature/inc2-agenda-alertas → main	Incremento 2 al 50 %	—	Sin revisión registrada	Sin ejecución registrada	Merged (woshtsu)
#5	feature/inc2-agenda-alertas → main	Incremento 2 completo	—	Sin revisión registrada	Sin ejecución registrada	Merged (woshtsu)
#6, #7	docs/entrega-s11 → main	Informe S11 (CMMI)	—	Sin revisión registrada	**calidad-y-pruebas: failure**	Merged (woshtsu)
#8	feature/inc3-sin-conexion → main	Incrementos 3 y 4	—	Sin revisión «Approved»; revisión independiente documentada	**CI verde (calidad e imagen)**	Merged, *squash* (woshtsu)
#9	docs/s12-integrador → main	Documentación S9 a S11	—	**woshtsu: APPROVED**	**CI verde**	Merged (woshtsu)
#10, #11	docs/s12-informe, docs/s12-integrador → main	Informe integrador S12	—	Sin revisión registrada	**CI verde**	Merged (woshtsu)
#12	docs/sonarcloud-2026-11-05 → main	Análisis de SonarCloud	—	Sin revisión registrada	**CI verde; Quality Gate de SonarCloud en rojo**	Merged (woshtsu)
#13	docs/s13-informe → main	Informe S13, plantillas SCM, PDCA	#14, #15, #17	**Sin revisión «Approved» registrada**	calidad-y-pruebas e imagen en verde; **Quality Gate de SonarCloud en rojo**; plantilla DoD usada	Merged, *squash* (woshtsu, 06/11)

Lectura. De 12 PR integradas (todas menos la #3), solo una (#9) tiene revisión «Approved» registrada. Dos (#6 y #7) se integraron con el CI en rojo, y las cuatro primeras son anteriores al CI. Esto confirma el hallazgo H2: la revisión por pares existía en la práctica, pero no quedaba registrada. La PR #13 es la primera que se vincula a sus RFC (`Closes #14, #15, #17`) y usa la lista de la DoD. Aun así se integró sin aprobación y con el Quality Gate de SonarCloud en rojo: la plantilla no basta si la rama no está protegida.

Reglas de protección de ramas: no configuradas. La cuenta del QA Lead tiene permiso de escritura, no de administración: `Settings → Branches` devuelve 404 y la API responde 403. Las reglas solo puede activarlas el propietario (woshtsu). La configuración que corresponde a la guía es la siguiente, para `main` y `develop`:

1. *Require a pull request before merging*, con al menos 1 aprobación.
2. *Dismiss stale pull request approvals when new commits are pushed*.
3. *Require status checks to pass before merging*: el trabajo `calidad-y-pruebas` del CI.

Mientras no se activen, se siguen integrando commits directos en `main`: el 05/11/2026 se subieron dos commits de capturas directamente a `main`, sin PR,, cuyas ejecuciones del CI (#25 y #26) fallaron.

4. Eje temático 2: gestión de versiones y entregas en GitHub

4.1 Estrategia de ramificación GitFlow y matriz de ramas por historia de usuario

El historial muestra que el Incremento 1 sí siguió GitFlow, aunque en local. Cada historia o corrección se trabajó en una rama propia y se integró en `develop` con un *merge* explícito. Por ejemplo, `225ee46 Merge feature/infra-ci-bd en develop` y `4f805df Merge fix/def-01-reporte-n-mas-1 en develop`. El commit `9ce90c3 release: v1.0-PMV` cerró la versión, y la PR #2 la llevó a `main`. Desde el Incremento 2, en cambio, cada incremento fue de una rama `feature/*` directo a `main`, sin `develop` ni `release/*`. El 06/11/2026 se creó la rama `develop` en GitHub y la convención quedó escrita en `CONTRIBUTING.md`, para aplicarla desde el Incremento 5.

Matriz 3.1. Trazabilidad de ramas e historias de usuario (ramas y commits reales del historial).

Historia / Issue	Rama creada	Responsable	Commits semánticos registrados (ejemplos)	Rama destino
Habilitadores (T7 a T9)	feature/infra-ci-bd	Huamani R.	`ci: pipeline de GitHub Actions (lint, pruebas, cobertura)` `build: esquema PostgreSQL con restricciones de integridad`	develop (local) → main (PR #2)
HU-03 / RF-03	feature/hu03-validacion-nts	Huamani R.	`feat(hu03): reglas clínicas de ajuste por altitud y clasificación`	develop → main (PR #2)
HU-01, 02, 04 y 05	feature/hu01-hu05-expediente	Huamani R.	`feat(hu01-hu05): API REST con errores por campo` `feat(hu01-hu05): interfaz PWA`	develop → main (PR #2)
DEF-01 y DEF-02	fix/def-01-reporte-n-mas-1, fix/def-02-zona-horaria	Huamani R.	`fix(DEF-01): elimina consultas N+1 del reporte (p95 2200 ms → 74 ms)`	develop → main (PR #2)
HIST-2.1 a 2.4 (RF-06 a 09)	feature/inc2-agenda-alertas	Huamani R. y Auqui H.	`Inc. 2 avance 50%: agenda normativa y alertas` `Inc. 2 completo: agenda del personal y asistencia`	main (PR #4 y #5)
HIST-3.1 a 3.4, VIS-3.5, HIST-4.1 a 4.4	feature/inc3-sin-conexion	Huamani R. y Auqui H.	`Inc. 3 completo: registro sin conexión, sincronización…` `Inc. 4 completo: recordatorios…, barreras y alertas críticas`	main (PR #8, *squash*)
RFC #14, #15 y #17	docs/s13-informe	Huamani R.	`docs(s13): informe integrador corregido, plantillas de cambio…` `docs(s13): cuadro PDCA…`	main (PR #13)
RFC #18 y #19	feature/h1-roles-rls, feature/h2-h3-cabeceras-csv (previstas)	Auqui H.	—	develop

Los mensajes de los incrementos 2 a 4 no siguen el formato `tipo(ámbito)`; el formato del PMV se retomó con `CONTRIBUTING.md`.

4.2 Etiquetado semántico y fichas de publicación de releases

Las etiquetas existían desde cada entrega. El 06/11/2026 se publicó la *release* de cada una con notas en tres bloques: novedades (historias), calidad (pruebas y cobertura) y limitaciones. La etiqueta usa `vMAYOR.MENOR-IncN`; el hito intermedio, `v1.5.0-inc2-avance`, se marcó como *pre-release*. Comandos para etiquetar (convención del equipo):

```
git checkout main && git pull origin main
git tag -a v4.0-Inc4 -m "Incremento 4: recordatorios y barreras de acceso" e6886e2
git push origin v4.0-Inc4
```

Ficha	v1.0-PMV	v2.0-Inc2	v3.0-Inc3	v4.0-Inc4
Título	Producto Mínimo Viable (Incremento 1)	Agenda, alertas y asistencia (Incremento 2)	Registro sin conexión, sincronización y visitas (Incremento 3)	Recordatorios por WhatsApp y barreras de acceso (Incremento 4)
Commit de la etiqueta	9ce90c3 (30/09/2026)	fb26626 (18/10/2026)	e920820 (30/10/2026)	e6886e2 (30/10/2026)
Novedades	HU-01 a HU-05 (RF-01 a RF-05)	HIST-2.1 a 2.4 (RF-06 a RF-09)	HIST-3.1 a 3.4 y VIS-3.5	HIST-4.1 a 4.4
Calidad	77 pruebas, 99 %; DEF-01 y DEF-02 corregidos	326 pruebas y 15 E2E; DEF-09 corregido	499 pruebas (99,70 %) y 24 E2E	660 pruebas (99,79 %) y 28 E2E; revisión independiente
Artefactos	Código fuente (zip y tar.gz) generado por GitHub en cada *release*; `Dockerfile` y `docker-compose.yml` en la etiqueta; imagen Docker construida por el CI (trabajo `imagen`), sin publicar en un registro.			
Publicación	06/11/2026, rama destino `main`, por Huamani R.			

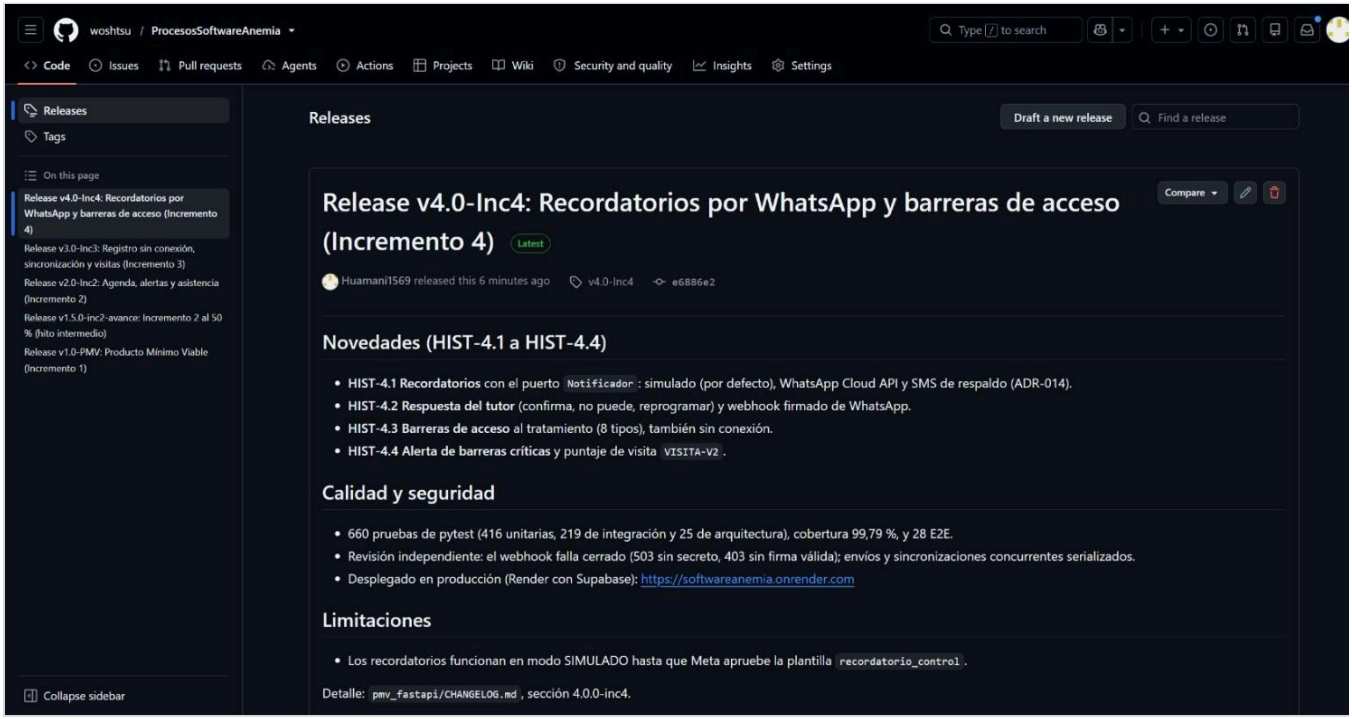


Figura 1. Página de *Releases*: las cinco versiones publicadas, con `v4.0-Inc4` como la última (06/11/2026).

Matriz 4.2. Registro de versiones y entregas del proyecto.

Etiqueta	Nombre del release en GitHub	Incremento	Estado del software	Enlace
v1.0-PMV	Release v1.0-PMV: Producto Mínimo Viable (Incremento 1)	Incremento 1	Liberado; entorno local y Docker de staging	github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia/releases/tag/v1.0-PMV
v1.5.0-inc2-avance	Release v1.5.0-inc2-avance: Incremento 2 al 50 % (pre-release)	Hito del Inc. 2	Versión de avance	.../releases/tag/v1.5.0-inc2-avance
v2.0-Inc2	Release v2.0-Inc2: Agenda, alertas y asistencia	Incremento 2	Liberado; imagen Docker del CI	.../releases/tag/v2.0-Inc2
v3.0-Inc3	Release v3.0-Inc3: Registro sin conexión, sincronización y visitas	Incremento 3	Liberado; integrado en `main` por la PR #8	.../releases/tag/v3.0-Inc3
v4.0-Inc4	Release v4.0-Inc4: Recordatorios por WhatsApp y barreras de acceso	Incremento 4	Desplegado en producción (Render con Supabase)	.../releases/tag/v4.0-Inc4

5. Matriz de trazabilidad unificada de configuración

Matriz 5.1. Cambio / requisito → Issue → Rama → PR y revisión → Etiqueta / Release → Artefacto o despliegue.

Solicitud / requisito	Issue	Rama	PR y revisión	Etiqueta / Release	Artefacto / despliegue
Incremento 1: HU-01 a HU-05	Sin issue (anterior al registro en Issues)	feature/hu03-..., feature/hu01-hu05-... → develop	PR #2 (merged, sin revisión registrada)	v1.0-PMV	Docker de staging (`docker-compose.yml`)
Incremento 2: HIST-2.1 a 2.4	Sin issue	feature/inc2-agenda-alertas	PR #4 y #5 (merged)	v1.5.0-inc2-avance, v2.0-Inc2	Imagen Docker del CI
Incrementos 3 y 4: HIST-3.x, VIS-3.5, HIST-4.x	Sin issue	feature/inc3-sin-conexion	PR #8 (CI verde; revisión independiente)	v3.0-Inc3, v4.0-Inc4	Producción en Render (*deploy hook* del CI)
Observaciones del docente a S12	#14	docs/s13-informe	PR #13 (CI verde; integrada sin aprobación registrada)	— (documentación)	Informe S13 (.docx y .pdf)
Hallazgos CMMI H2 y H5	#15	docs/s13-informe	PR #13	—	`.github/`, `CONTRIBUTING.md`, rama `develop`
Hallazgo CMMI H10	#17	docs/s13-informe	PR #13	—	`generar_diagramas.py` y diagramas v4
OWASP H-1	#18	feature/h1-roles-rls (prevista)	Pendiente	Próxima versión de corrección (v4.1)	—
OWASP H-2 y H-3	#19	feature/h2-h3-cabeceras-csv (prevista)	Pendiente	Próxima versión de corrección (v4.1)	—
Datos del INC-5	#20	feature/inc5-datos (prevista)	Pendiente	v5.0-Inc5 (hito H6)	Dataset versionado

La trazabilidad es completa desde la rama hasta el despliegue en los cuatro incrementos, pero la parte Cambio → Issue solo existe desde el 06/11/2026. Las versiones previstas para los RFC pendientes son una propuesta según `CONTRIBUTING.md`.

6. Conclusiones y lecciones aprendidas

1. **La configuración existía; faltaba el registro del cambio.** El proyecto ya tenía etiquetas por incremento, ramas por historia, CI y PR para todo lo integrado. Lo que no dejaba evidencia era la decisión: por qué se cambiaba algo y quién lo aprobaba. Las RFC en Issues y la plantilla de PR cubren ese vacío.
2. **GitFlow se perdió por presión de plazos, no por desconocimiento.** El PMV usó `develop`, `feature/*` y `fix/*`. Al acelerar los incrementos 2 a 4 se integró directo a `main`, y la PR #8 entró como *squash*, por lo que las etiquetas `v3.0-Inc3` y `v4.0-Inc4` quedaron fuera del historial de `main`. La rama `develop` y las ramas `release/*` evitan repetirlo.
3. **Sin protección de ramas, la DoD es voluntaria.** Una sola PR con «Approved», dos integradas con el CI en rojo y commits directos que rompieron el CI muestran que las reglas deben estar en la herramienta. Configurarlas es la acción pendiente de mayor efecto y depende del propietario del repositorio.

4. **Una *release* documenta mejor que una etiqueta.** Las notas por incremento resumen en un solo lugar alcance, calidad y limitaciones. Falta adjuntar artefactos compilados, por ejemplo publicar la imagen Docker del CI.

Autoevaluación frente a la rúbrica (la nota la asigna el docente):

Criterio	Nivel esperado	Qué falta para «Excelente»
1. Administración del cambio (5,0)	Bueno	Reglas de protección de ramas y revisiones «Approved» registradas
2. Ramificación y control SCM (5,0)	Bueno	Aplicar GitFlow con `develop` en el Incremento 5; hoy hay commits directos en `main`
3. Versiones, tags y releases (5,0)	Bueno	Adjuntar artefactos compilados a las *releases*
4. Trazabilidad y repositorio (5,0)	Bueno	Issues para los incrementos anteriores al 06/11 (no existen) y aprobación registrada antes de integrar

7. Anexos y enlaces directos a la Suite de GitHub

- Repositorio oficial: https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia
- Solicitudes de cambio (Issues): https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia/issues?q=label%3Achange-request
- *Pull requests*: https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia/pulls?q=is%3Apr
- *Releases*: https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia/releases · Etiquetas: https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia/tags
- Ramas: https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia/branches · CI: https://github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia/actions
- Plantillas y convención: `.github/ISSUE_TEMPLATE/change_request.md`, `.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md`, `CONTRIBUTING.md`
- Producción: https://softwareanemia.onrender.com
